

REGIONE PIEMONTE
Provincia di Cuneo
COMUNE DI BARBARESCO

**RICOSTRUZIONE DI SBARRAMENTO FLUVIALE
ESISTENTE AD USO IRRIGUO CON INNALZAMENTO
ABBATTIBILE AD USO IDROELETTRICO E
CENTRALE IN CORPO TRAVERSA**

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato n.

A7

"Cronoprogramma e fasi di lavoro"

Ottobre 2014

IL COMMITTENTE:

Tanaro Power S.p.A.

Via Vivaro 2
12051 - Alba (CN)

I TECNICI INCARICATI:

Dott. Ing. Sergio SORDO

Dott. Ing. Piercarlo BOASSO

SR STUDIO

STUDIO DI INGEGNERIA
Dott. Ing. Sergio Sordo
C.so Langhe, 10 - 12051 Alba (CN)
tel: 0173 364823
e-mail: sordosergio@srstudio.info



769

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
Dott. Ing. Sergio Sordo

GAPE s.a.s.

Dott. Ing. Piercarlo Boasso
Via Accame, 20 - 17027 Pietra Ligure (SV)
tel: 335 6422389
e-mail: piercarlo.boasso@alice.it



A984

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
Dott. Ing. Piercarlo Boasso

1 PREMESSA

Il presente documento costituisce il Cronoprogramma dei lavori necessari per la realizzazione dell'impianto idroelettrico sul fiume Tanaro in Comune di Barbaresco (CN) e contiene l'elenco delle principali attività previste per la realizzazione delle opere a servizio della derivazione e i relativi tempi di attuazione.

La realizzazione della centrale avverrà secondo due fasi lavorative di seguito indicate. La realizzazione della prima fase lavorativa prevede la realizzazione delle opere relativa alla centrale

A	CANTIERE + VIABILITÀ + TURA	
A0	Pista di Cantiere	4
A0	Allestimento cantiere e baracche di cantiere	4
A1	Tracciamenti	11
A2	Realizzazione Tura di protezione e parziale deviazione dell'alveo	12
A2	Demolizione parte di traversa esistente e scavo di sbancamento per la realizzazione della fondazione del sistema di ritenuta	35
B	REALIZZAZIONE CENTRALE	
B1	Scavi di sbancamento e realizzazione opere di fondazione in c.a.	24
B2	Realizzazione strutture in c.a. in elevazione per la centrale, posa armatura, getto con autobetoniera	24
B3	Realizzazione opere in c.a. Cabina elettrica di consegna ed automazione, posa armatura, getto con autobetoniera	24
B4	Realizzazione fondazione opere in cls, casseratura, posa armatura, getto con autobetoniera	18
B5	Realizzazione delle opere in elevazione del sistema di ritenuta casseratura, posa armatura, getto con autobetoniera	12
C	POSA PANCONI	12
D	REALIZZAZIONE TRAVERSA E SGHIAIATORE	
D1	Scavo fondazione	12
D2	Realizzazione opere in c.a. di fondazione ed in elevazione canale sghiaiatrice e corpo traversa fisso	18
E	OPERA DI PRESA	
E1	Scavo di fondazione	12
E2	Muro d'argine	18
E3	Opere in c.a. opera di presa	12
F	FORNITURA E MONTAGGIO PARATOIE SGHIAIATRICE	15
G	OPERA DI RESTITUZIONE	
G1	Scavo di fondazione	12
G2	Muro d'argine	24
G3	Opere in c.a. opera di scarico	6
H	OPERE ELETTROMECCANICHE	
H1	Posa canalizzazione e allacciamenti	52
H2	Fornitura e montaggio paratoie d'impianto e sgrigliatore	30
H3	Fornitura e montaggio gruppo di produzione Turbina / generatore	60
H4	Fornitura e montaggio automazione	24
L	DISALLESTIMENTO CANTIERE 1	9
	Totale Giorni lavorativi	484


Nella seconda fase è prevista la realizzazione delle traversa e delle opere accessorie all'impianto, quali passaggio di rimonta della fauna ittica e sistema di ritenuta mobile. Verrà realizzata inoltre sempre in sponda destra le opere per il ripristino della derivazione irrigua.


A	REALIZZAZIONE TURA DI PROTEZIONE E PARZIALE DEVIAZIONE DELL'ALVEO	18
B	SCAVI DI SBANCAMENTO E REALIZZAZIONE POZZO PER LA REALIZZAZIONE	12
C	REALIZZAZIONE MURO ARGINE E FONDAZIONE OPERA DI PRESA CANALE IRRIGUO	18
D	REALIZZAZIONE STRUTTURE UN C.A. IN ELEVAZIONE PER L'OPERA DI PRESA CONSORZIO IRRIGUO	12
E	REALIZZAZIONE PRIMA PARTE PASSAGGIO DI RIMONTA DELLA FAUNA ITTICA	12
F	REALIZZAZIONE OPERE IN C.A. FONDAZIONE ED ELEVAZIONE CORPO TRAVERSA	54
G	REALIZZAZIONE STRUTTURE IN C.A. DEL DISSIPATORE E RIEMPIMENTO IN MASSI	18
H	COMPLETAMENTO PASSAGGIO DI RIMONTA DELLA FAUNA ITTICA	24
I	PARATOIA MOBILE	
I1	FORNITURA E MONTAGGIO SISTEMA DI RITENUTA A DOPPIA FALDA	30
I2	VERIFICA E COLLAUDO OPERE DI RITENUTA A DOPPIA FALDA.	12
L	DEMOLIZIONE OPERE PROVVISORIALI (TURA)	6
M	COLLAUDO FINALE DELL'IMPIANTO	9
N	DISALLESTIMENTO CANTIERE E BARACCHE DI CANTIERE	14
	Totale Giorni lavorativi	239

La durata complessiva prevista è di circa 723 giorni lavorativi al parallelo dei gruppi. Tale durata tecnica è stata stabilita ipotizzando una successione di fasi che preveda la sovrapposizione delle diverse fasi al fine di ottimizzare le tempistiche, mantenendo sempre in primo luogo la sicurezza del cantiere e dei lavoratori. Il programma cronologico effettivo dovrà comunque essere predisposto tenendo in debito conto la compatibilità delle lavorazioni in alveo con il regime idrologico del corso d'acqua. Lo sbarramento di ritenuta mobile sarà realizzato per tratti, parzializzando la sezione del corso d'acqua mediante rilevati provvisori ottenuti mediante semplice movimentazione del materiale d'alveo. La sovrapposizione delle attività previste, come è evidente dal cronoprogramma allegato, è stata ridotta al minimo, in maniera tale da garantire l'opportunità di eventuali ottimizzazioni che potranno nascere durante la realizzazione delle opere. Nell'articolazione del cronoprogramma effettivo di cantiere sarà necessario tenere in considerazione i seguenti elementi:


- i periodi durante i quali si concentrano i maggiori deflussi in alveo (primavera e autunno), durante i quali sono stati ridotti al minimo i lavori in alveo;
- i periodi di frega della fauna ittica, nei mesi di maggio e giugno


CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI E FASI DI CANTIERE	COMUNE DI BARBARESCO																													
	REALIZZAZIONE DELLE OPERE CIVILI																													
	NONO MESE																													
TEMPISTICA MENSILE	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M
data presunta inizio lavori: 01/01/2016 data presunta termine lavori:01/01/2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Pista di Cantiere																														
Allestimento cantiere e baracche di cantiere																														
Tracciamenti																														
Realizzazione Tura di protezione e parziale deviazione dell'alveo																														
Demolizione parte di traversa esistente e scavo di sbancamento per la realizzazione della fondazione del sistema di ritenuta																														
Scavi di sbancamento e realizzazione opere di fondazione in c.a.																														
Realizzazione strutture un c.a. in elevazione per la centrale, posa armatura, getto con autobetoniera																														
Realizzazione opere in c.a. Cabina elettrica di consegna ed automazione, posa armatura, getto con autobetoniera																														
Realizzazione fondazione opere in cls, cassetta, posa armatura, getto con autobetoniera																														
Realizzazione delle opere in elevazione del sistema di ritenuta cassetta, posa armatura, getto con autobetoniera																														
Posa panconi																														
Scavo fondazione																														
Realizzazione opere in c.a. di fondazione ed in elevazione canale sghiaiatrice e corpo traversa fisso																														
Scavo di fondazione																														
Muro d'argine																														
Opere in c.a. opera di presa																														
Fornitura e montaggio paratoie Sghiaiatrice																														
Scavo di fondazione																														
Muro d'argine																														
Opere in c.a. opera di scarico																														
Posa canalizzazione e allacciamenti																														
Fornitura e montaggio paratoie d'impianto e sgrigliatore																														
Fornitura e montaggio gruppo di produzione Turbina / generatore																														
Fornitura e montaggio automazione																														
Disallestimento cantiere e baracche di cantiere																														
SETTIMANE LAVORATIVE	36°sett.						37°sett.						38°sett.						39°sett.											

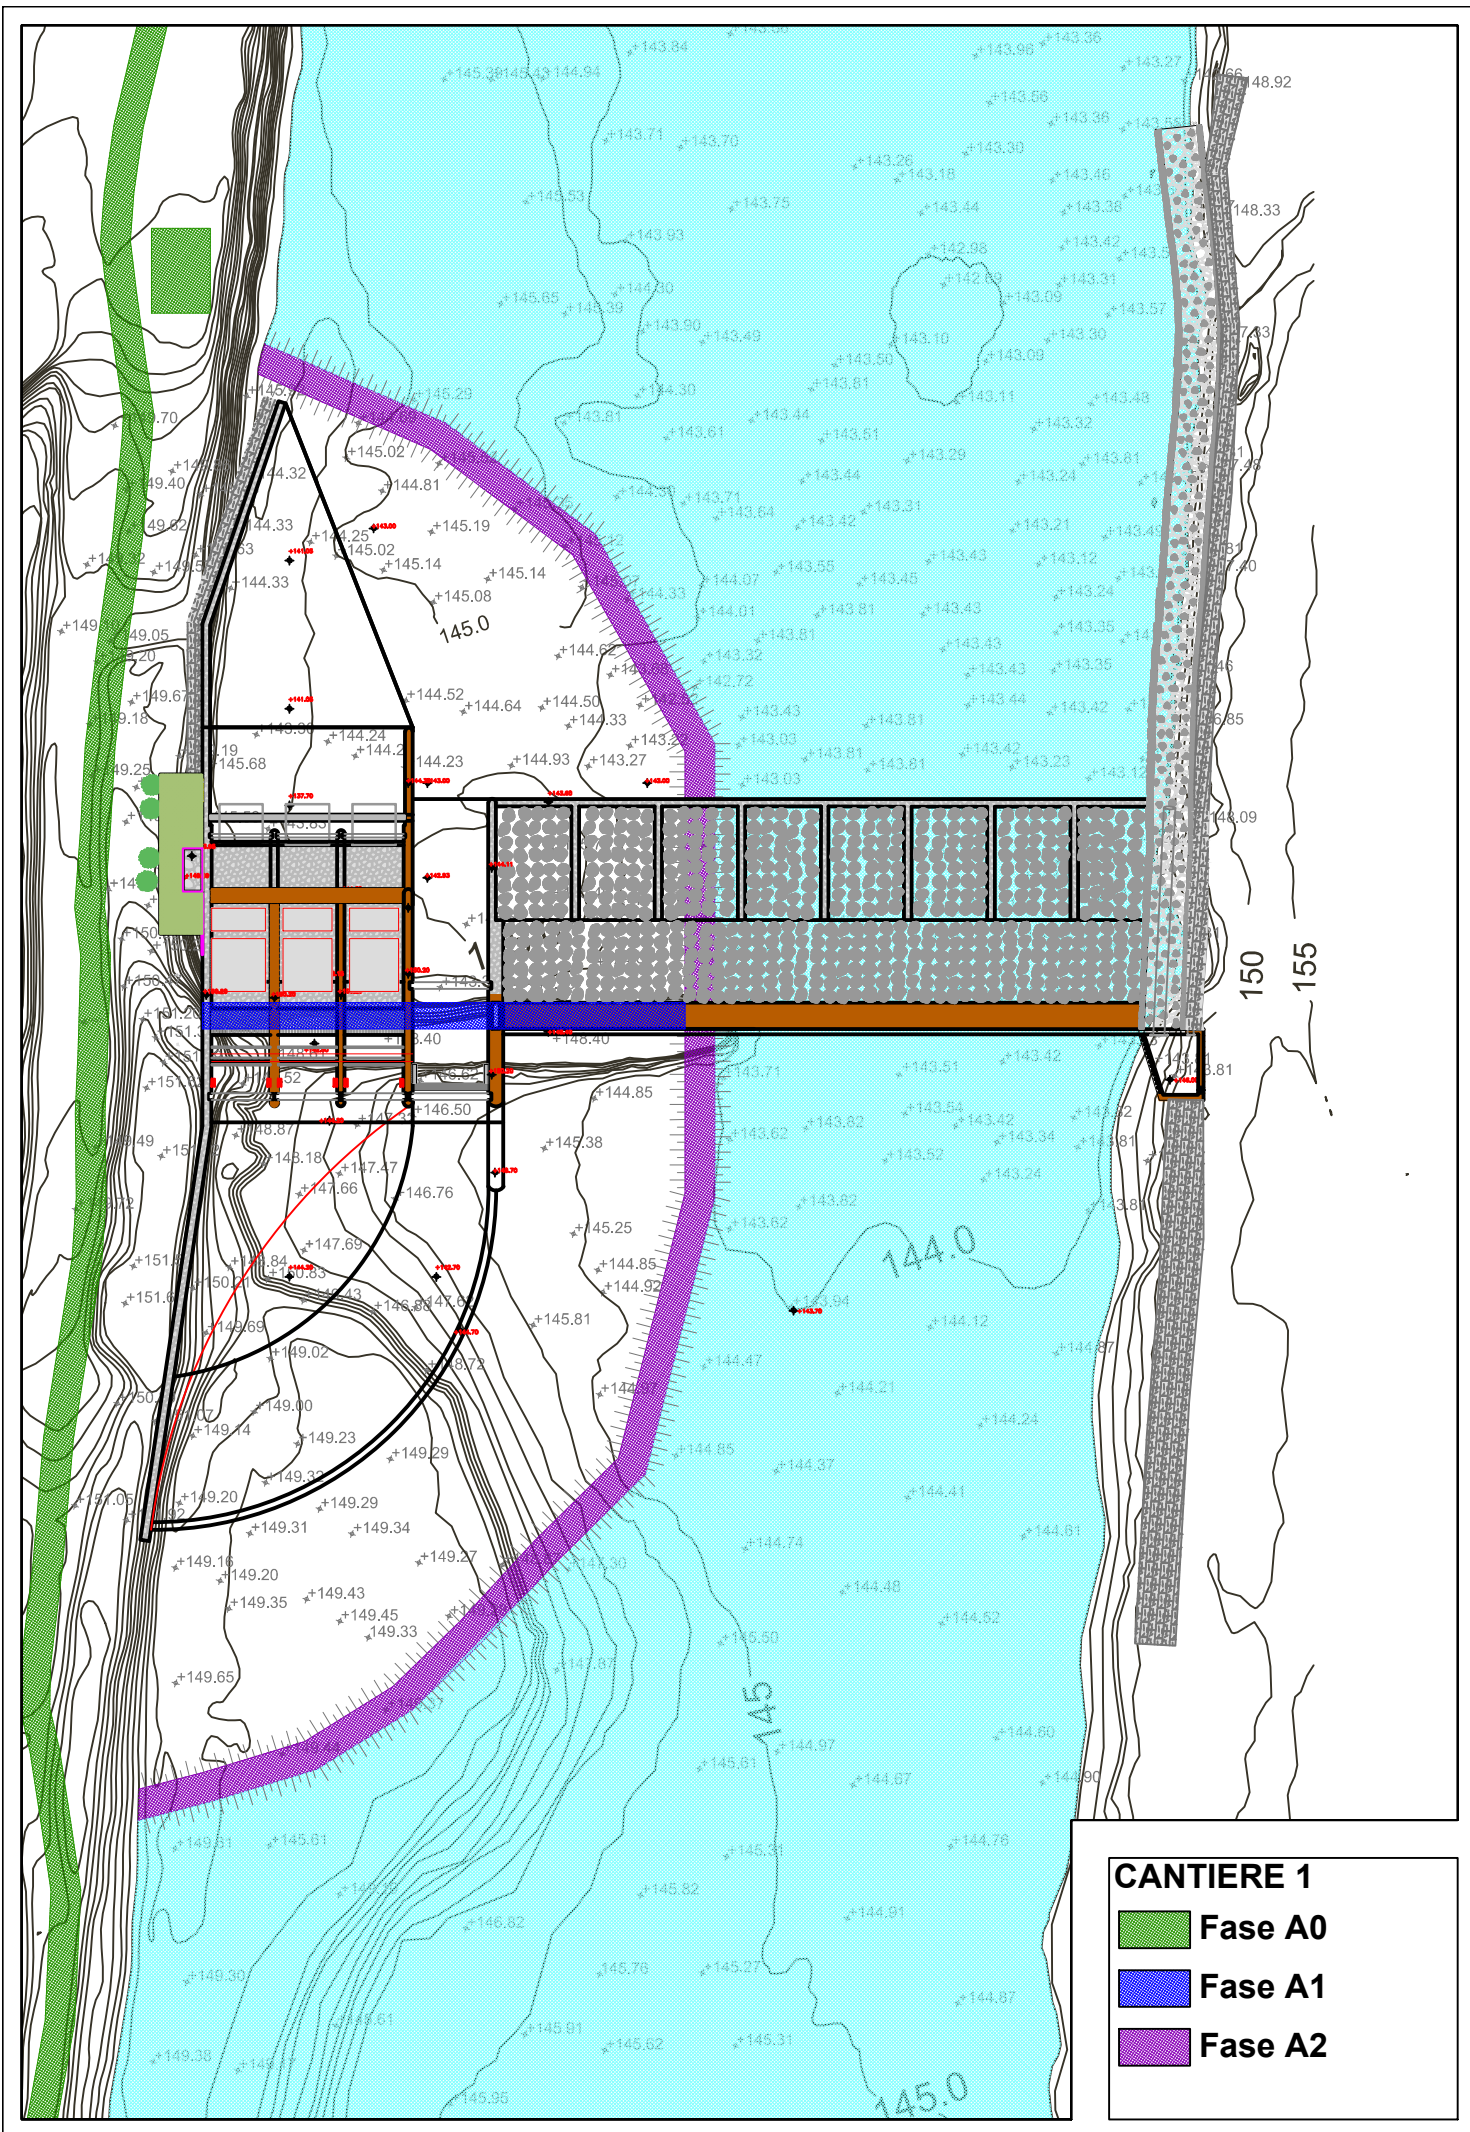


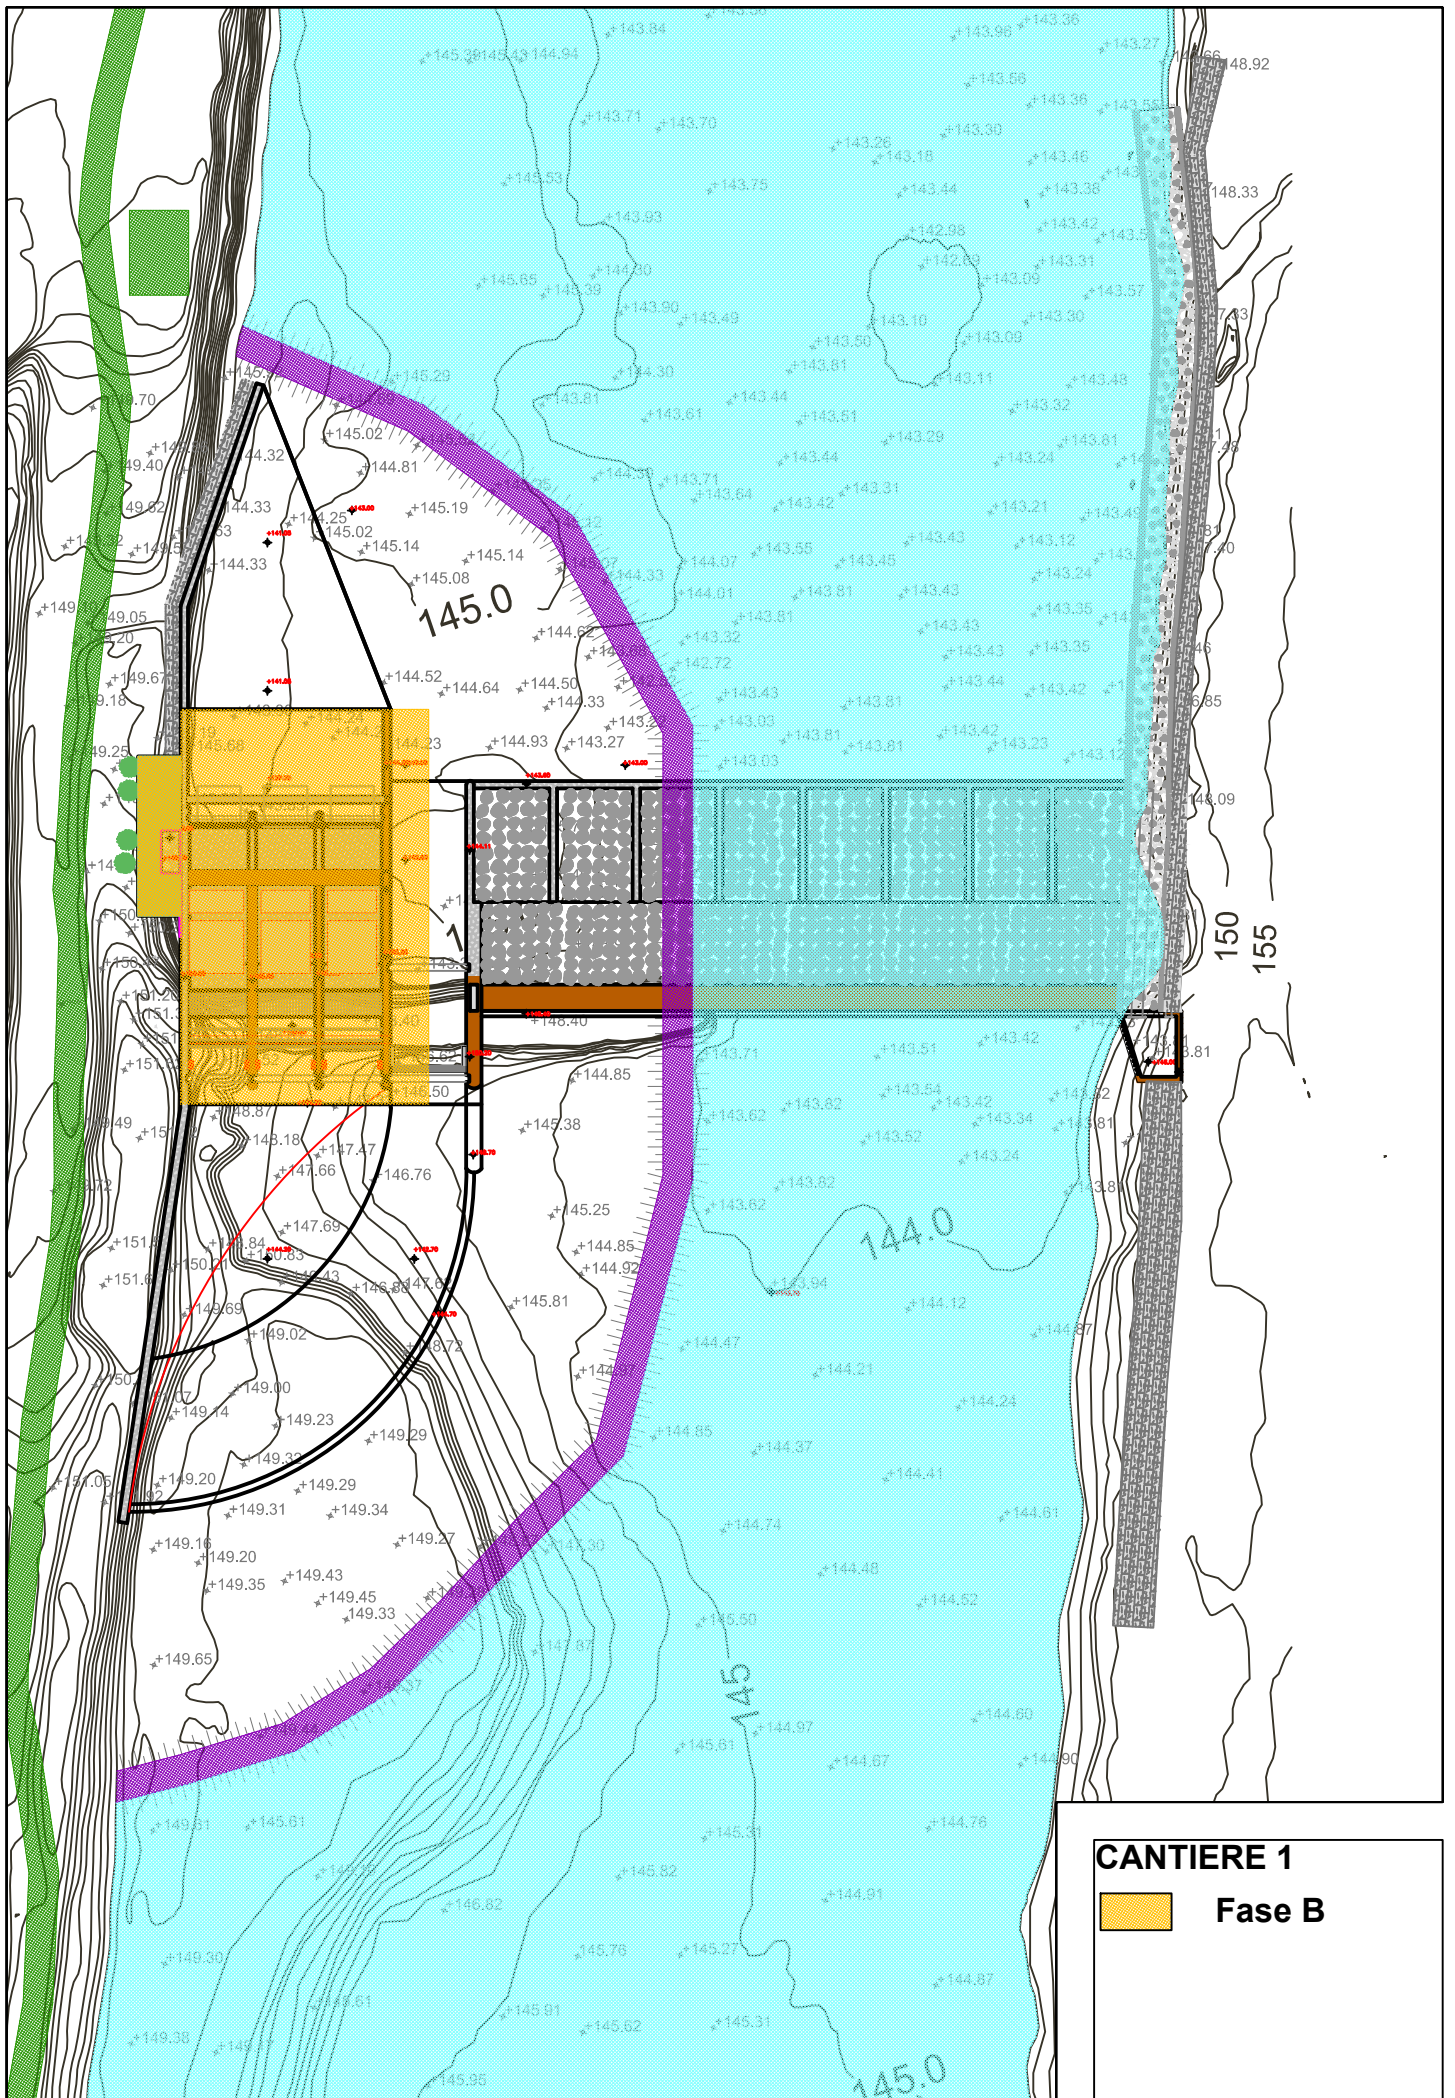



CANTIERE 1

 **Fase B**

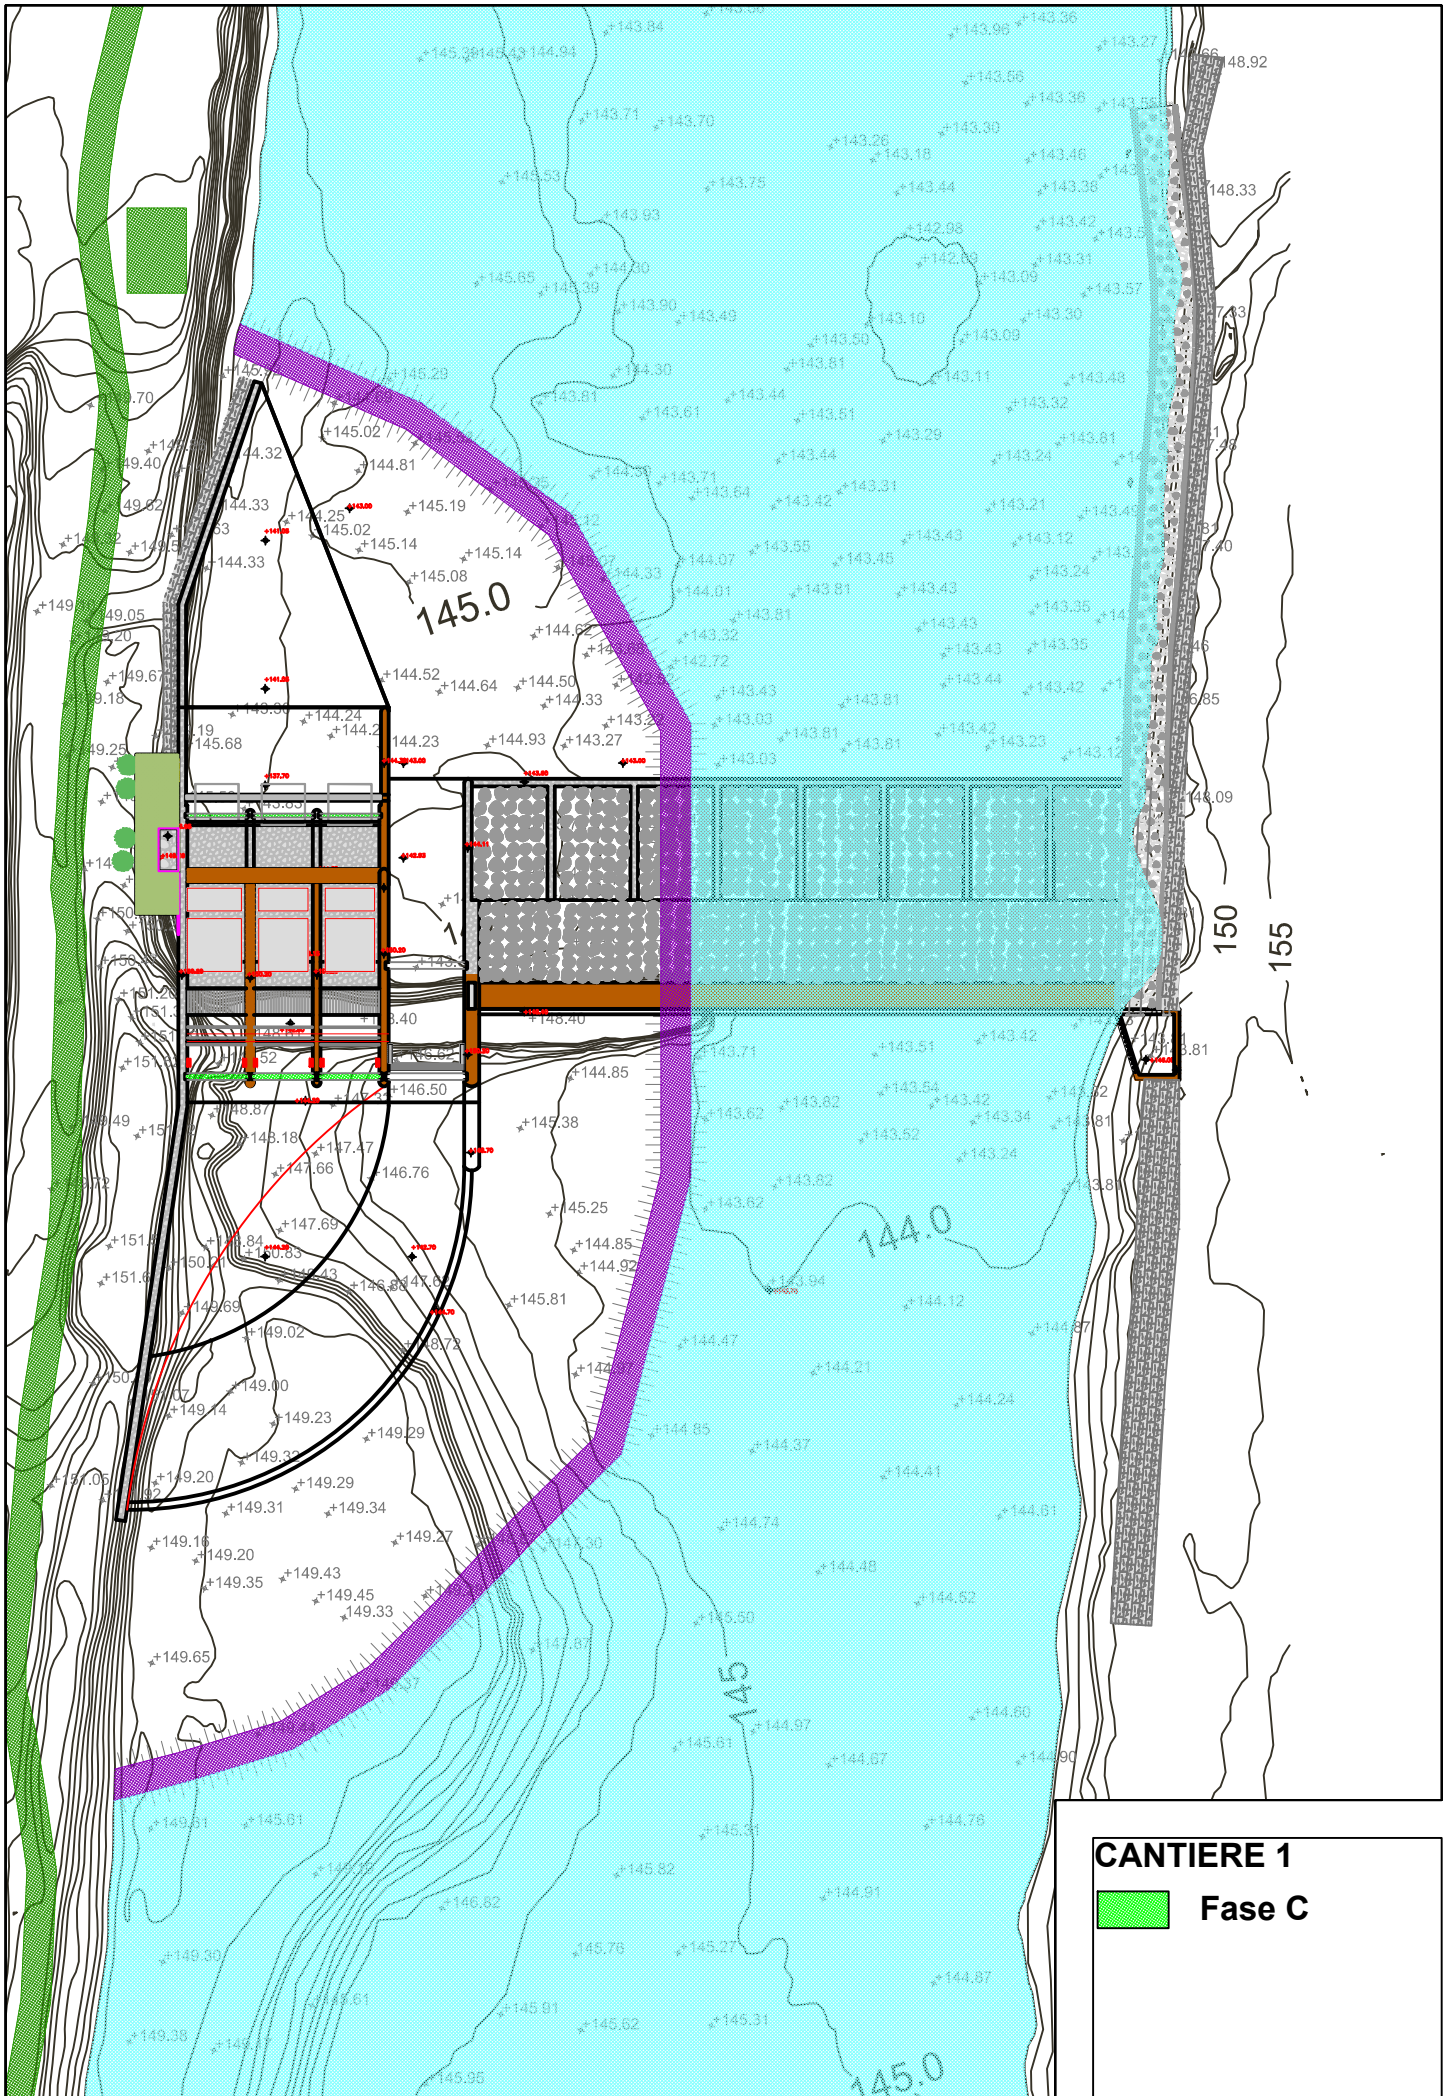


CANTIERE 1
 **Fase C**

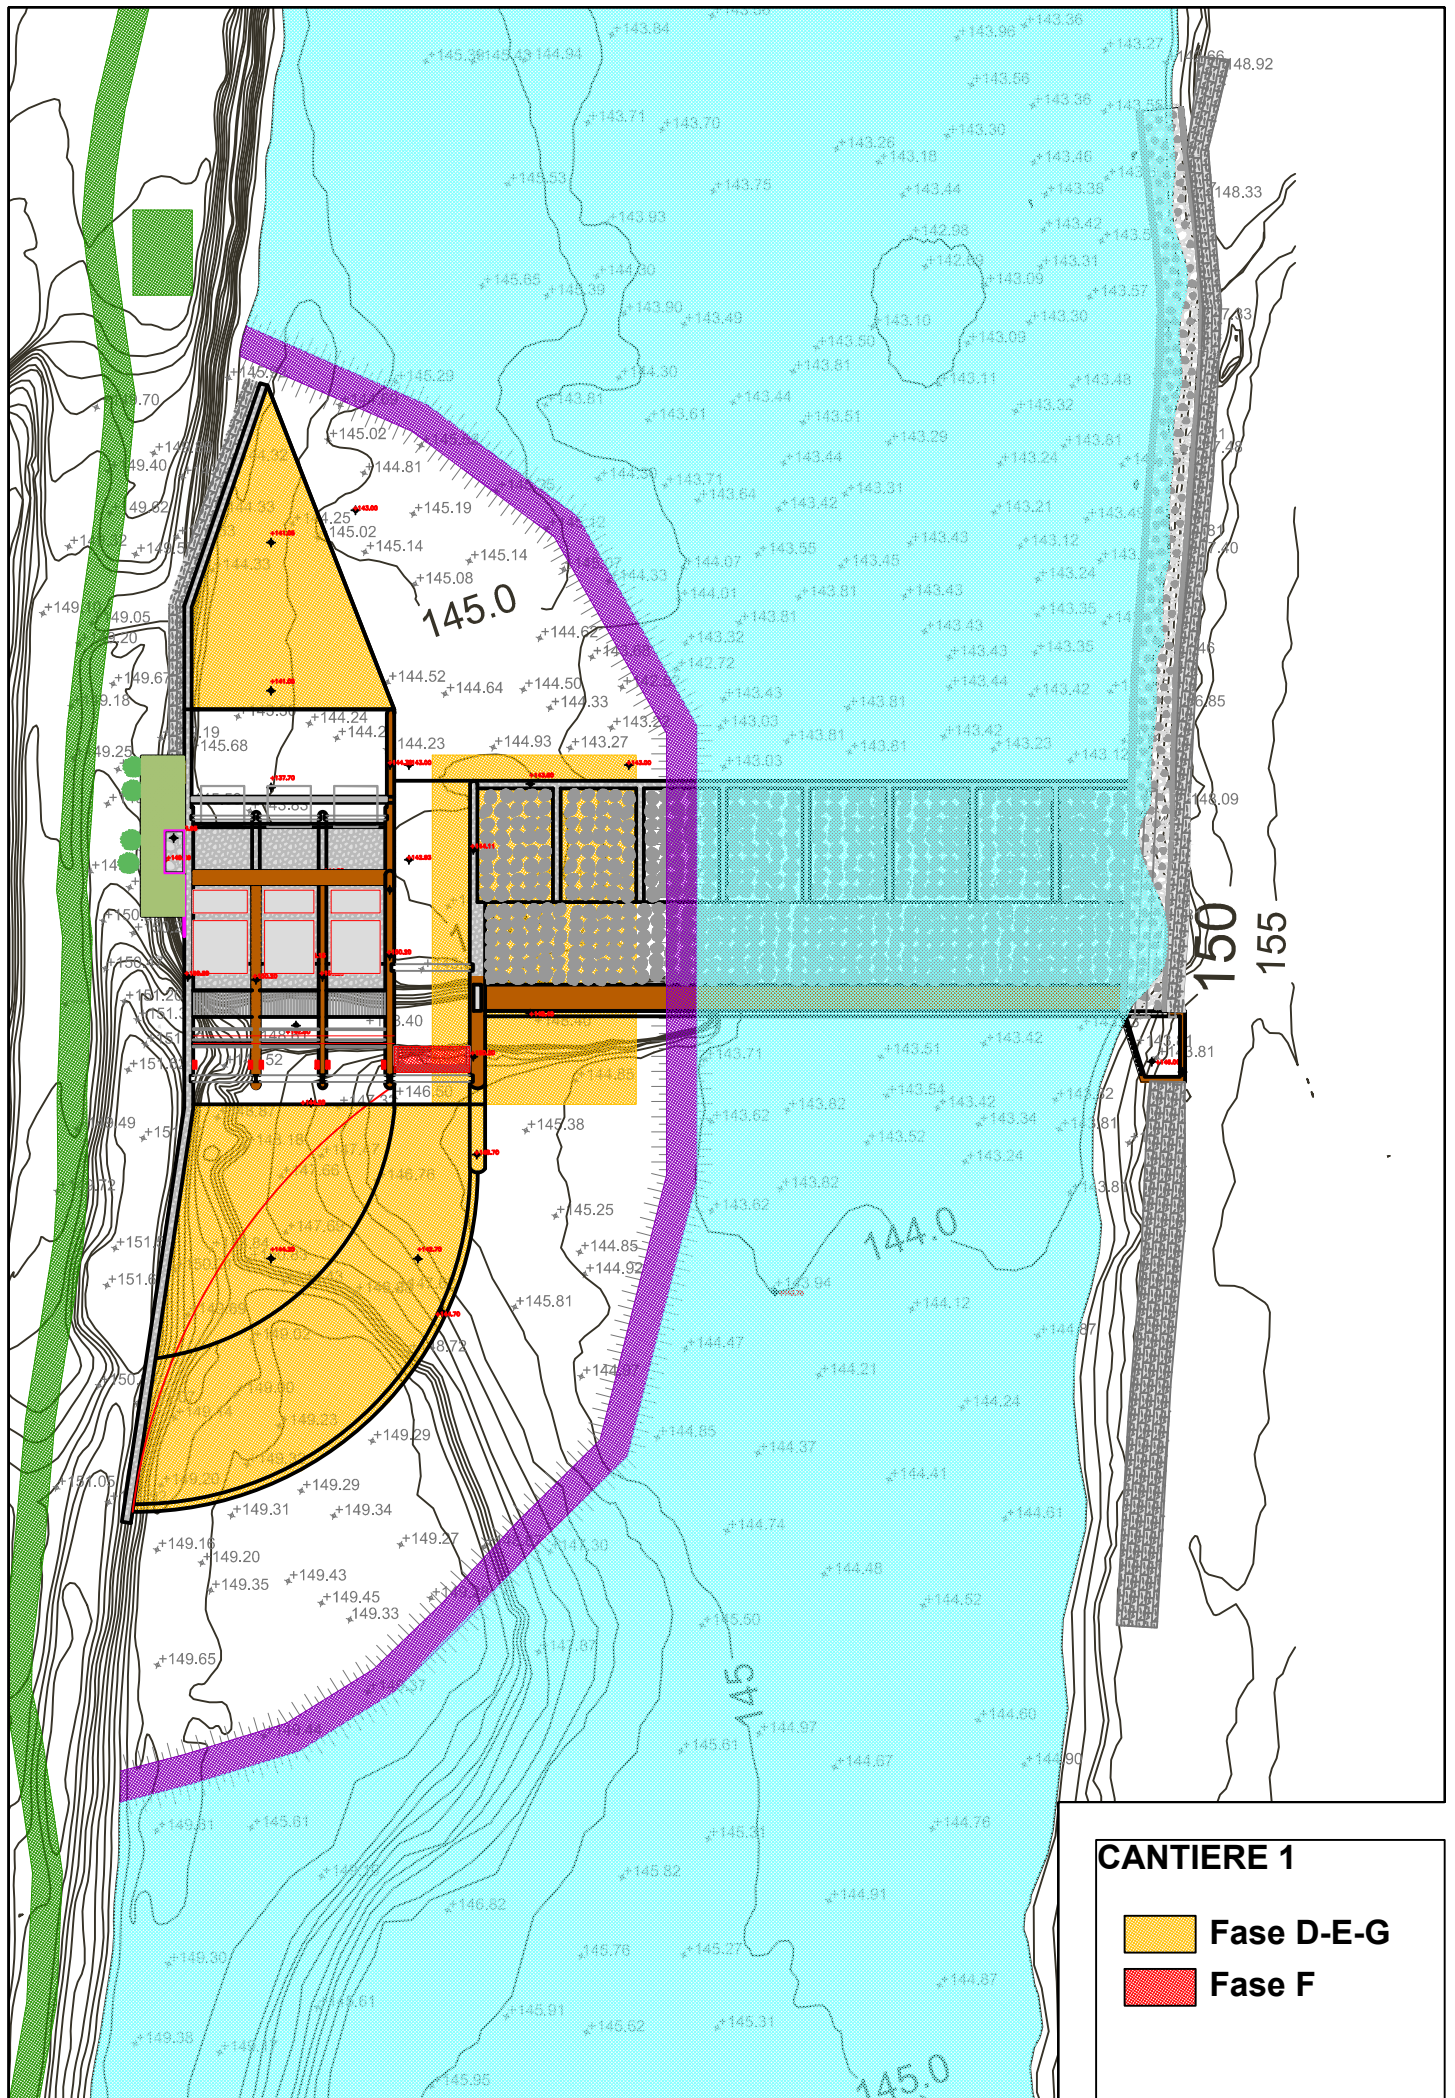

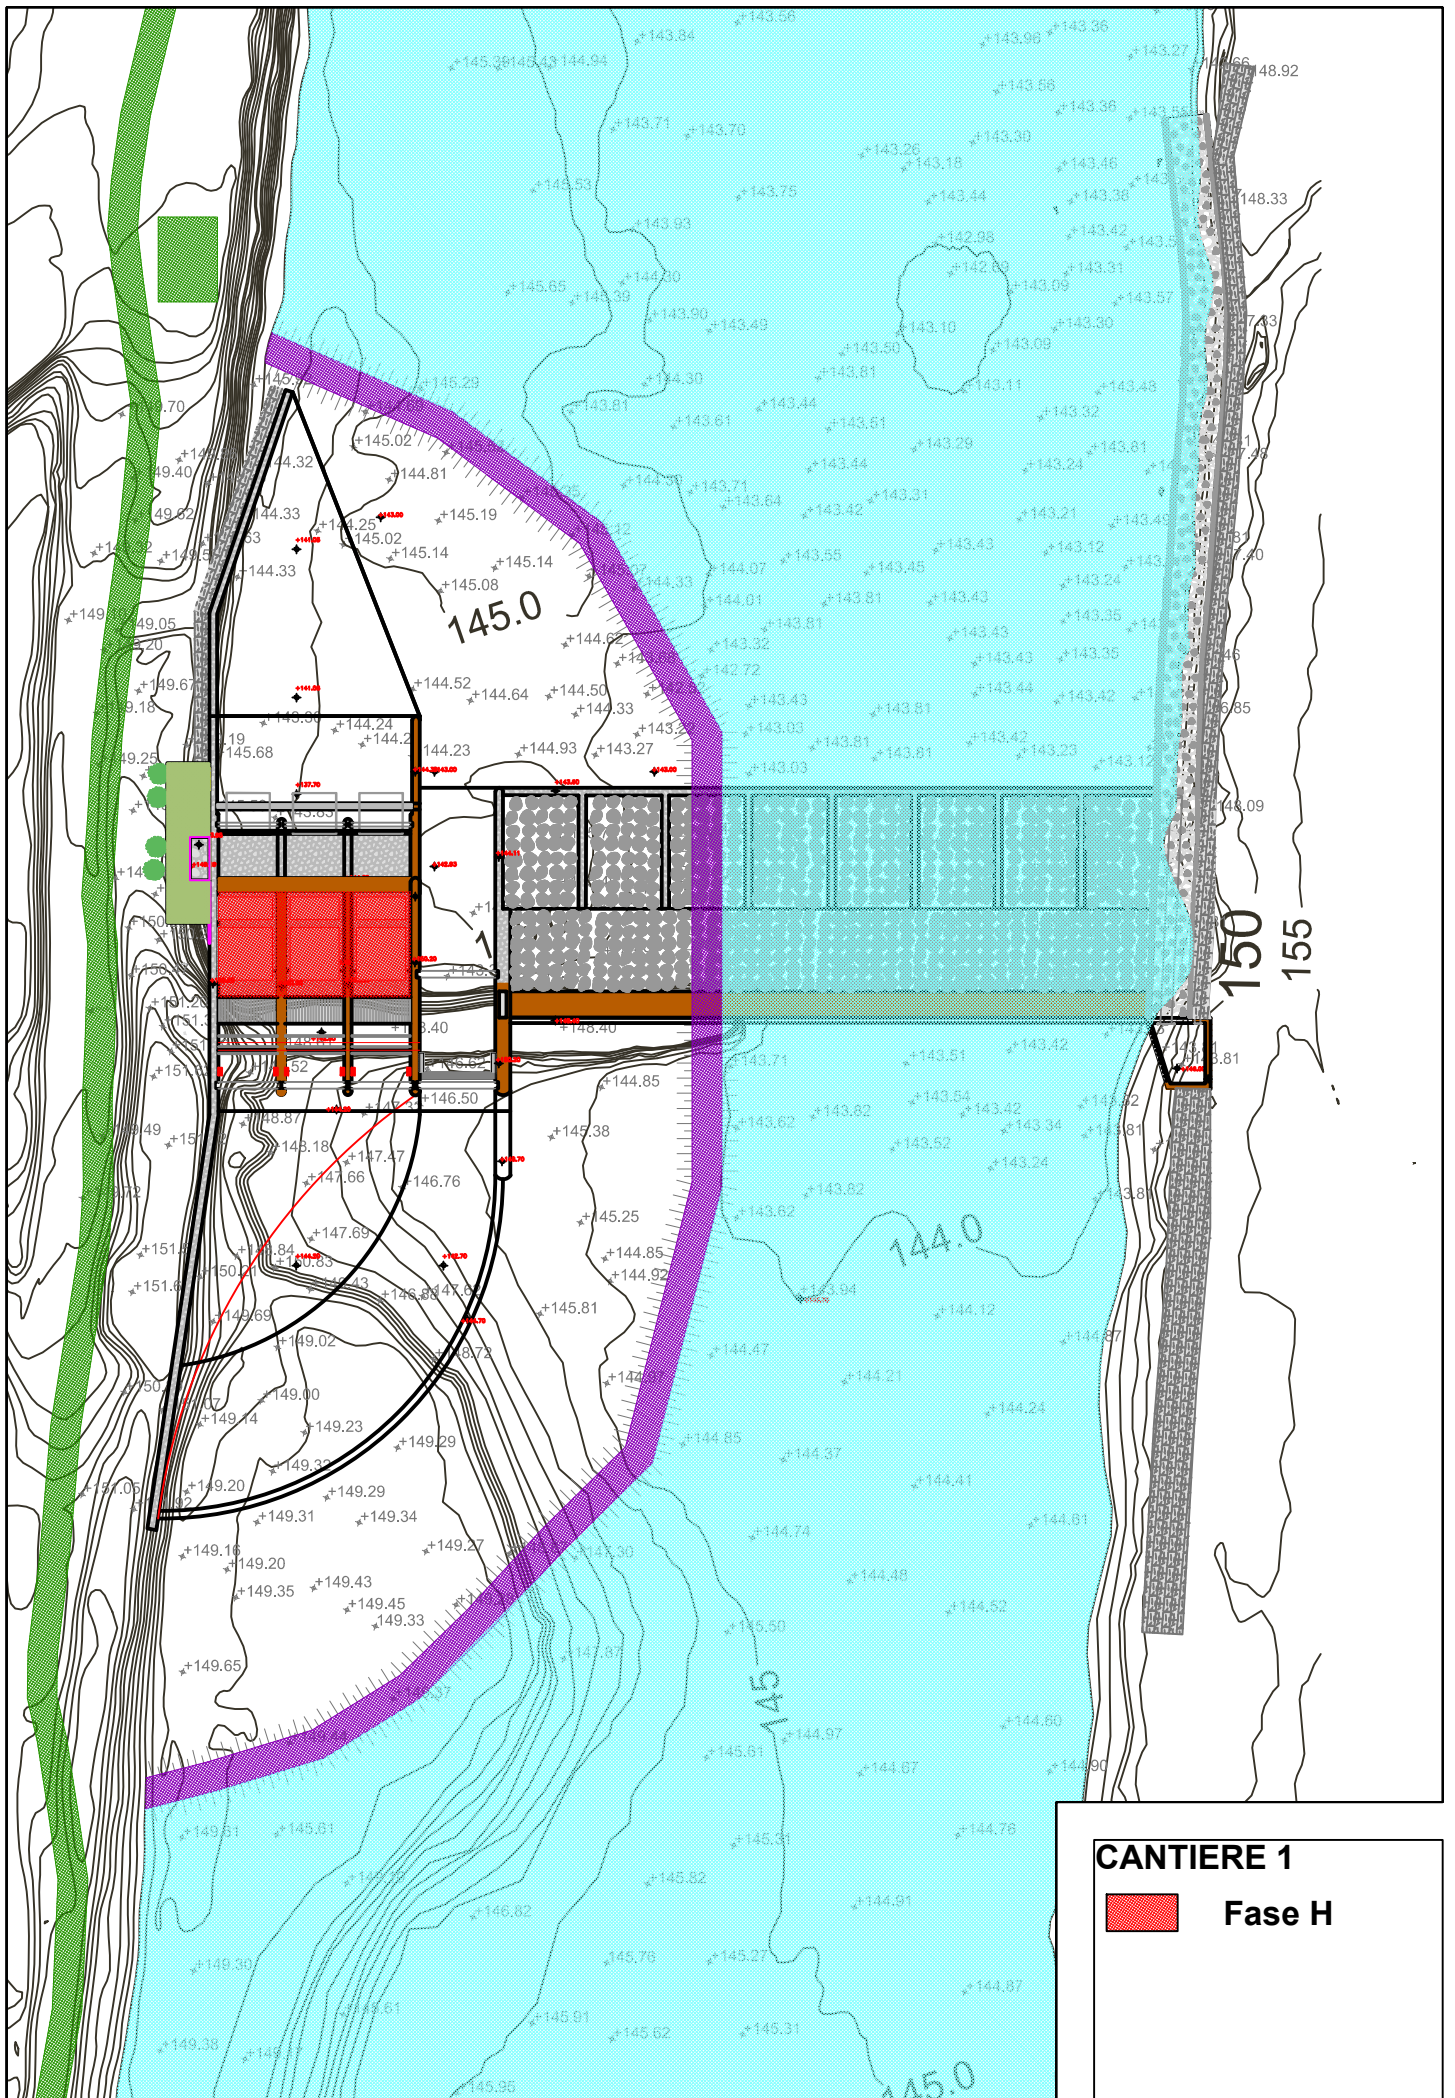

CANTIERE 1

 **Fase H**

