

viale Italia, 592  
20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Tel. 02 890391  
Fax 02 89039351  
www.edipower.it

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
ex Divisione VI – Rischio Industriale – Prevenzione  
e Controllo Integrati dell'inquinamento

**Dott. Giuseppe Lo Presti**

Via C. Colombo, 44

00147 Roma  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
dsa-ris@mi.mhambiente.it

E p.c. ISPRA

**E. prot DVA - 2010 - 0031712 del 29/12/2010**

Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il  
coordinamento e il controllo delle attività  
ispettive.

**Ing. Alfredo Pini**

Via V. Brancati, 48

00144 Roma

controlli-aia@isprambiente.it

**Sesto San Giovanni (MI), 23 dicembre 2010 – prot. ASIQ/16527**

**Raccomandata A.R.  
Anticipata via mail**


**Oggetto: ex DSA-DEC-2009-0000974 del 03/08/2009 – Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Edipower Spa sita in Piacenza (PC). Richiesta di proroga della scadenza relativa alla prescrizione di cui al paragrafo 10.5 del Parere Istruttorio. Aggiornamento stato di avanzamento lavori**

Facciamo riferimento alla nota DVA-2010-30913 del 21/12/2010, con cui codesto Ministero ha trasmesso ad ISPRA l'istanza Edipower, prot. 15113 del 15.11.2010, di proroga per la scadenza relativa al completamento delle operazioni di smantellamento, demolizione e bonifica del deposito di oli combustibili presente presso la centrale di Piacenza, di cui al paragrafo 10.5 "Stoccaggi" del Parere Istruttorio allegato al decreto AIA della centrale stessa.

In attesa della formulazione, in ragione delle evidenze da noi addotte e opportunamente documentate, del richiesto riscontro da parte di ISPRA, trasmettiamo in allegato alla presente idonea documentazione che attesta lo stato di avanzamento delle opere, con particolare evidenza per le attività realizzate dalla presentazione della citata istanza ad oggi.

Con i migliori saluti.

Edipower S.p.A.  
Ambiente Sicurezza e Qualità  
(Direttore)  
Fausto Antonioli



Allegati:

- ✓ documentazione fotografica relativa alle ulteriori opere realizzate dal 28.10.2010 al 20.12.2010;
- ✓ programma cronologico definitivo delle opere, con evidenza delle attività già completate.

**Edipower spa** - Sede legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano

Capitale sociale euro 700.000.000 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - C.F. e P.I. 13442230150 - REA di Milano 1651649

Euro 1.441.300.000 I.V.

Allegato 1 - Documentazione fotografica relativa alle ulteriori opere realizzate dal 28.10.2010 al 20.12.2010.



Realizzazione Progetti

**CENTRALE TERMOELETTRICA DI PIACENZA**

**Demolizione deposito oli combustibili**

**Appaltatore DESPE s.p.a.**




A handwritten signature in the bottom left corner of the page.


## **CRONOLOGIA ATTIVITA' DEL CANTIERE DAL 28-10-2010 AL 20-12-2010:**

- Demolizione parete verticale serb. n° 2 11-10-2010 ÷ 12-11-2010;
- Rimozione guarnizione amianto tetto mobile serb. n° 3 e n° 1 3-11-2010 ÷ 26-11-2010;
- Svuotamento fase liquida OCD serbatoio n° 1 25-10-2010 ÷ 05-11-2010;
- Svuotamento fase liquida OCD serbatoio n° 3 e rimozione morchie 28-10-2010 ÷ 20-12-2010;
- Inizio attività di svuotamento da OCD tubazioni bacino 1-2 25-10-2010;
- Smaltimento OCD serbatoio n° 3 16-11-2010 ÷ 16-12-2010;
- Inizio smaltimento ferro 23-11-2010;
- Inizio scoibentazione tubi movimento OCD e vapore 23-11-2010;
- Demolizione tetto serbatoio n° 3 24-11-2010 ÷ 10-12-2010;
- Scoibentazione stazione pompaggio OCD 1-12-2010 ÷ 20-12-2010;
- Scoibentazione collettore serbatoi giornalieri 3-12-2010 ÷ 16-12-2010;
- Inizio demolizione sovrastrutture scarico ferro cisterne 17-12-2010;
- Inizio demolizione tetto serbatoio n° 1 20-12-2010.


**In sequenza foto cronologiche dei lavori eseguiti:**

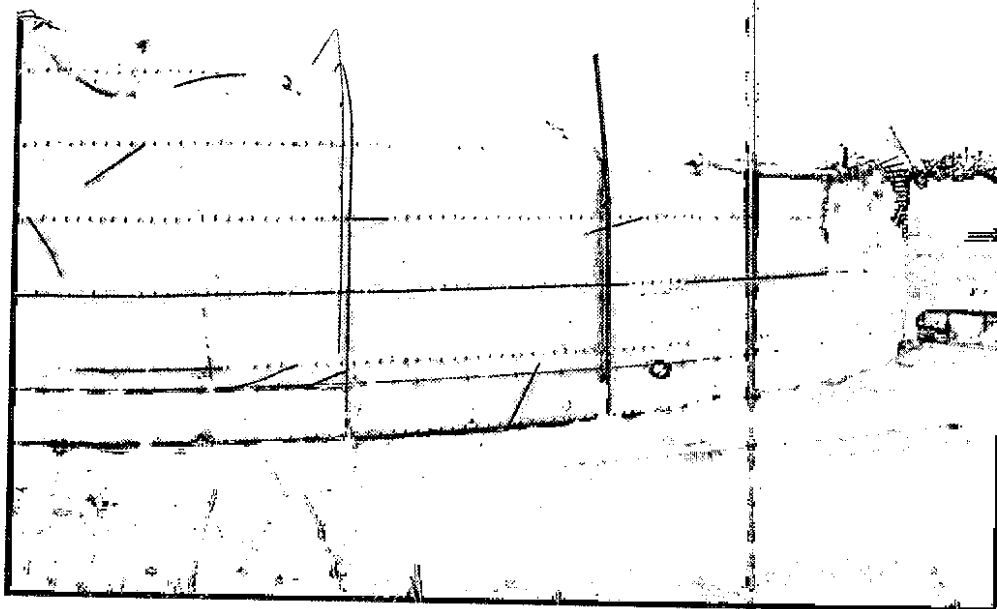


Inizio demolizione parete verticale serbatoio n. 2, 11-10-2010.

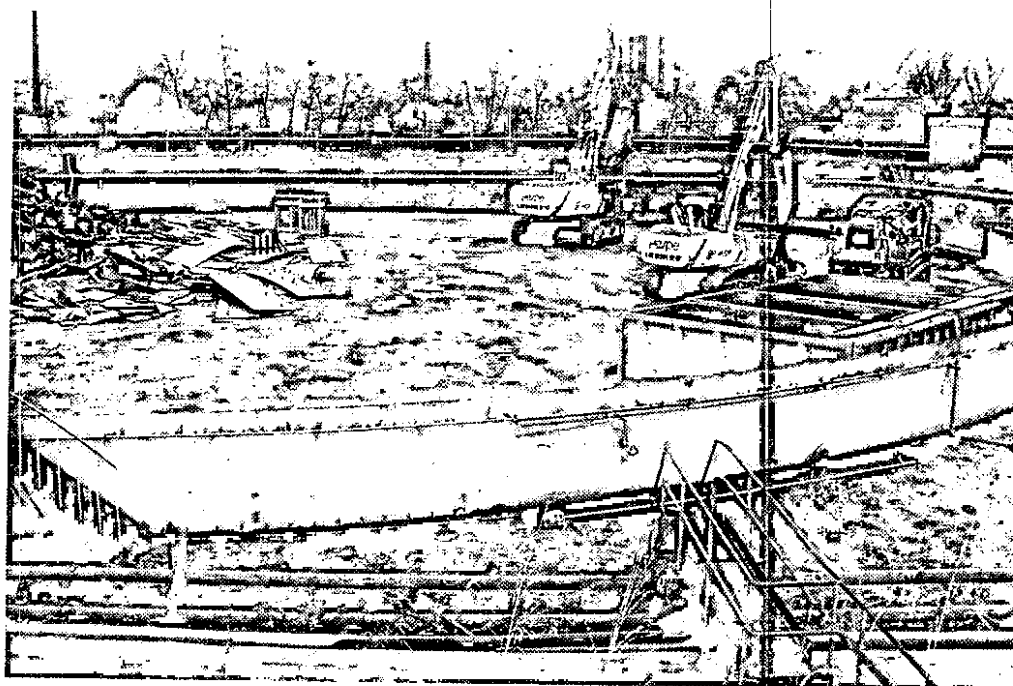


Fine demolizione parete verticale serbatoio n. 2, 12-11-2010.

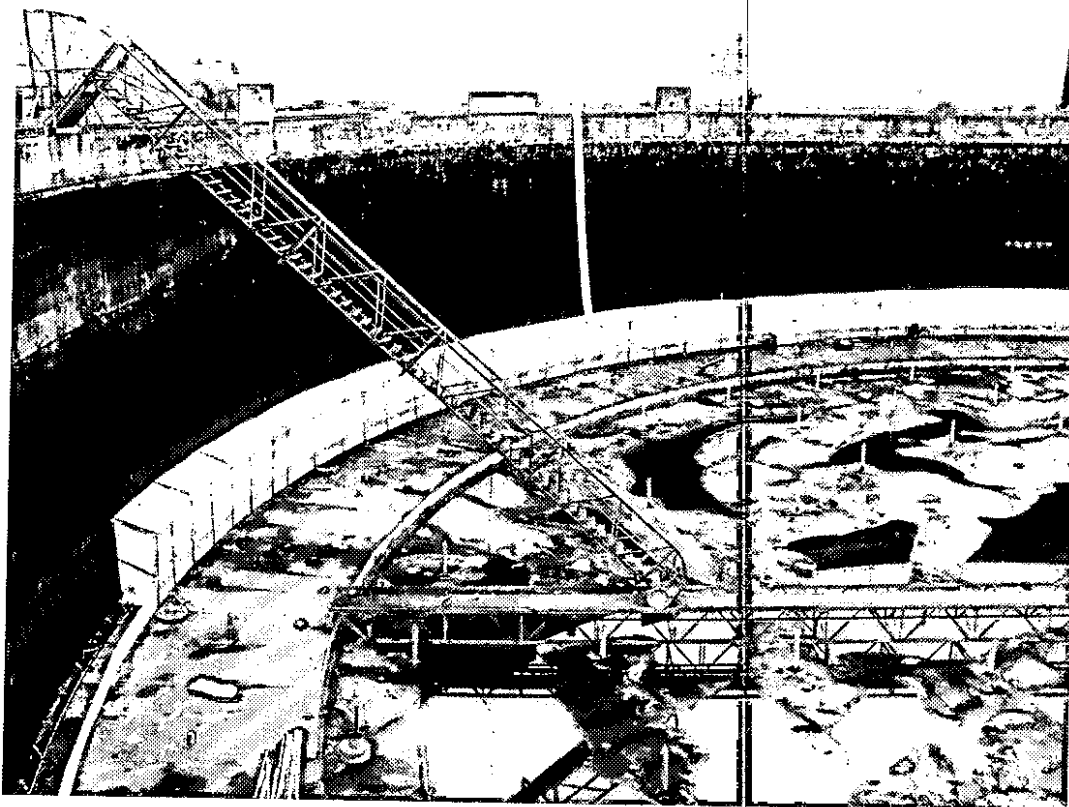

Rimozione guarnizione amianto tetto mobile serbatoio n° 3, 16-11-2010 ÷ 26-11-2010.

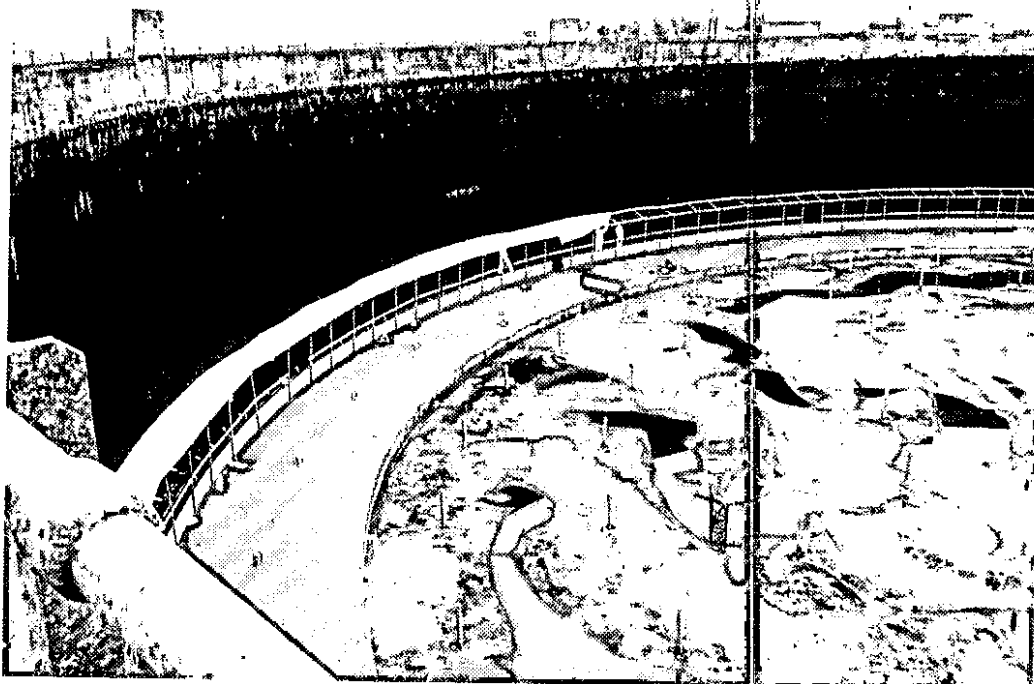

Rimozione guarnizione amianto tetto mobile serbatoio n° 1, 3-11-2010 ÷ 15-11-2010.

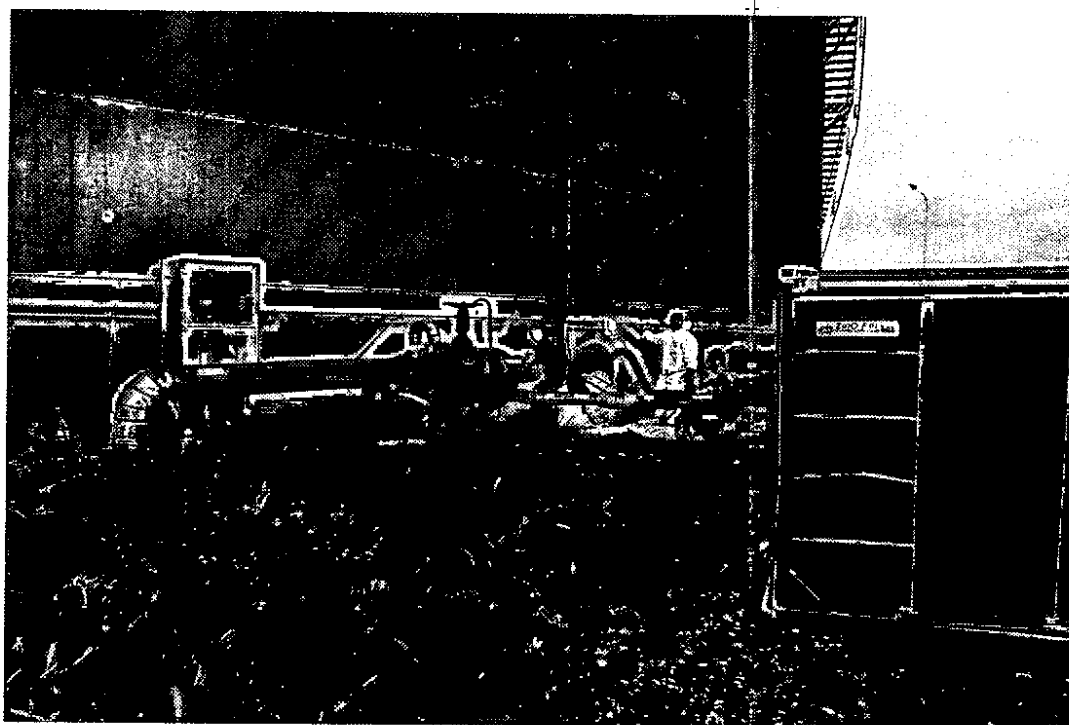


Svuotamento fase liquida OCD serbatoio n° 3 e rimozione morchie, 28-10-2010 ÷ 20-12-2010.



Svuotamento fase liquida OCD serbatoio n° 1, 25-10-2010 ÷ 5-11-2010.




Inizio svuotamento da OCD tubazioni interno bacino, dal 25-10-2010.

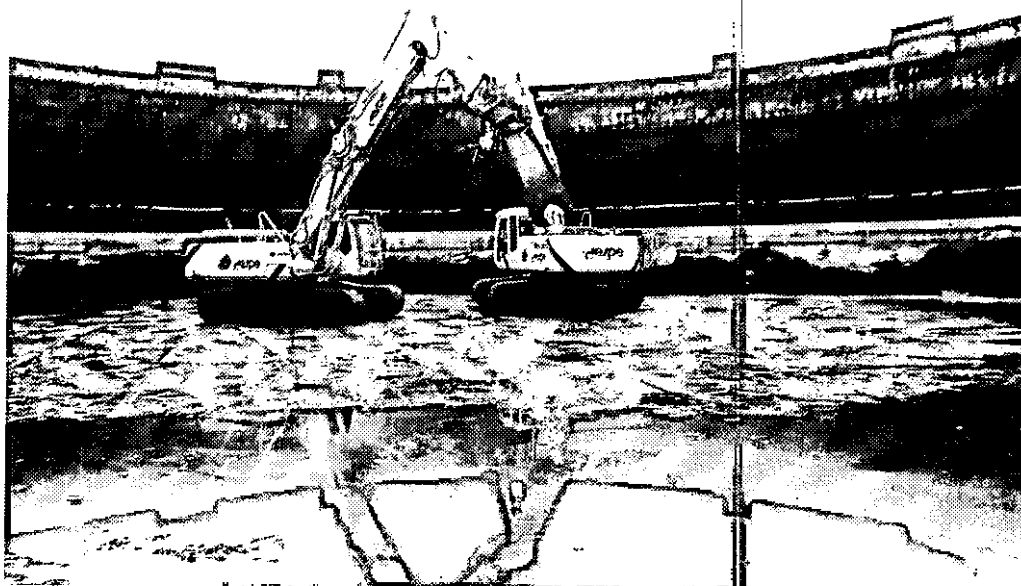

Demolizione tetto serbatoio n° 3, 24-11-2010 ÷ 10-12-2010.




Smaltimento OCD serbatoio n° 3, 16-11-2010 ÷ 16-12-2010.

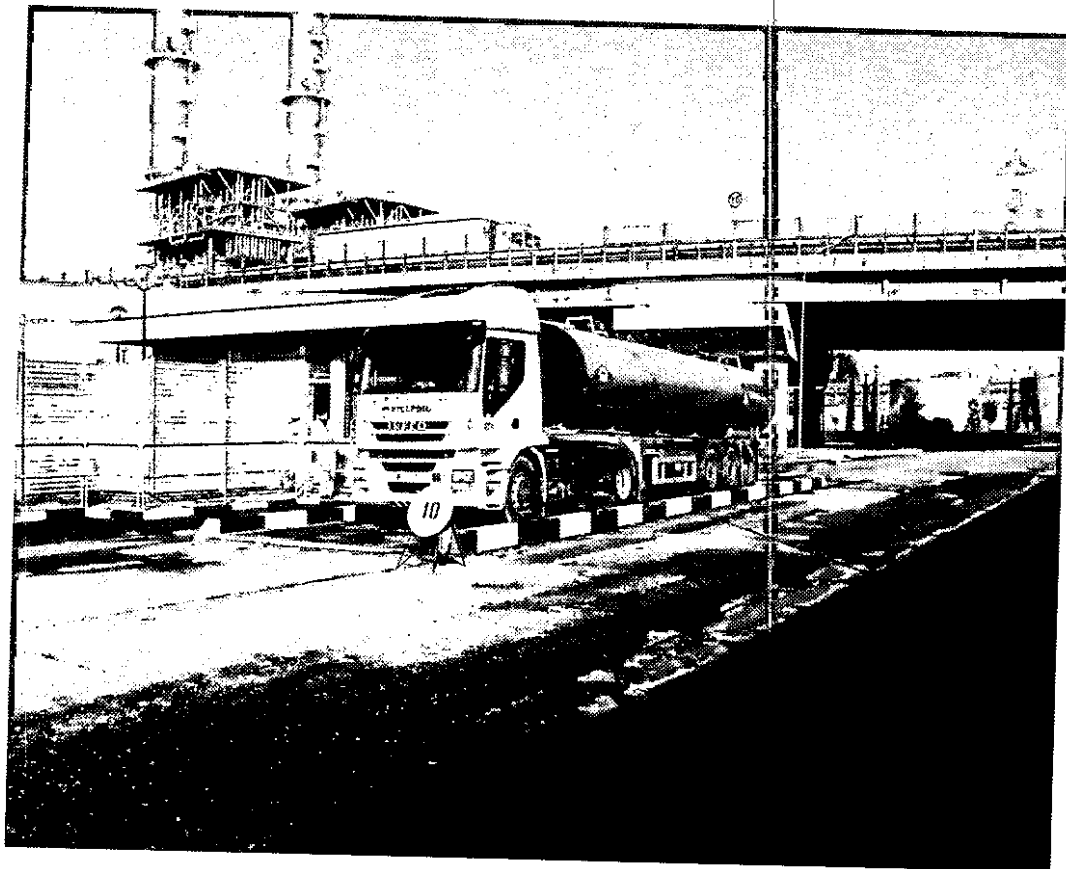


Smaltimento OCD serbatoio n° 3, 16-11-2010 ÷ 16-12-2010.




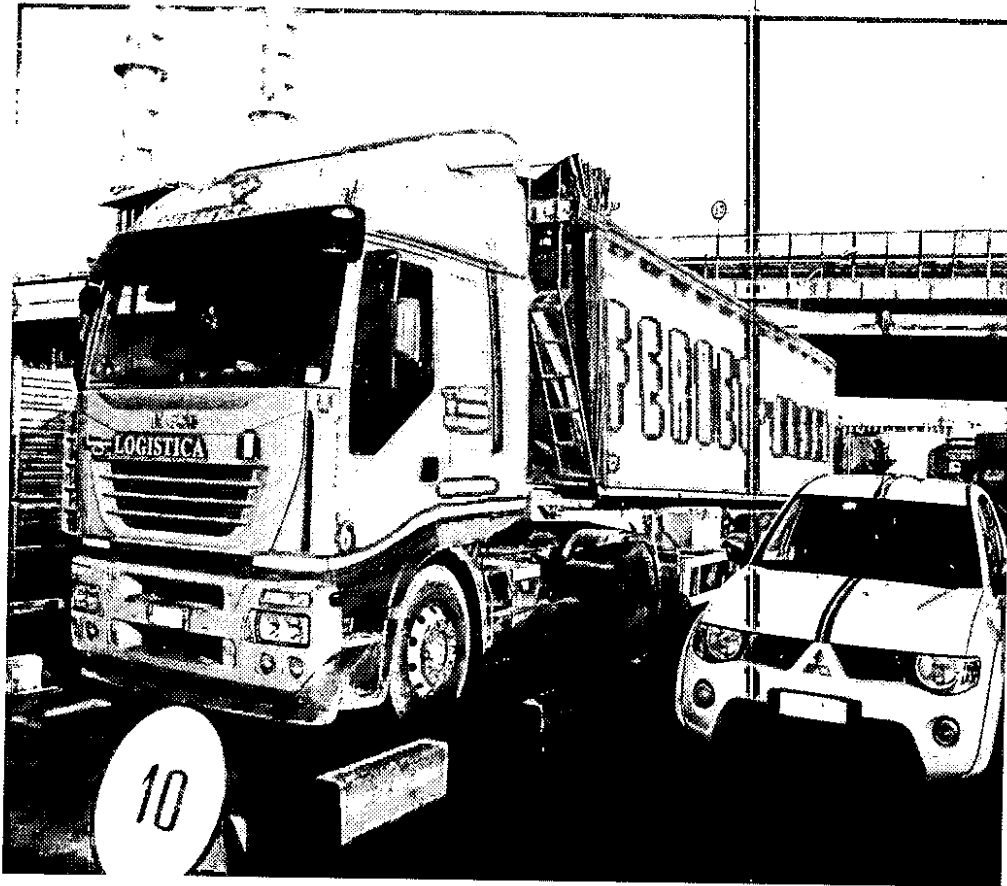


Smaltimento ferro, dal 23-11-2010.

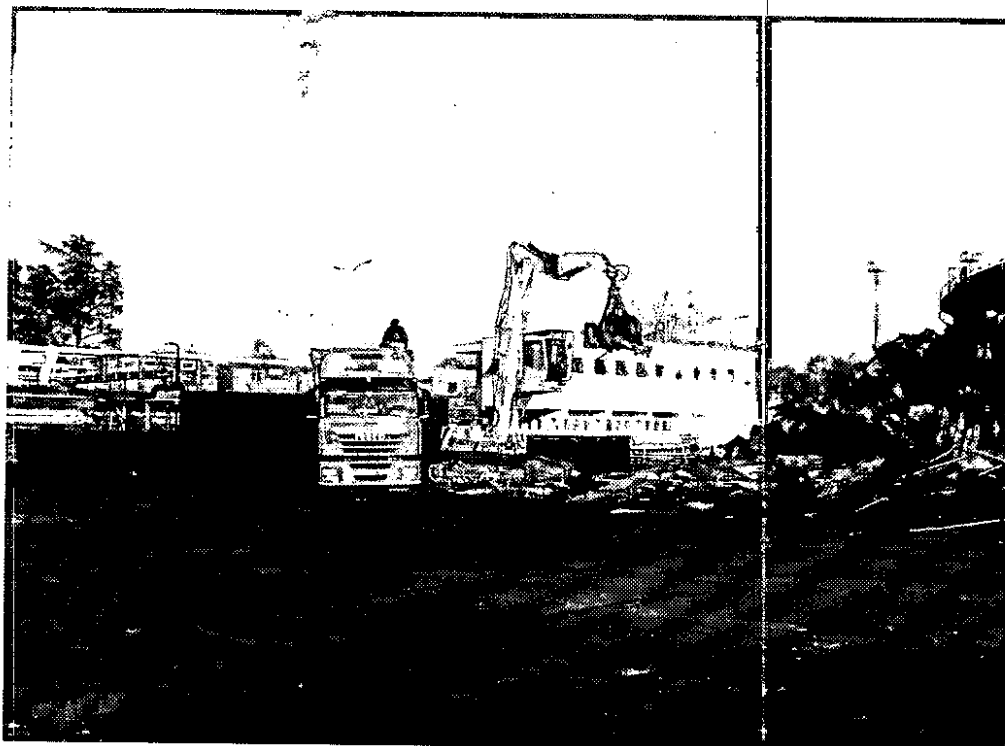


Smaltimento ferro, dal 23-11-2010.

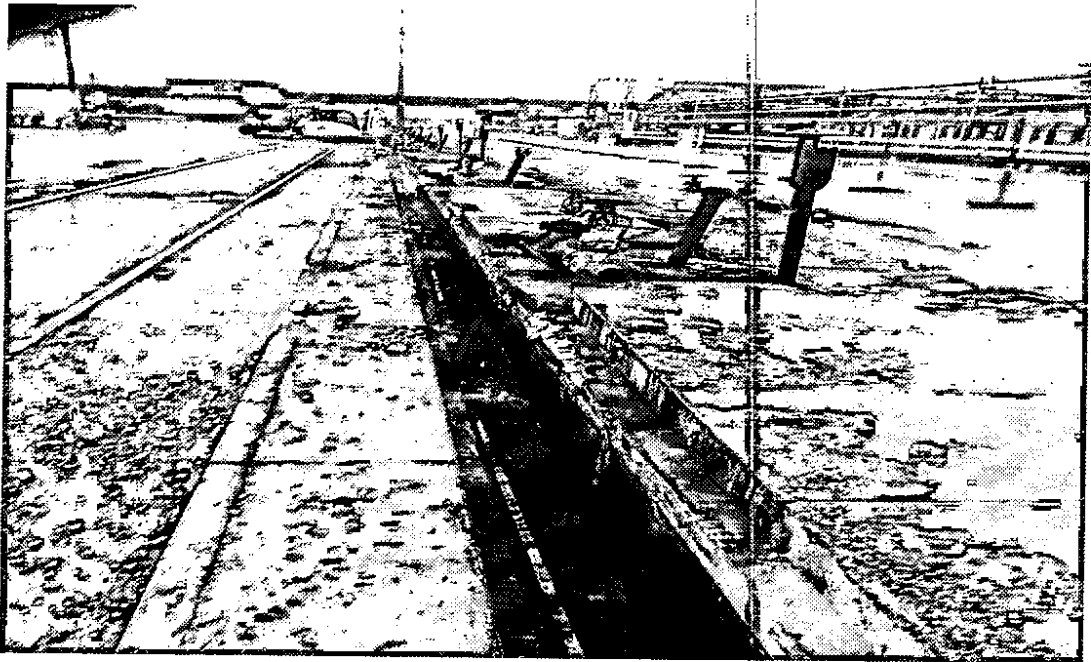


Demolizione sovrastrutture scarico autobotti, dal 17-12-2010.

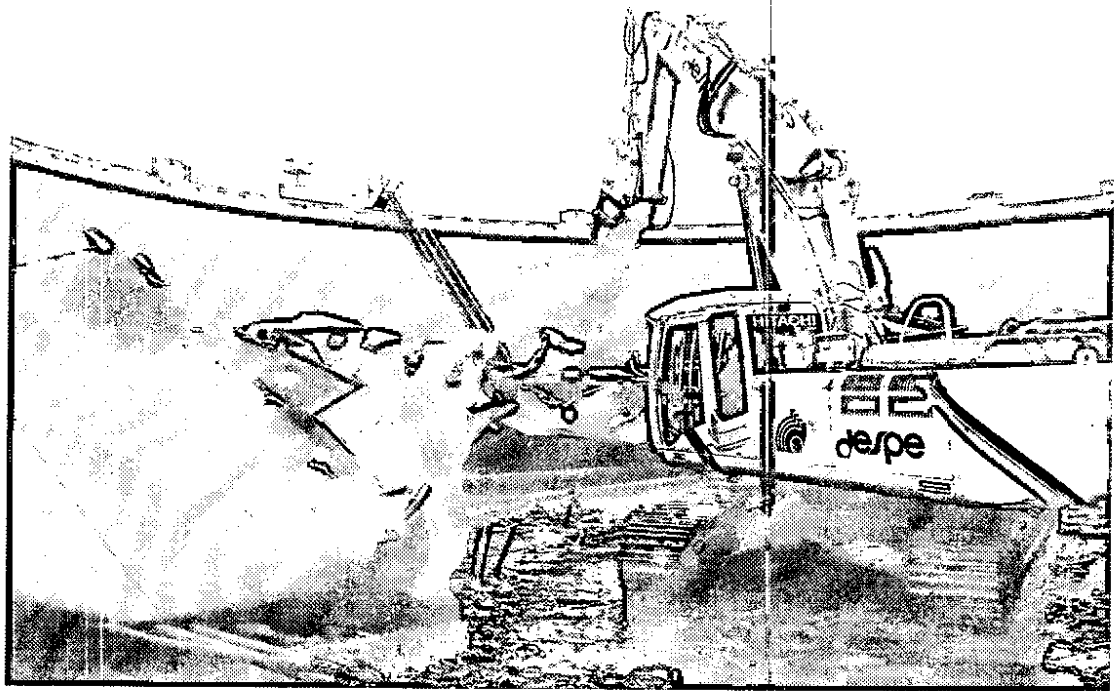

Demolizione tetto mobile serbatoio n° 1, dal 20-12-2010.

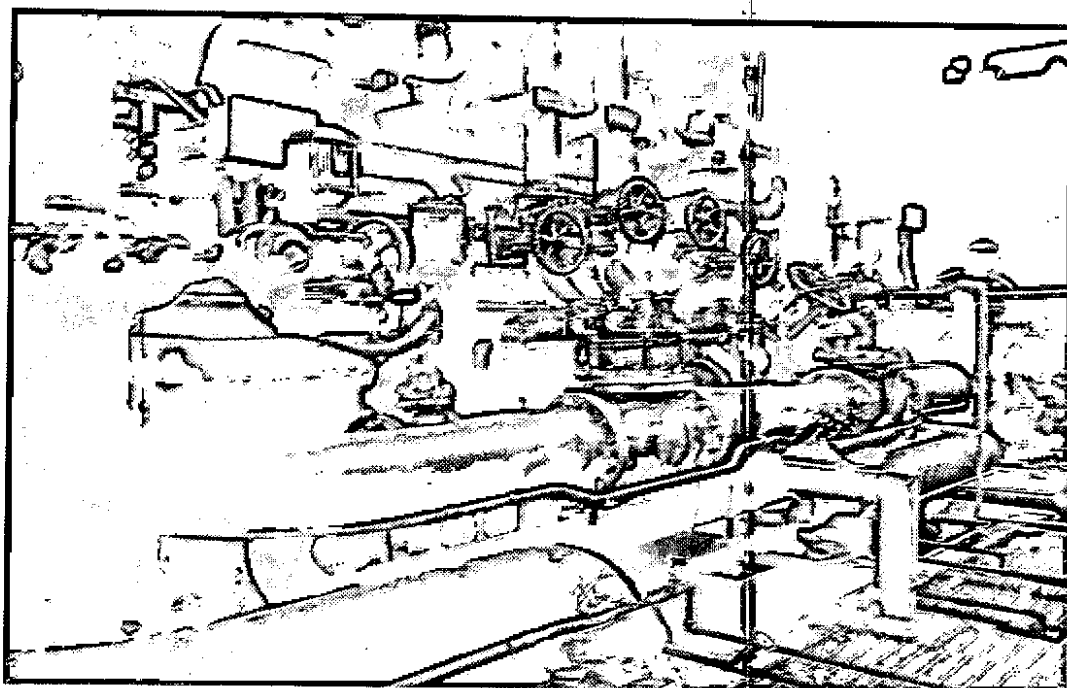

Scoibentazione collettore serbatoi giornalieri, 3-12-10 ÷ 16-12-2010.

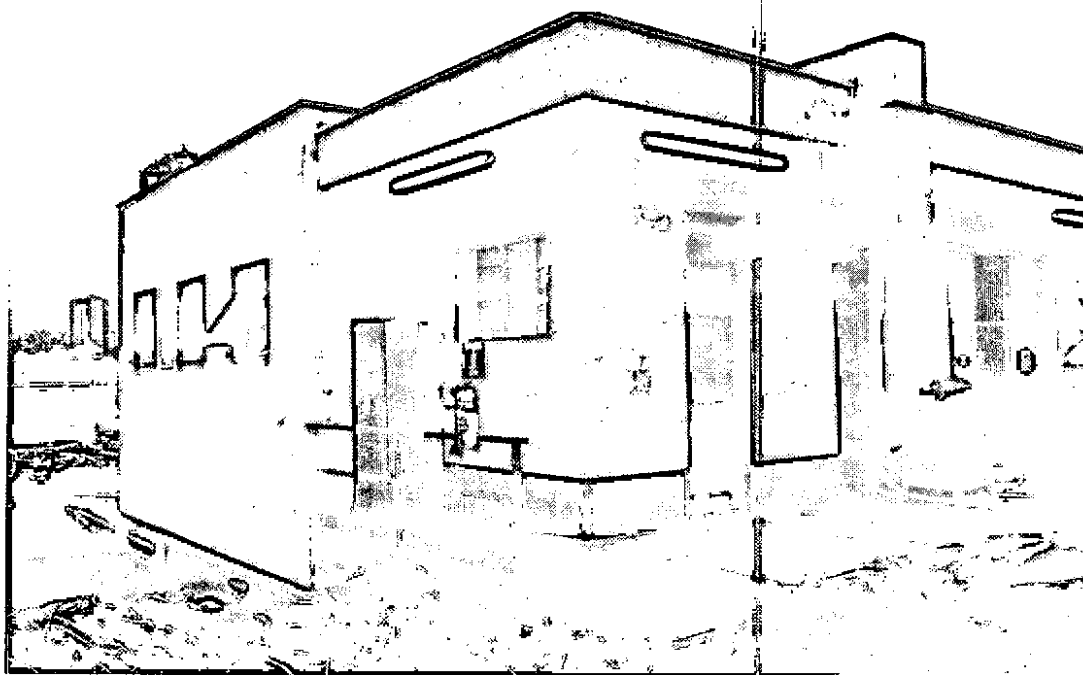

Scoibentazione stazione pompaggio OCD, 1-12-10 ÷ 20-12-2010.

