



Anas SpA

Compartimento della Viabilità per la Puglia

PROVINCIA DI BARI

S.S. N 106 "JONICA"

LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE INTERSEZIONI E MIGLIORAMENTO
DEGLI STANDARD DI SICUREZZA NEL TRATTO DELLA SS 106 DAL KM 489+500 AL KM 491+000

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE: ANAS - Compartimento della Viabilità per la Puglia

PROGETTISTI Dott. Ing. Biagio MINUTILLO <i>Ordine Ing. di Bari n° 6540</i> Dott. Vincenzo CASTELLANO  		GRUPPO DI PROGETTAZIONE ANAS
IL GEOLOGO Dott. Geol. Pasquale SCORCIA <i>Ordine Geol. della Regione Puglia n° 260</i>		
IL RESPONSABILE DEL S.I.A. Dott. Geol. Pasquale SCORCIA <i>Ordine Geol. della Regione Puglia n° 260</i>		
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Biagio MINUTILLO  		VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Carlo PULLANO  
DATA	COD. SIL	ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE: PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ING. ANTONIO CARUSO Via A. T. Stella, 13 – 76125 Trani tel.335 6882517–fax 0883 884772
PROTOCOLLO	CUP	

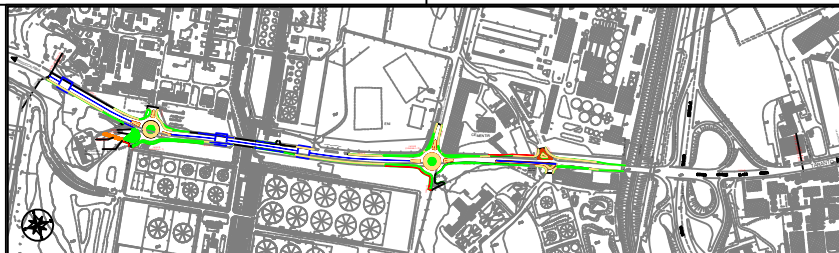


TAVOLA	PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DIAGRAMMA DI GANTT – Cronoprogramma dei lavori
ALLEGATO "A"	

NOME FILE: MA_ALL_A_GANTT			SCALA		
D					
C	integrazioni a seguito del parere ARPA Puglia n.0066790-86 del 18/11/2015 -STTA	DICEMBRE 2015			
B	integrazioni a seguito del parere ARPA Puglia n.0042867-89 del 28/07/2015 -STTA	SETTEMBRE 2015			
A	prima emissione	APRILE 2015			
REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO RESP. TECNICO	CONTROLLATO RESP. D'ITINERARIO	APPROVATO RESP. DI SETTORE

ALLEGATO "A"

Comune di TARANTO

Provincia di TA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: S.S. N. 106 "JONICA" - LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE INTERSEZIONI E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA NEL TRATTO DELLA S.S. 106 DAL KM 489+500 AL KM 491+000

COMMITTENTE: ANAS - Compartimento della viabilità per la Puglia.

CANTIERE: TRATTO DELLA S.S. 106 DAL KM 489+500 AL KM 491+000, TARANTO (TA)

TARANTO, 24/10/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere - dipendente ANAS Minutillo Biagio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ingegnere Responsabile del Procedimento - dipendente ANAS Pullano Carlo)

Ingegnere - dipendente ANAS Minutillo Biagio

Viale Luigi Einaudi, 15
70125 Bari (\$EMPTY_CSP_08\$)
Tel.: \$EMPTY_CSP_09\$ - Fax: Bari
E-Mail: \$EMPTY_CSP_11\$

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE				
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	2	2
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	5	8
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	4	5
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	2	2
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	2	2
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	270	388
Smobilizzo del cantiere	1	E	6	8
SCAVI E RINTERRI				
Scavo di sbancamento	1	E	7	9
	1	E	6	8
	1	E	7	9
Scavo a sezione obbligata	1	E	9	13
	1	E	35	51
Scavo eseguito a mano	1	E	11	15
Rinterro di scavo	1	E	23	32
STRADE				
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	2	2
	1	E	2	2
	1	E	2	2
Formazione di rilevato stradale	1	E	5	7
	1	E	4	6
	1	E	5	7
Formazione di fondazione stradale	1	E	5	7
	1	E	6	8
	1	E	6	8
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	E	4	4
	1	E	5	7
	1	E	4	6
Realizzazione di marciapiedi	1	E	10	15
	1	E	9	13
	1	E	10	12
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	19	28
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	38	52
Realizzazione della carpenteria per opere in c.a.	1	E	40	56
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere in c.a.	1	E	36	50
Getto in calcestruzzo per opere in c.a	1	E	12	16
Montaggio di guard-rails	1	E	27	38

Tabella Analitica Gantt

Posa di pali per pubblica illuminazione	1	E	18	26
Montaggio di apparecchi illuminanti	1	E	17	26
Posa di segnali stradali	1	E	5	8
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	17	23
SERVIZI E IMPIANTI A RETE				
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	11	15
Posa di conduttura telefonica	1	E	17	24
Posa di speco fognario prefabbricato	1	E	9	12
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	1	E	17	26
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	1	E	17	23
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1	E	25	39
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	1	E	29	43
SISTEMAZIONE A VERDE				
Messa a dimora di piante	1	E	14	19
Risezionamento del profilo del terreno	1	E	5	5

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) =

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

