



FASE 1

- PREDISPOSIZIONE PIANO DI LAVORO
- ESECUZIONE DELLA CHIODATURA RADIALE A SOSTEGNO DEI CONCI PREFABBRICATI DELLA GALLERIA
- ESECUZIONE DEL CONSOLIDAMENTO PREVENTIVO, LATERALE, PER IL FUTURO SCAVO DEGLI INNESTI
- ESECUZIONE DEL CONSOLIDAMENTO DALL'ALTO PER LO SCAVO DEL FUTURO PASSAGGIO PEDONALE

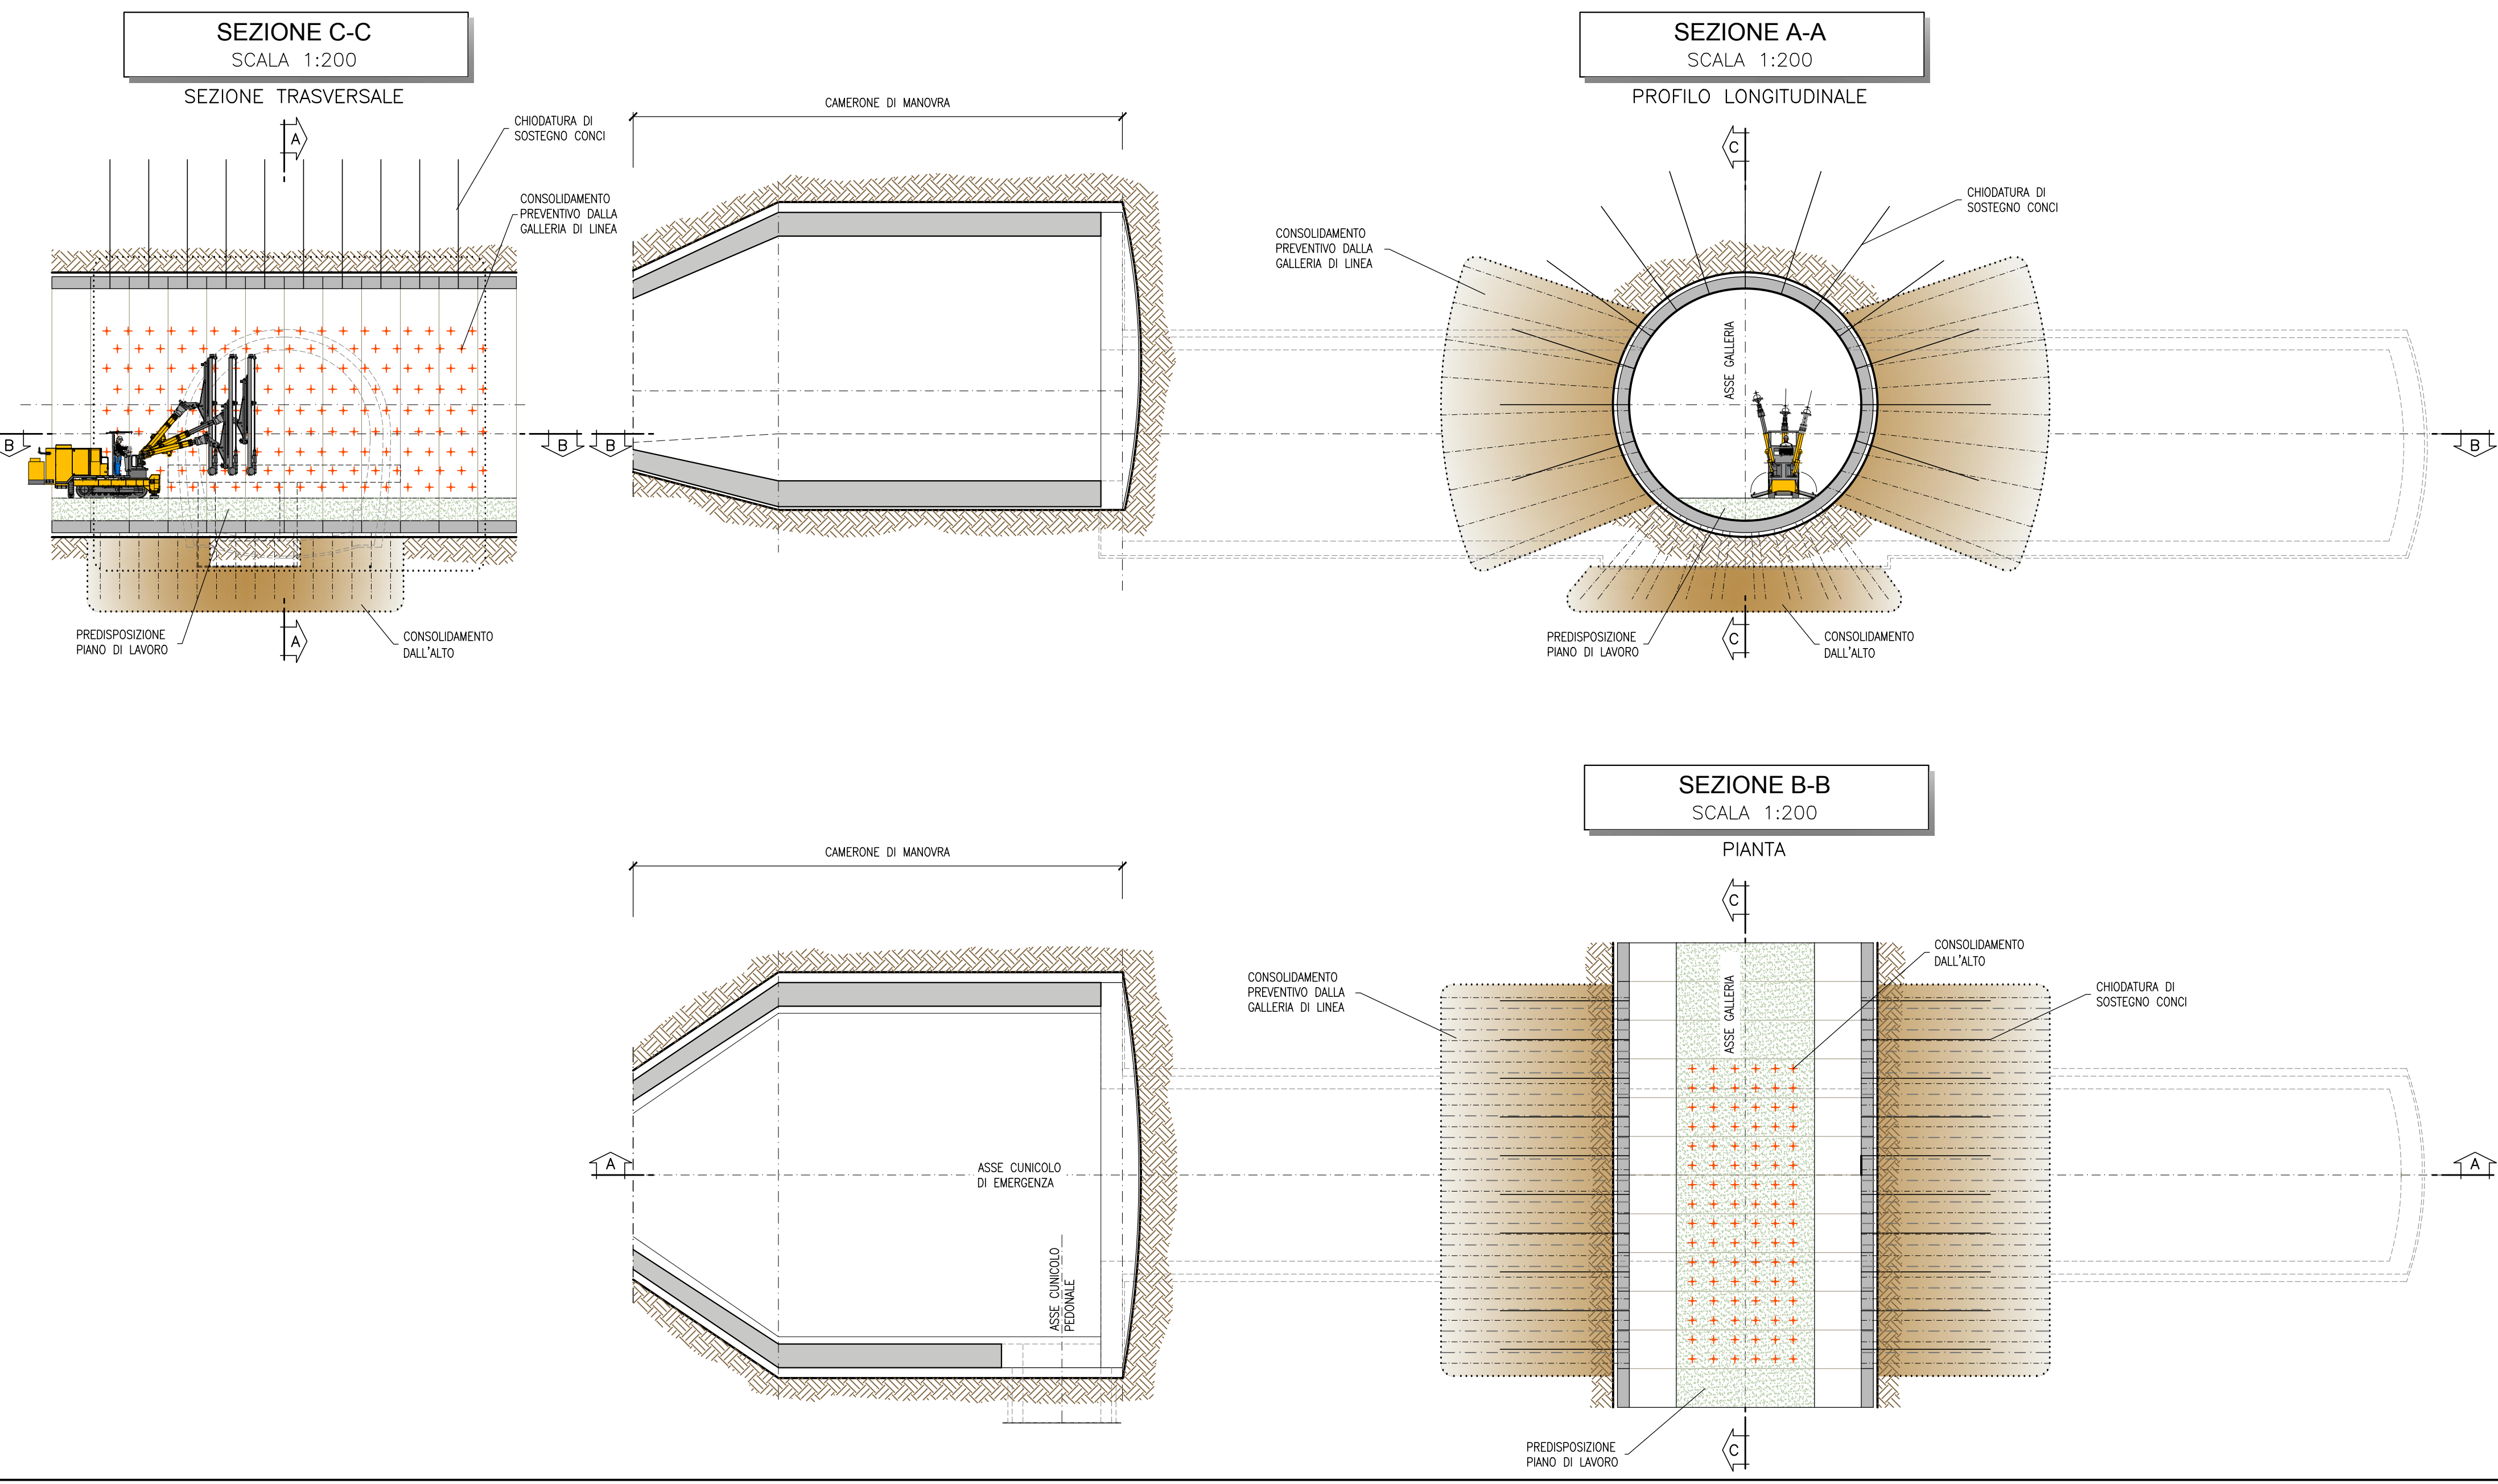


FASE 3

- DEMOLIZIONE DEI CONCI PREFABBRICATI E SCAVO PRIMO CAMPO DELLA GALLERIA LATERALE (PREFERIBILMENTE LATO FINESTRA, PER RENDERE FRIBILE, QUANTO PRIMA, VIA DI ACCESSO ULTERIORE DALL'ESTERNO), POSA IN OPERA DEI PROFILATI METALLICI E DELLO SPRITZ-BETON
- ESECUZIONE CONSOLIDAMENTO AL FRONTE PER IL FUTURO SCAVO DEL CAMPO D'AVANZAMENTO DELLA GALLERIA LATERALE

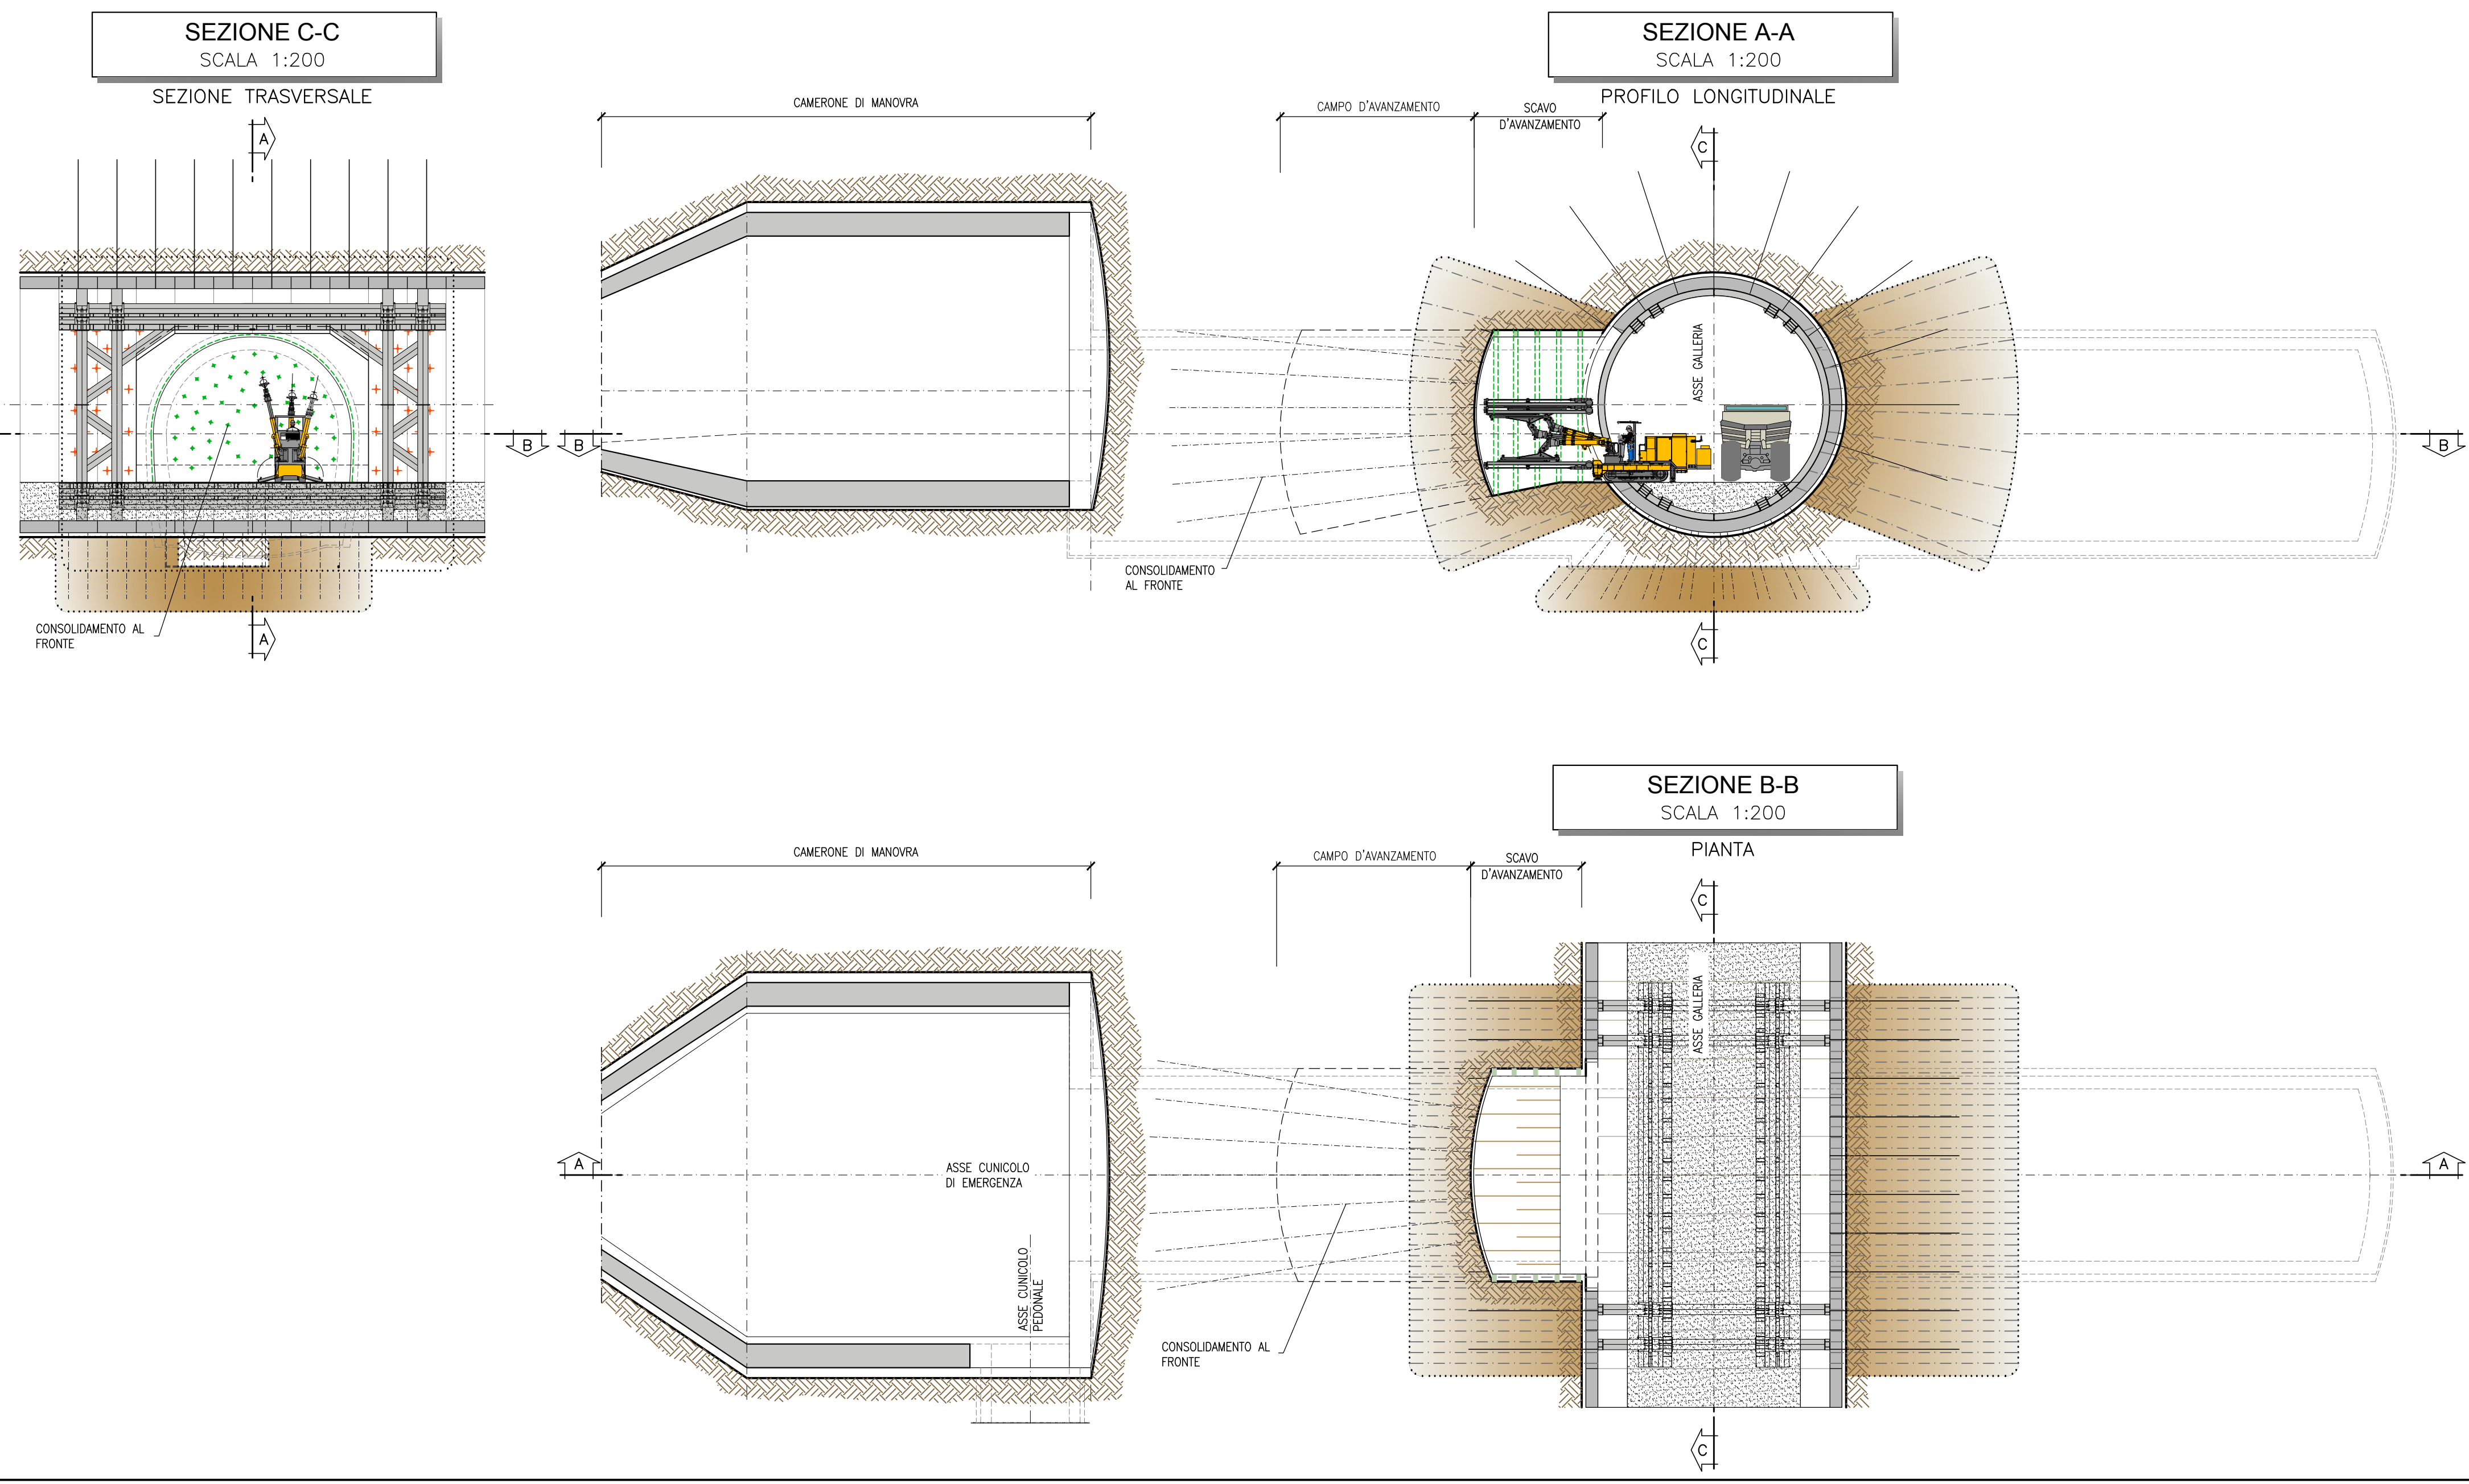


FASE 2

- INSTALLAZIONE DEL TELAIO REGGICONDI (CON PREDISPOSIZIONE PER DOPPIO ATTACCO INNESTI)
- PREDISPOSIZIONE NUOVO PIANO DI LAVORO A QUOTA ATTACCO INNESTO

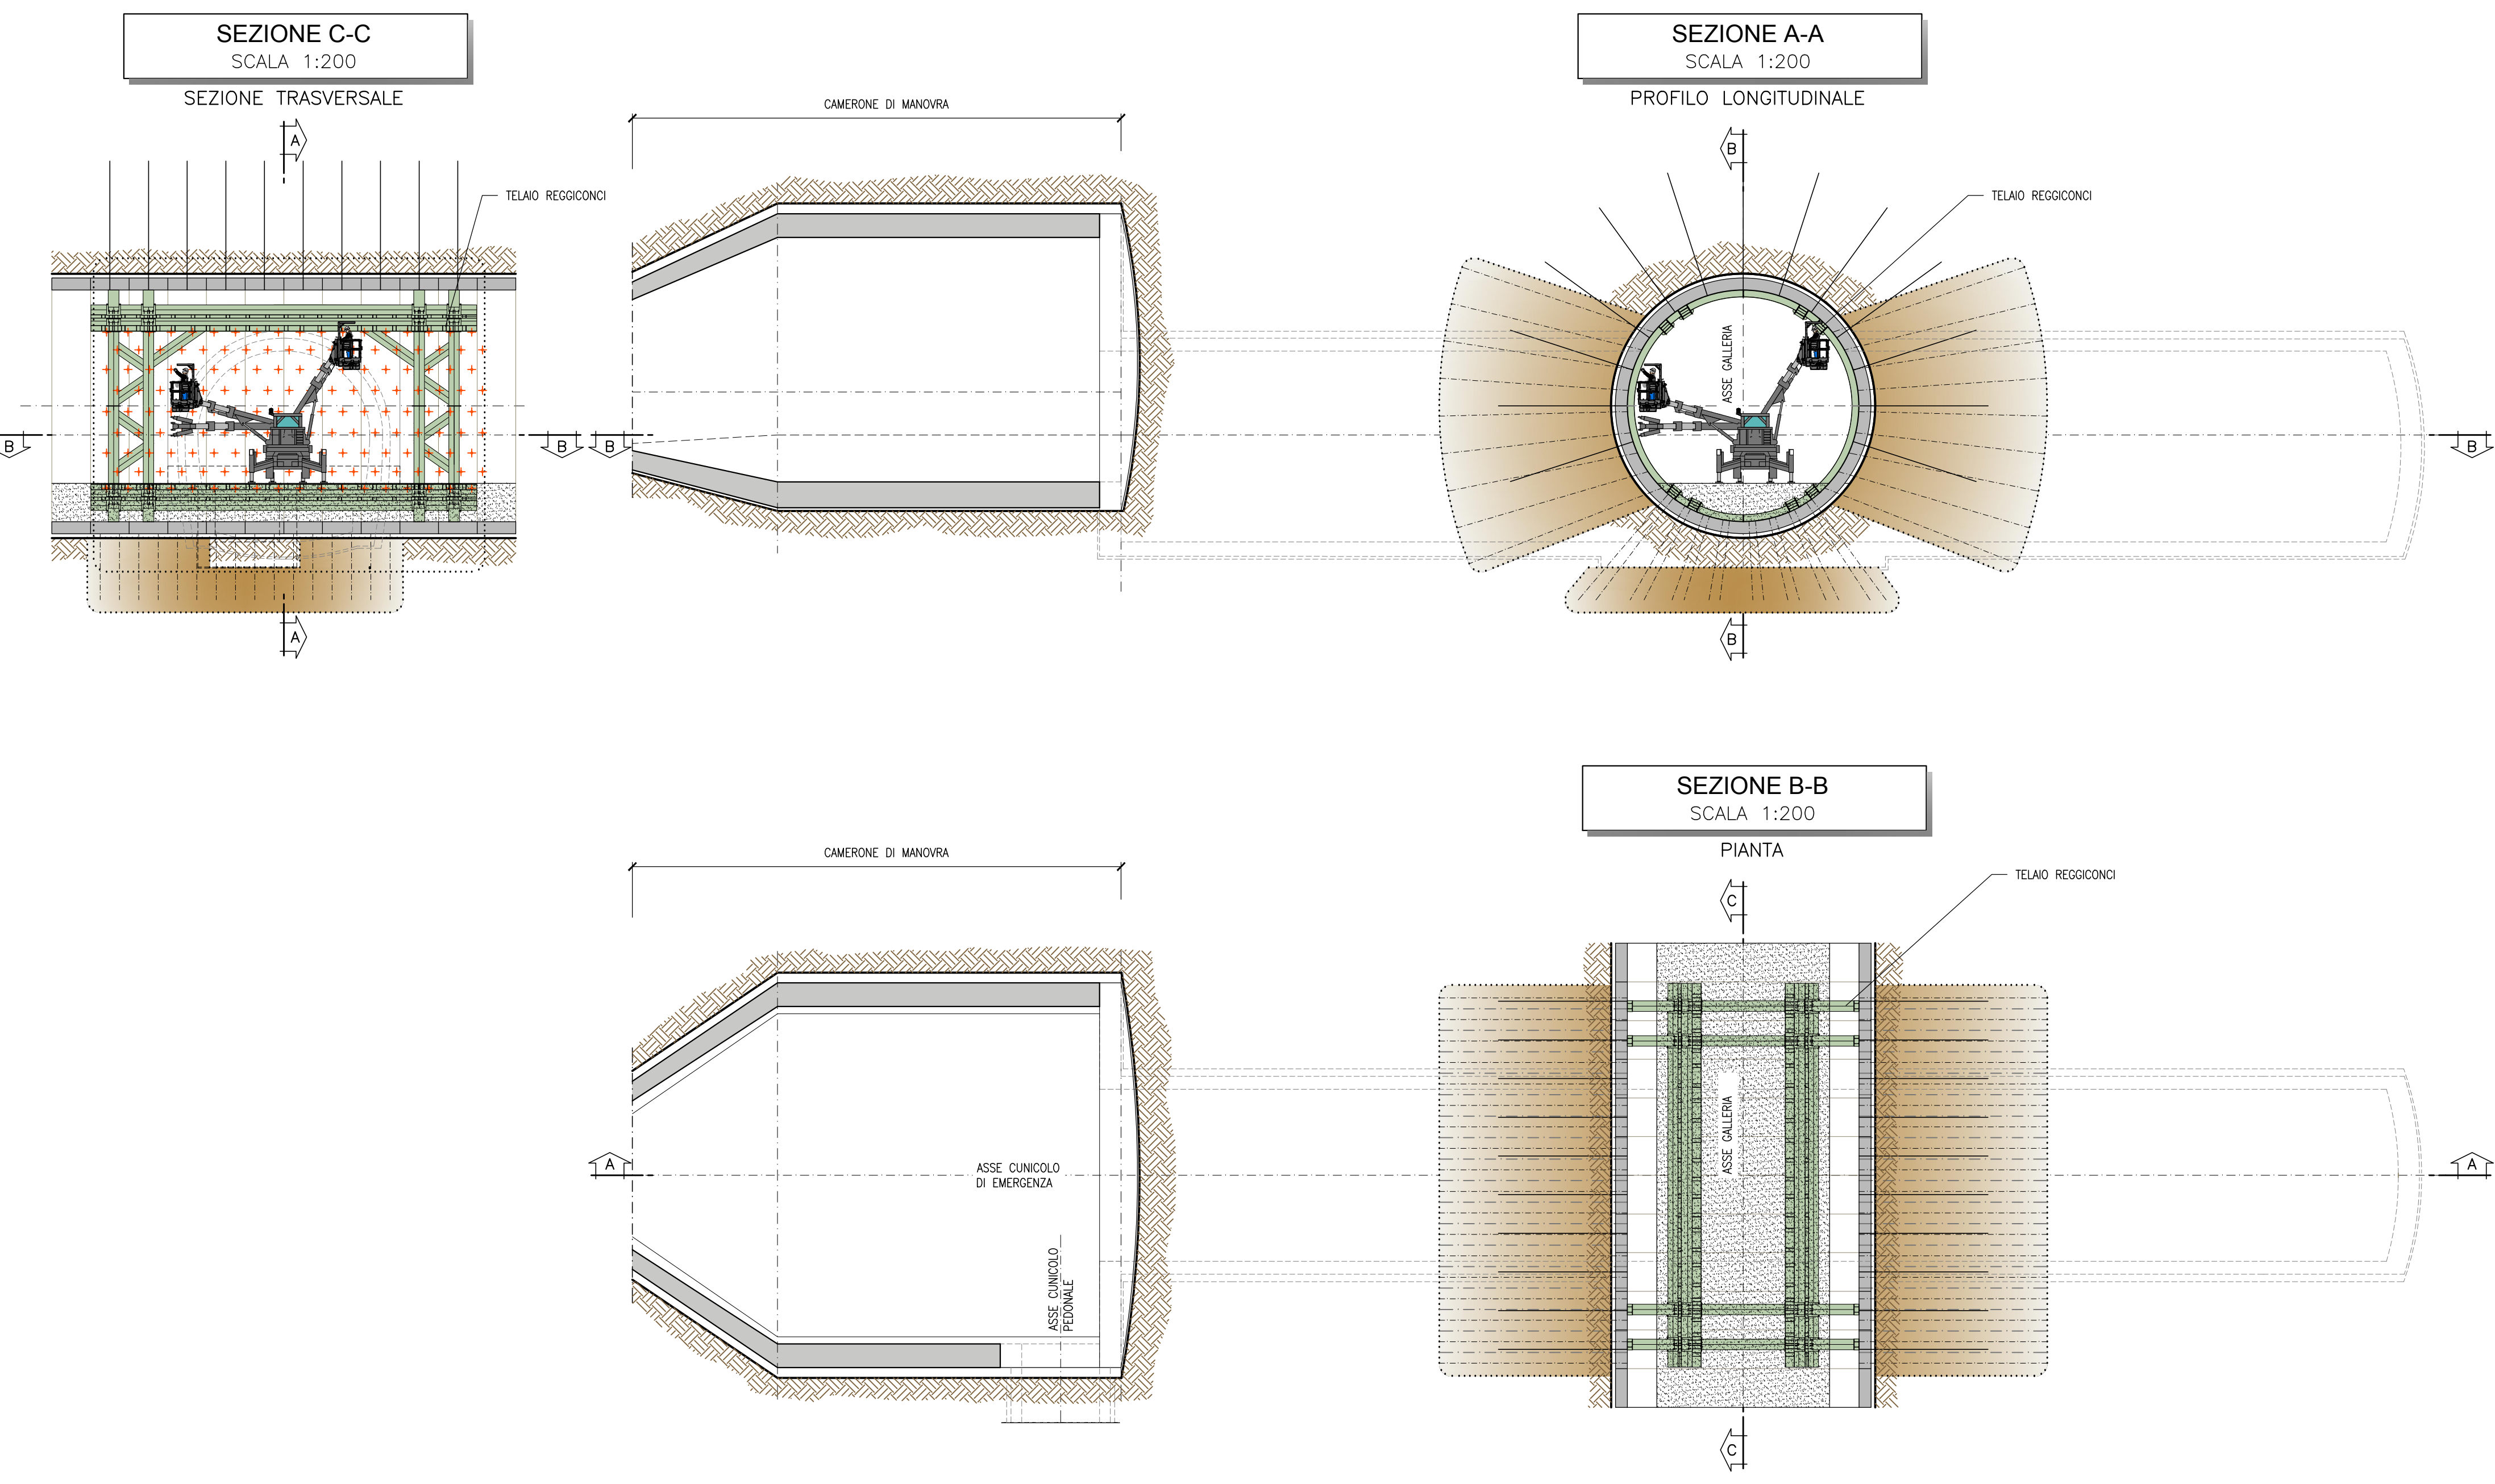

FASE 4

- SCAVO IN DISCESA DEL CAMPO DELLA GALLERIA LATERALE, POSA IN OPERA DEI PROFILATI METALLICI E DELLO SPRITZ-BETON
- CONSOLIDAMENTO AL FRONTE PER IL FUTURO SCAVO DEL SUCCESSIVO CAMPO DELLA GALLERIA LATERALE

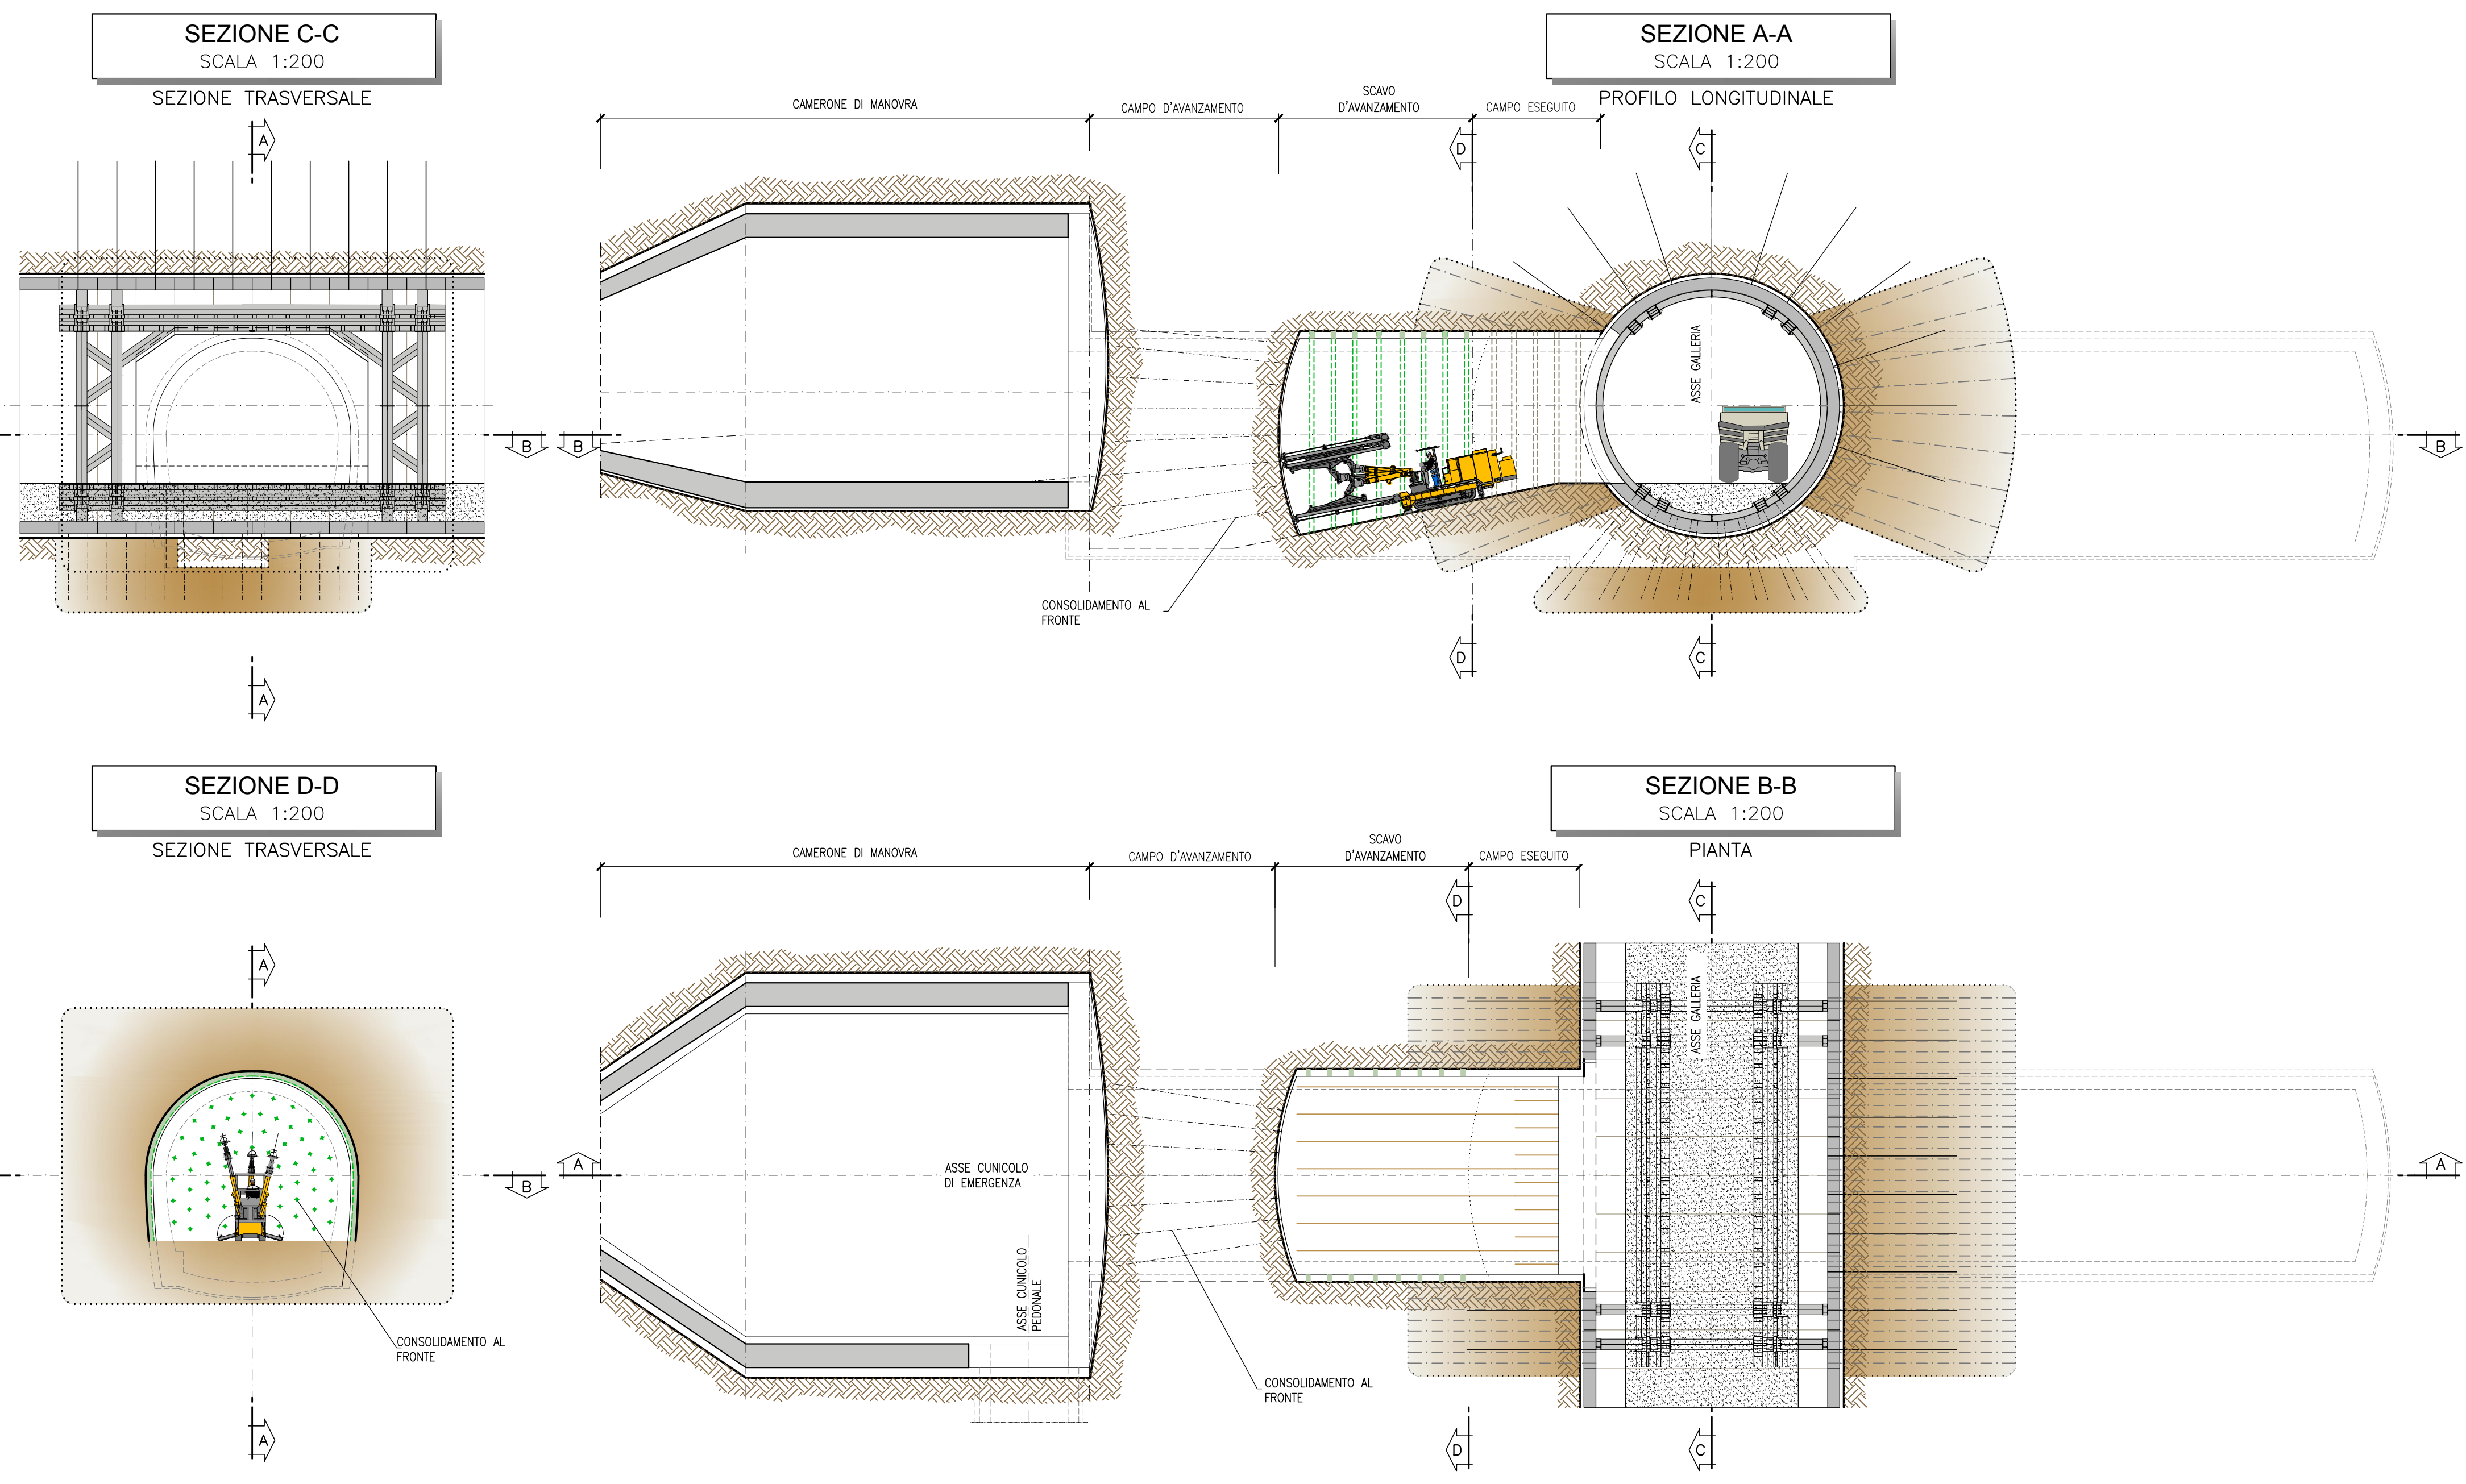

NOTA TABELLA MATERIALI

- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE SI RIMANDA ALL'ELABORATO "IF2801EZZSPGN000002"



COMMITTENTE: **RFI** INFRASTRUTTURE ITALIANE
 DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
 APPALTATORE: **HirpiniaAV** (Consorzio HirpiniaAV) SOCI: **salini impreglio** e **ASTALDI**
 PROGETTAZIONE: **ROCK SOUL** s.p.a. MANDANTE: **NETENGINEERING** e **Alpina** s.p.a.

PROGETTO ESECUTIVO
ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA
 GN05 - GALLERIA ROCCICETTA - FINESTRA COSTRUITA/VALICATA D'EMERGENZA F9 (A 13+450) E CUNCIOLI PEDONALI (A 13+475) (LATO BA) E (A 14+725) (LATO NA)
 ZONA DI INNESTO CON GALLERIA DI LINEA AL KM 13+850
 FASI ESECUTIVE
 Planimetria, sezioni - Tav. 1/4

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore	Scale
A	Emissione per consegna	M. Casati	21/03/2020	B. Spagnoli	21/03/2020	M. Casati	21/03/2020	Ing. G. Cassani	1:50
B	Revisione per struttura	M. Casati	04/04/2020	B. Spagnoli	04/04/2020	M. Casati	04/04/2020		

File: IF2801EZZDAGN0900001B.dwg n. Elab: -
