

Nota tecnica sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla Dir. AMI 494/2020 del 22/10/2020

In data 22/10/2020, ArcelorMittal Italia S.p.A. ha provveduto a trasmettere ad ILVA in A.S. la nota Dir.494/2020 contenente l'aggiornamento dei programmi di esecuzione lavori relativi alle attività del Piano ambientale di cui ai Decreti del Ministro dell'Ambiente n.212 del 29/09/2020 avente il seguente oggetto:



Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 recante "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13" – Istanza di proroga mediante convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.61 e dell'art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 29 settembre 2017, Prescrizione 6 – Decreto Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 212 del 29.09.2020 – Trasmissione aggiornamento del cronoprogramma delle attività connesse alla prescrizione 6. (ID n. 90/10728)

Oggetto nota AMI Dir.494/2020 del 22/10/2020

Per quanto riportato nell'ultima frase della citata nota Dir.494/2020 la Società ArcelorMittal Italia S.p.A. ha rappresentato nuovamente che "non intende prestare acquiescenza al DM 212/2020 rispetto a cui si riserva ogni più ampio diritto".

Pertanto, con riferimento ai termini di completamento degli interventi di chiusura nastri e torri, la situazione derivante dai dati riportati nel cronoprogramma, trasmesso da AMI in allegato con la nota in oggetto, rispetto all'originario cronoprogramma inviato da AMI con nota Dir 293/20 del 25 giugno 2020 è rappresentata nei seguenti prospetti.


Completamento lavori - (Cronoprogramma allegato a nota AMI Dir.293 del 25/06/2020)															
	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20	gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	Totale
NASTRI	0	0	1	0	4	13	5	13	4	6	3	3	4	6	62
TORRI	6	0	0	0	6	17	6	0	6	1	2	1	0	2	47
TOTALE	6	0	1	0	10	30	11	13	10	7	5	4	4	8	109

N° interventi con completamento entro ottobre 2020	N° interventi con completamento previsto nel periodo novembre 2020 + luglio 2021
17	92



Completamento lavori - (Cronoprogramma allegato a nota AMI Dir.494 del 22/10/2020)															
giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20	gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	Totale	
NASTRI															
1	2	5	5	4	4	6	8	1	6	2	1	15	2	62	
TORRI															
6	0	4	5	8	3	4	3	2	5	4	0	3	0	47	
TOTALE															
7	2	9	10	12	7	10	11	3	11	6	1	18	2	109	
N° interventi con completamento entro ottobre 2020								N° interventi con completamento previsto nel periodo novembre 2020 + luglio 2021							
40								69							

La relativa distribuzione temporale dei termini di completamento del numero totale di interventi previsti all'originario cronoprogramma inviato da AMI con nota Dir.293 del 25 giugno 2020 ed in quello aggiornato trasmesso da AMI con la nota Dir.494 del 22/10/2020 in oggetto è rappresentata nei seguenti grafici.

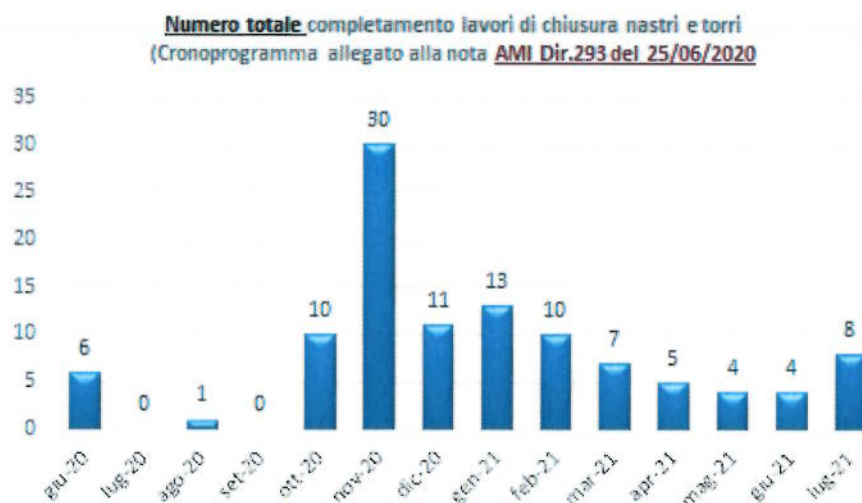



Dal confronto dei suddetti emerge in sintesi che:

- nell'originario cronoprogramma era stato previsto il completamento di un significativo numero di interventi concentrato nel mese di novembre 2020 che invece risulta decisamente anticipato nei mesi precedenti (giugno ÷ ottobre 2020);
- diversamente, per i mesi successivi a novembre il cronoprogramma aggiornato, trasmesso con la Dir.494/2020 in oggetto, fa rilevare un tendenziale posticipo del completamento degli interventi con particolare concentrazione nel mese di giugno 2021 le cui ragioni andrebbero motivate da parte di ArcelorMittal Italia S.p.A..

Taranto, 23 ottobre 2020

Direzione Tecnica ed Operativa Ilva in A.S.

Angelo Cavallo
