



Arcelor Mittal TARANTO -
RICOSTRUZIONE DOCCIA DI SPEGNIMENTO E VASCA N° 4bis

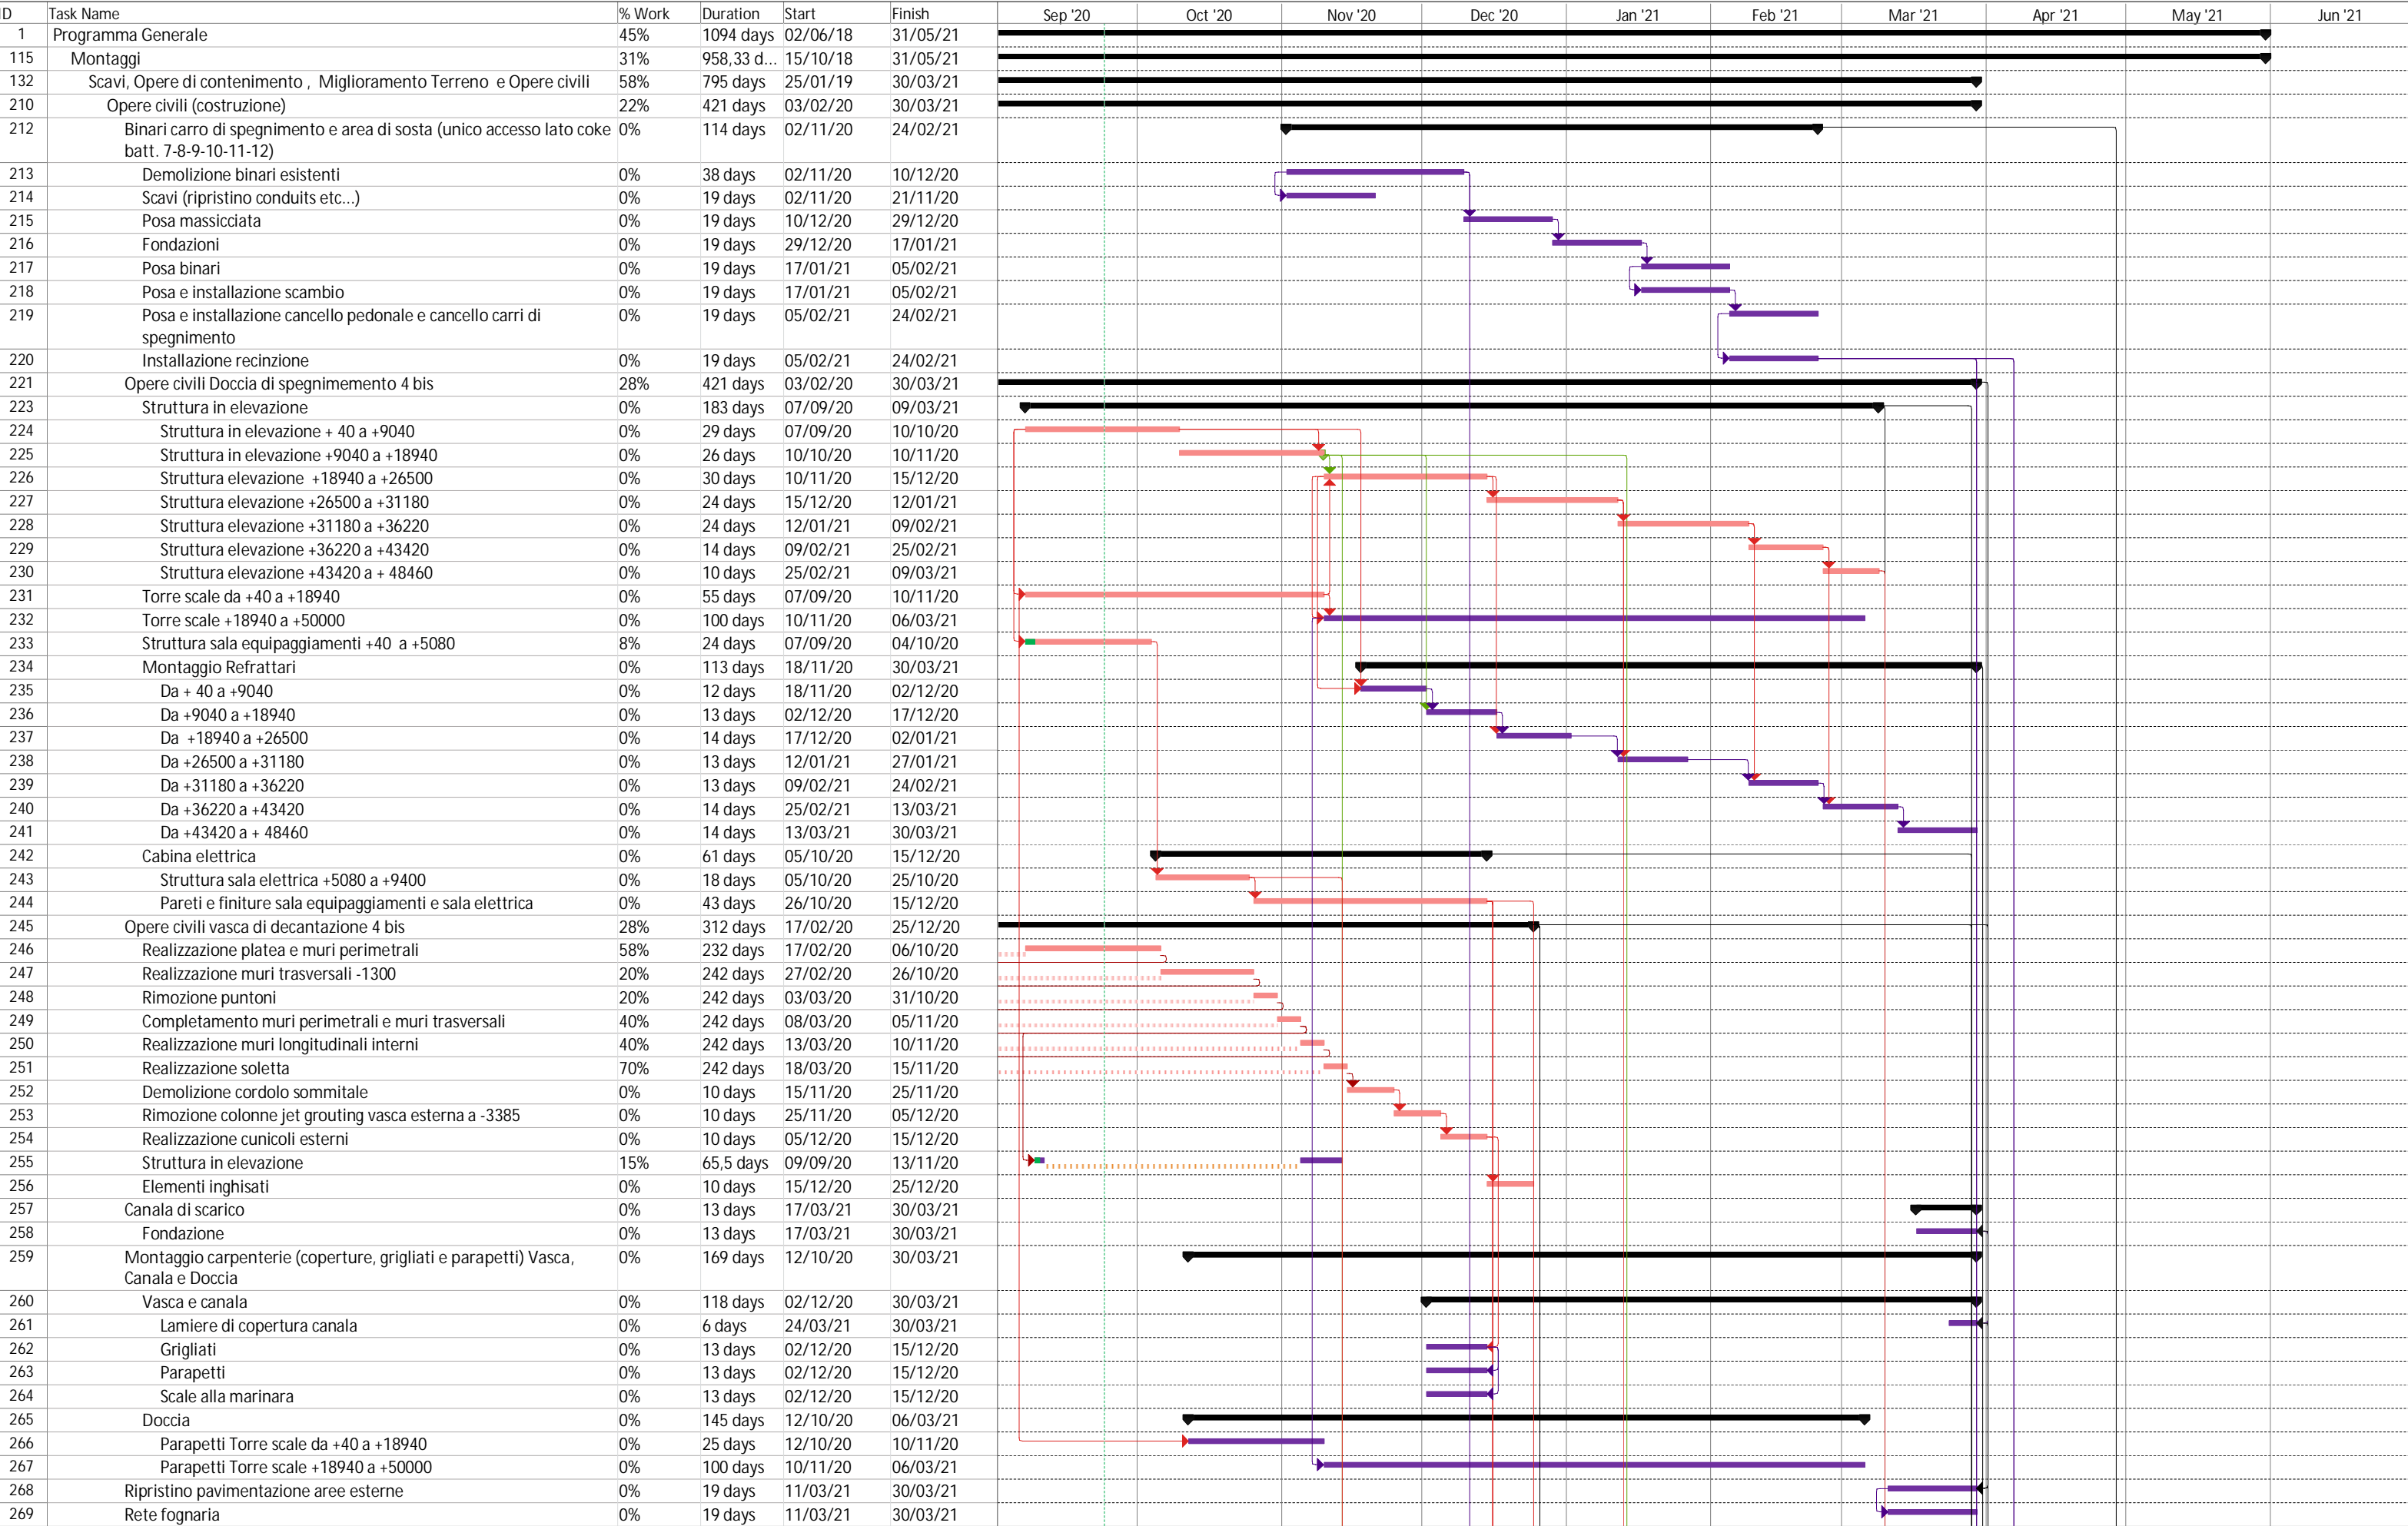

Arcelor Mittal TARANTO -
RICOSTRUZIONE DOCCIA DI SPEGNIMENTO E VASCA N° 4bis

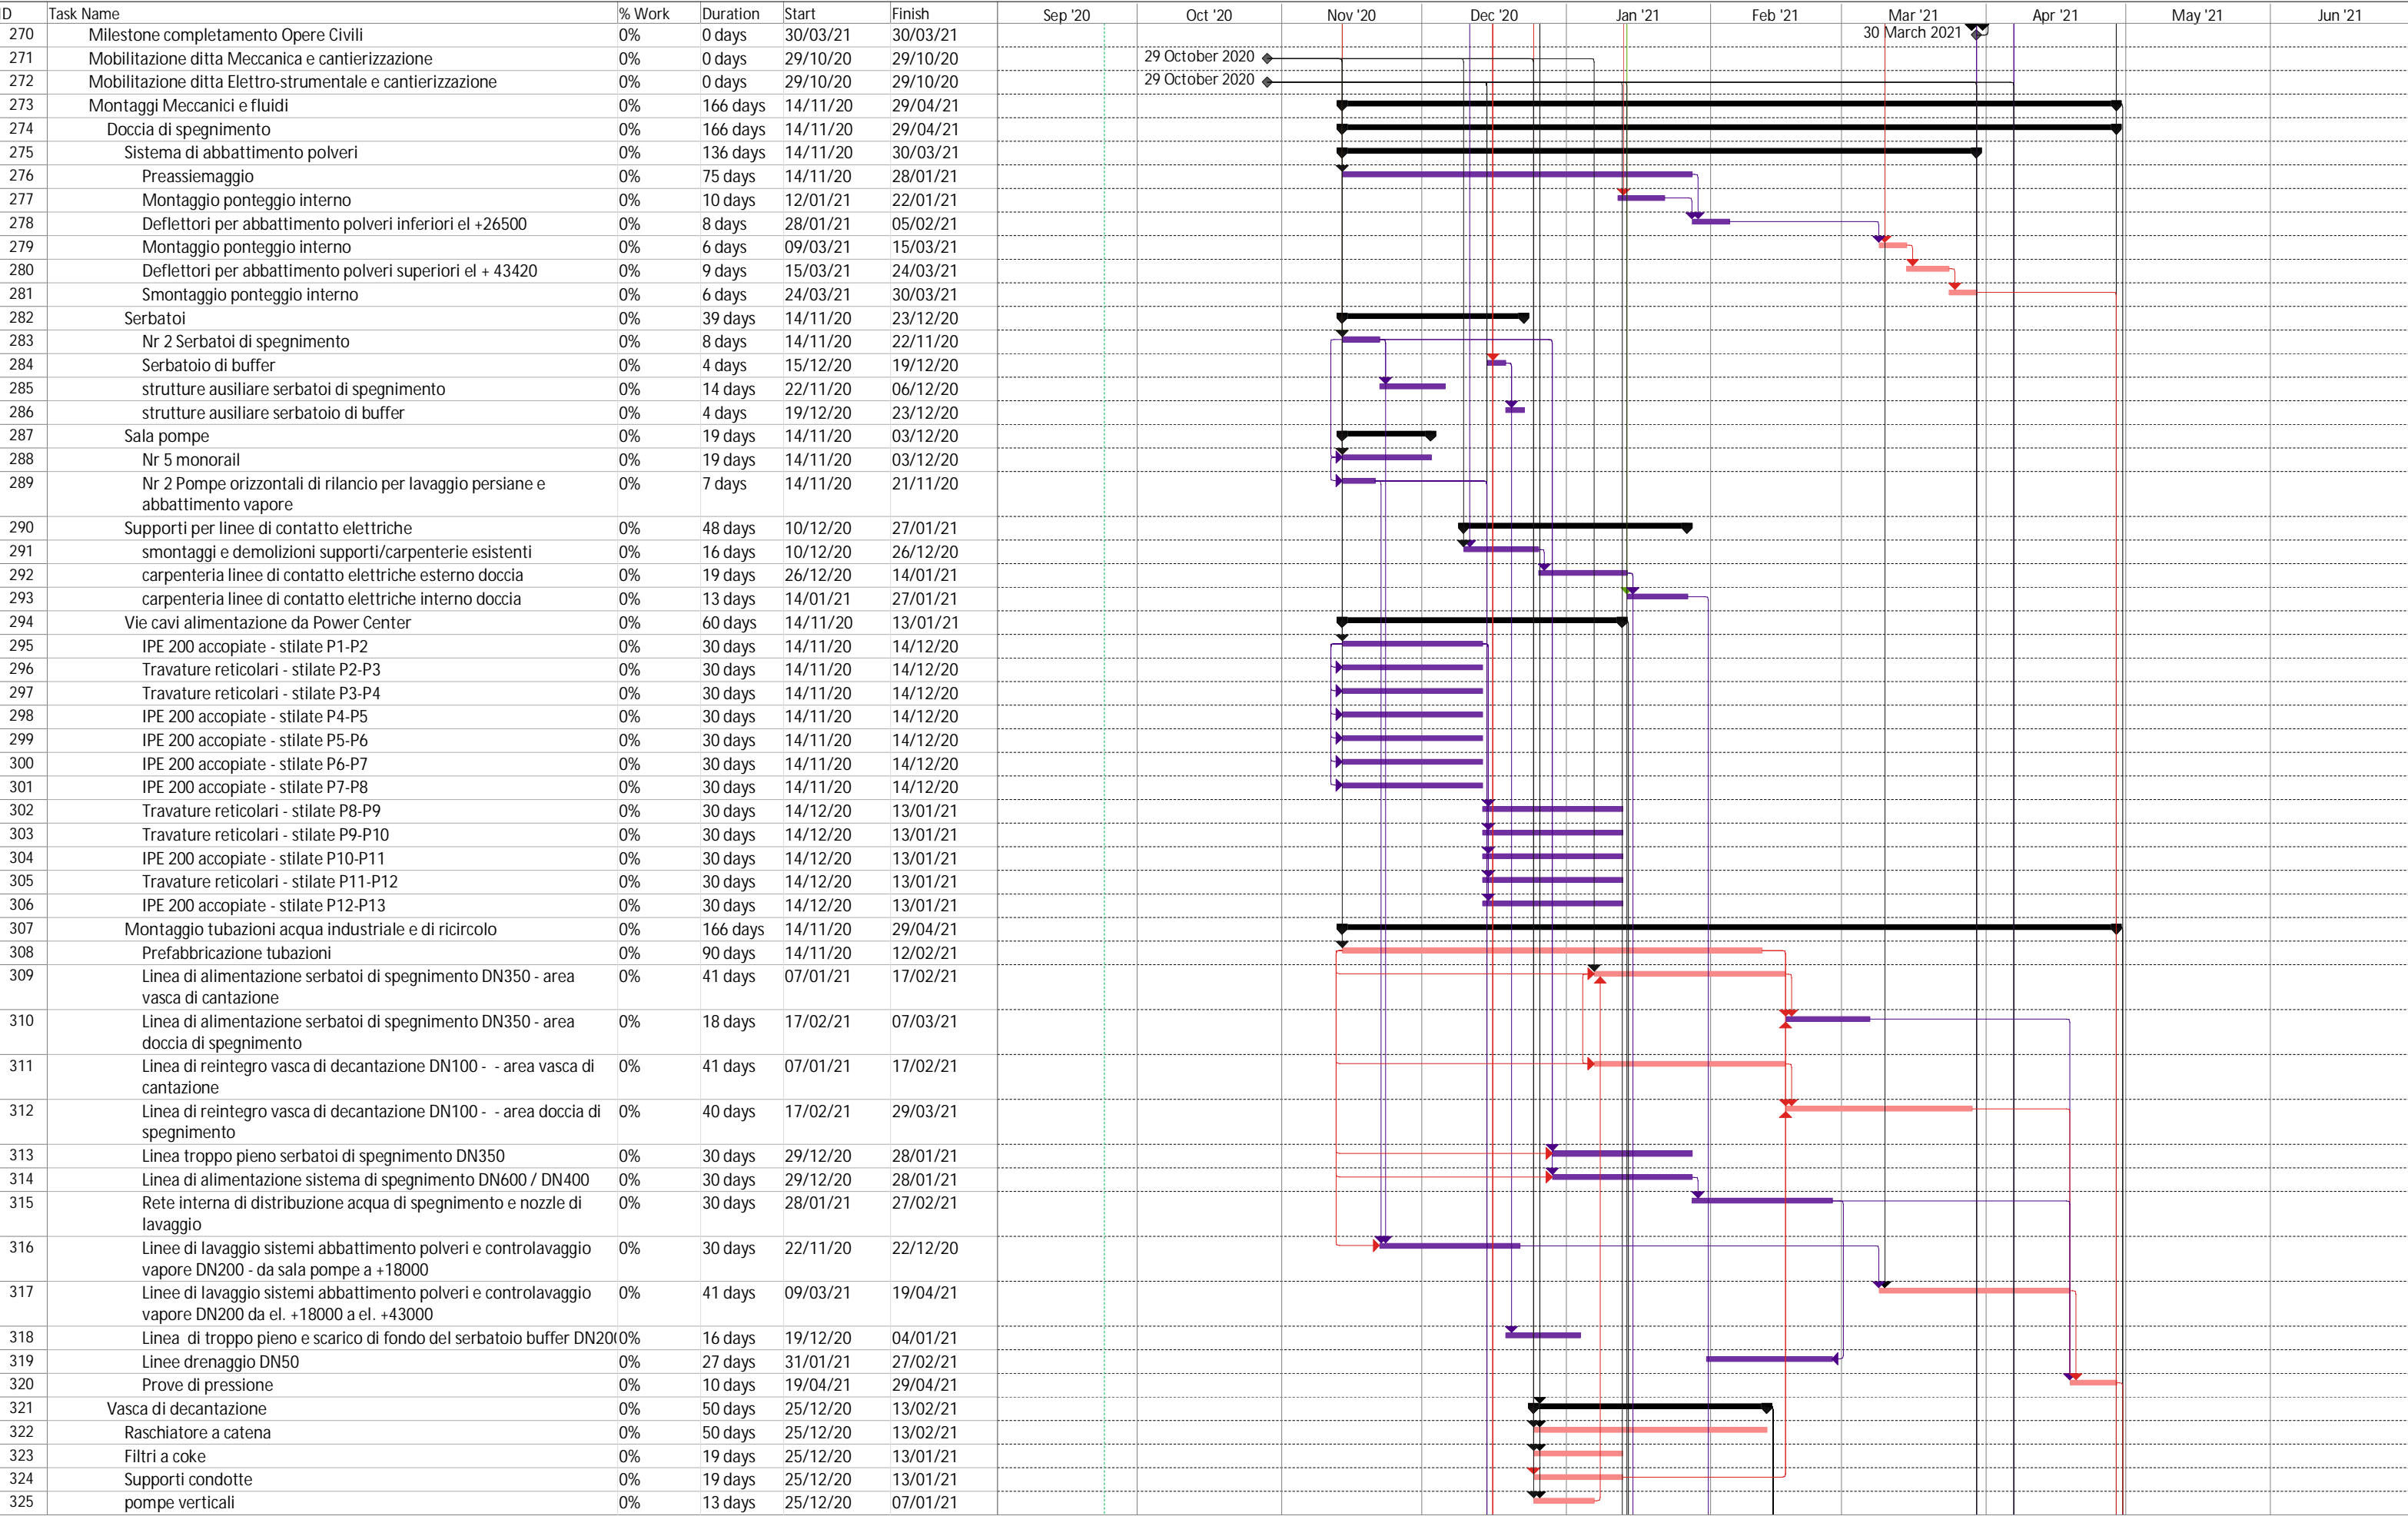

| ID | Task Name | % Work | Duration | Start | Finish | Sep '20 | Oct '20 | Nov '20 | Dec '20 | Jan '21 | Feb '21 | Mar '21 | Apr '21 | May '21 | Jun '21 |
|-----|--|--------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 326 | Montaggi Elettro-strumentali | 0% | 135 days | 15/12/20 | 29/04/21 | | | | | | | | | | |
| 327 | Vie Cavi e Cavi da TOP a Torre di spegnimento 4bis | 0% | 60 days | 13/01/21 | 14/03/21 | | | | | | | | | | |
| 328 | linee per nuovo MCC da Power center esistente | 0% | 60 days | 13/01/21 | 14/03/21 | | | | | | | | | | |
| 329 | cavi alimentazione da UPS | 0% | 60 days | 13/01/21 | 14/03/21 | | | | | | | | | | |
| 330 | Percorso cavi F.O. anello di rete interfono e manless | 0% | 60 days | 13/01/21 | 14/03/21 | | | | | | | | | | |
| 331 | Nuova Cabina Elettrica | 0% | 60 days | 15/12/20 | 13/02/21 | | | | | | | | | | |
| 332 | Montaggio equipaggiamenti elettrici | 0% | 40 days | 15/12/20 | 24/01/21 | | | | | | | | | | |
| 333 | PLC | 0% | 40 days | 15/12/20 | 24/01/21 | | | | | | | | | | |
| 334 | MCC | 0% | 40 days | 15/12/20 | 24/01/21 | | | | | | | | | | |
| 335 | quadro di rete | 0% | 40 days | 15/12/20 | 24/01/21 | | | | | | | | | | |
| 336 | quadro illuminazione | 0% | 40 days | 15/12/20 | 24/01/21 | | | | | | | | | | |
| 337 | quadro FM | 0% | 40 days | 15/12/20 | 24/01/21 | | | | | | | | | | |
| 338 | quadro utenze privilegiate | 0% | 40 days | 15/12/20 | 24/01/21 | | | | | | | | | | |
| 339 | quadro rilevazione incendi | 0% | 40 days | 15/12/20 | 24/01/21 | | | | | | | | | | |
| 340 | quadro controllo ventilatori HVAC | 0% | 40 days | 15/12/20 | 24/01/21 | | | | | | | | | | |
| 341 | posa e collegamento dei sensori/dispositivi del sistema di rilevazione incendi | 0% | 40 days | 15/12/20 | 24/01/21 | | | | | | | | | | |
| 342 | Impianto di illuminazione | 0% | 40 days | 15/12/20 | 24/01/21 | | | | | | | | | | |
| 343 | rete di terra secondaria | 0% | 40 days | 15/12/20 | 24/01/21 | | | | | | | | | | |
| 344 | Vie Cavi | 0% | 60 days | 15/12/20 | 13/02/21 | | | | | | | | | | |
| 345 | Cavi | 0% | 60 days | 15/12/20 | 13/02/21 | | | | | | | | | | |
| 346 | Nuova Sala Pompe | 0% | 20 days | 15/12/20 | 04/01/21 | | | | | | | | | | |
| 347 | Montaggio equipaggiamenti elettrici | 0% | 20 days | 15/12/20 | 04/01/21 | | | | | | | | | | |
| 348 | nuove CCL | 0% | 20 days | 15/12/20 | 04/01/21 | | | | | | | | | | |
| 349 | Impianto di illuminazione | 0% | 20 days | 15/12/20 | 04/01/21 | | | | | | | | | | |
| 350 | rete di terra secondaria | 0% | 20 days | 15/12/20 | 04/01/21 | | | | | | | | | | |
| 351 | Strumentazione | 0% | 20 days | 15/12/20 | 04/01/21 | | | | | | | | | | |
| 352 | Vie Cavi | 0% | 20 days | 15/12/20 | 04/01/21 | | | | | | | | | | |
| 353 | Cavi | 0% | 20 days | 15/12/20 | 04/01/21 | | | | | | | | | | |
| 354 | CAMPO - Torre di Spegnimento e Bacino di Decantazione | 0% | 45 days | 13/02/21 | 30/03/21 | | | | | | | | | | |
| 355 | Montaggio equipaggiamenti elettrici | 0% | 20 days | 13/02/21 | 05/03/21 | | | | | | | | | | |
| 356 | Posa e collegamento delle CCL | 0% | 20 days | 13/02/21 | 05/03/21 | | | | | | | | | | |
| 357 | Nuovo quadro locale di gestione/alimentazione dei raschiatori | 0% | 20 days | 13/02/21 | 05/03/21 | | | | | | | | | | |
| 358 | quadretto strumentazione AIA (messo a disposizione da AMI) | 0% | 20 days | 13/02/21 | 05/03/21 | | | | | | | | | | |
| 359 | Hot Spot WI-F | 0% | 20 days | 13/02/21 | 05/03/21 | | | | | | | | | | |
| 360 | Impianto di illuminazione | 0% | 20 days | 13/02/21 | 05/03/21 | | | | | | | | | | |
| 361 | rete di terra secondaria | 0% | 20 days | 13/02/21 | 05/03/21 | | | | | | | | | | |
| 362 | Strumentazione | 0% | 30 days | 13/02/21 | 15/03/21 | | | | | | | | | | |
| 363 | Vie Cavi | 0% | 36 days | 13/02/21 | 21/03/21 | | | | | | | | | | |
| 364 | Cavi | 0% | 45 days | 13/02/21 | 30/03/21 | | | | | | | | | | |
| 365 | CAMPO – Area Interno Movimentazione Loco | 0% | 105 days | 14/01/21 | 29/04/21 | | | | | | | | | | |
| 366 | Montaggio equipaggiamenti elettrici | 0% | 30 days | 14/01/21 | 13/02/21 | | | | | | | | | | |
| 367 | montaggio rotaiette bimetalliche | 0% | 15 days | 14/01/21 | 29/01/21 | | | | | | | | | | |
| 368 | montaggio isolatori | 0% | 10 days | 29/01/21 | 08/02/21 | | | | | | | | | | |
| 369 | posa e fissaggio del target per il finecorsa a bordo loco | 0% | 5 days | 08/02/21 | 13/02/21 | | | | | | | | | | |
| 370 | Vie Cavi e Cavi per il collegamento delle F.O. per il sistema TVCC | 0% | 30 days | 30/03/21 | 29/04/21 | | | | | | | | | | |
| 371 | CAMPO – Area Esterna Movimentazione Loco – Sistema Manless | 0% | 16 days | 30/03/21 | 15/04/21 | | | | | | | | | | |
| 372 | Montaggio equipaggiamenti elettrici | 0% | 8 days | 30/03/21 | 07/04/21 | | | | | | | | | | |
| 373 | Montaggio finecorsa di sicurezza | 0% | 8 days | 30/03/21 | 07/04/21 | | | | | | | | | | |
| 374 | Montaggio elettro-serratura e relativa CCL | 0% | 8 days | 30/03/21 | 07/04/21 | | | | | | | | | | |
| 375 | Vie Cavi | 0% | 8 days | 07/04/21 | 15/04/21 | | | | | | | | | | |
| 376 | Cavi | 0% | 8 days | 07/04/21 | 15/04/21 | | | | | | | | | | |
| 377 | CAMPO – Area Esterna – Sistemi Ausiliari | 0% | 30 days | 13/02/21 | 15/03/21 | | | | | | | | | | |
| 378 | Montaggio equipaggiamenti elettrici | 0% | 30 days | 13/02/21 | 15/03/21 | | | | | | | | | | |
| 379 | Interfono | 0% | 15 days | 13/02/21 | 28/02/21 | | | | | | | | | | |
| 380 | TVCC | 0% | 30 days | 13/02/21 | 15/03/21 | | | | | | | | | | |
| 381 | nuovo quadretto TVCC | 0% | 30 days | 13/02/21 | 15/03/21 | | | | | | | | | | |
| 382 | Posa ed installazione di no. 2 telecamere | 0% | 30 days | 13/02/21 | 15/03/21 | | | | | | | | | | |
| 383 | Posa e collegamento ricevitori presso Torre Fossile 4 o 5 | 0% | 30 days | 13/02/21 | 15/03/21 | | | | | | | | | | |
| 384 | Vie Cavi | 0% | 30 days | 13/02/21 | 15/03/21 | | | | | | | | | | |
| 385 | Cavi | 0% | 30 days | 13/02/21 | 15/03/21 | | | | | | | | | | |
| 386 | Prove Doccia 4bis | 0% | 32 days | 29/04/21 | 31/05/21 | | | | | | | | | | |
