

**Nota tecnica sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla
Dir. AMI 620/2020 del 29/12/2020**

In data 29/12/2020, ArcelorMittal Italia S.p.A. ha provveduto a trasmettere ad ILVA in A.S. la nota Dir.620/2020 contenente l'aggiornamento dei programmi di esecuzione lavori relativi alle attività del Piano ambientale di cui ai Decreti del Ministro dell'Ambiente n.212 del 29/09/2020 avente il seguente oggetto:

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 recante "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13" – Istanza di proroga mediante convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.61 e dell'art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 29 settembre 2017, Prescrizione 6 – Decreto Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 212 del 29.09.2020 – Trasmissione aggiornamento del cronoprogramma delle attività connesse alla prescrizione 6. (ID n. 90/10728)

Oggetto nota AMI Dir.620/2020 del 29/12/2020

Per quanto riportato nell'ultima frase della citata nota Dir.620/2020 la Società ArcelorMittal Italia S.p.A. ha rappresentato nuovamente che *"non intende prestare acquiescenza al DM 212/2020 rispetto a cui si riserva ogni più ampio diritto"*.

Pertanto, con riferimento ai termini di completamento degli interventi di chiusura nastri e torri, la situazione derivante dai dati riportati nel cronoprogramma trasmesso da AMI in allegato con la nota in oggetto rispetto all'originario cronoprogramma inviato da AMI con nota Dir 293 del 25/06/2020 è rappresentata nei seguenti prospetti.


Completamento lavori - (Cronoprogramma allegato a nota AMI Dir.293 del 25/06/2020)															
	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20	gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	Totale
NASTRI	0	0	1	0	4	13	5	13	4	6	3	3	4	6	62
TORRI	6	0	0	0	6	17	6	0	6	1	2	1	0	2	47
TOTALE	6	0	1	0	10	30	11	13	10	7	5	4	4	8	109
N° interventi con completamento previsto entro dicembre 2020								N° interventi con completamento previsto nel periodo gennaio - luglio 2021							
58								51							

Completamento lavori - (Cronoprogramma allegato a nota AMI Dir.620 del 29/12/2020)															
	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20	gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	Totale
NASTRI	1	2	5	5	4	8	4	7	0	6	2	1	15	2	62
TORRI	6	0	4	5	5	7	5	2	2	4	3	0	4	0	47
TOTALE	7	2	9	10	9	15	9	9	2	10	5	1	19	2	109


N° interventi completati e/o con completamento previsto entro dicembre 2020	N° interventi con completamento previsto nel periodo gennaio - luglio 2021
61	48

La relativa distribuzione temporale dei termini di completamento del numero totale di interventi previsti nell'originario cronoprogramma inviato da AMI con nota Dir.293 del 25/06/2020 ed in quello aggiornato trasmesso da AMI con la nota Dir.620 del 29/12/2020 in oggetto è rappresentata nei seguenti grafici.

Numero totale completamento lavori di chiusura nastri e torri
(Cronoprogramma allegato alla nota AMI Dir.293 del 25/06/2020)

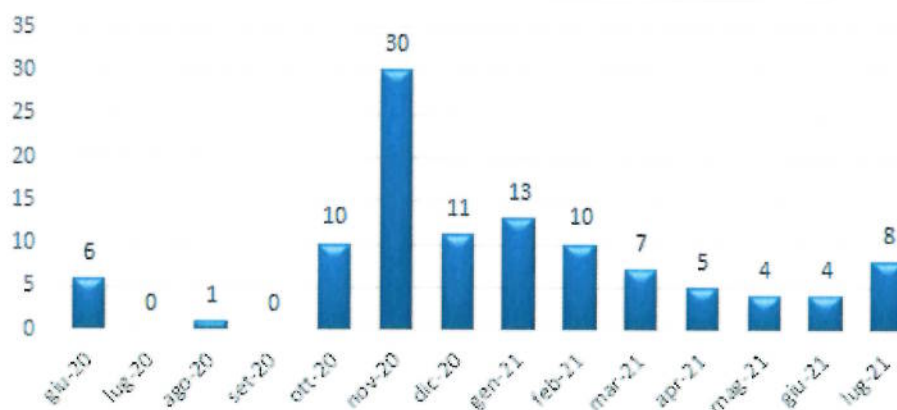

Numero totale completamento lavori di chiusura nastri e torri
(Cronoprogramma allegato alla nota AMI Dir.620 del 29/12/2020)

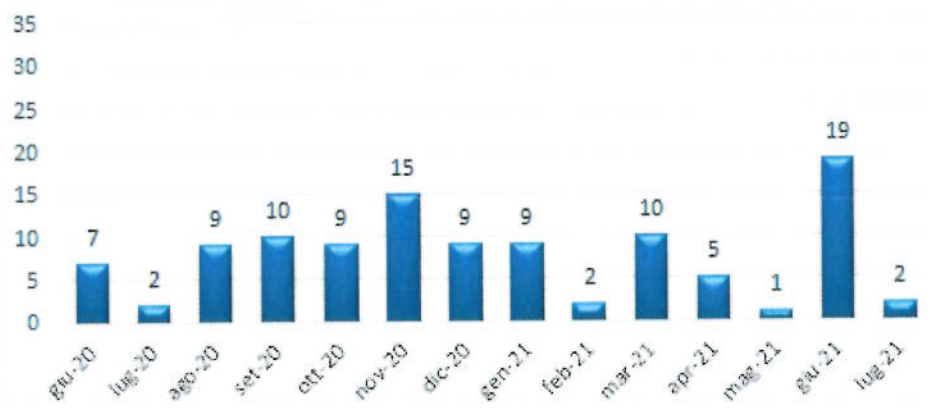

Dal confronto dei suddetti emerge in sintesi che:

- nell'originario cronoprogramma era stato previsto il completamento di un significativo numero di interventi concentrato nel mese di novembre 2020 che invece risulta essere stato decisamente anticipato nei mesi precedenti (giugno ÷ ottobre 2020). In particolare, nell'originario cronoprogramma di giugno 2020 era stato previsto in totale il completamento a dicembre 2020 di n.58 interventi, mentre attualmente risultano essere n.61 (di cui n.3 ancora da completare, relativi alle posizioni n.42, 43 e 81, con previsione di completamento comunque entro dicembre 2020);
- nel nuovo cronoprogramma, aggiornato e trasmesso con la Dir.620/2020, sostanzialmente non vi sono grosse mutazioni rispetto al precedente facendo ancora rilevare, per i mesi successivi a dicembre, un tendenziale posticipo del completamento degli interventi con una loro particolare concentrazione nel mese di giugno 2021 e confermando, in diversi casi, ritardi nella riattivazione dei cantieri rispetto a quanto previsto con la Dir.293 del 25/06/2020;
- dei n.109 cantieri totali, nel cronoprogramma allegato alla nota Dir.620/2020 risultano non essere ancora attivi i seguenti n.4 cantieri:

N°	Nastro/Terr e	Codice identificativo	Modello trasportato	Lunghezza totale nastro (m)	Nastro/Terre "In piatto" o "In quinta"	Data prevista di completamento lavori	Stato Cantiere	Funz. Cantieri	Previsione rifornimento Cantieri	Note
1	Nastri	A3.6	Scimmionele	30	IN PIANO	30.06.2021	NON ATTIVO	GARA	31.01.2021	Ativiti' posticipata di 5 mesi da data apertura cantiere causa cambio fornitore non previsto
53	Nastri	A4-2 Loppa	loppa	34	IN PIANO	30.06.2021	NON ATTIVO	GARA	01.02.2021	Ativiti' rimasta in gara causa cambio fornitore non previsto
54	Nastri	A4-3 Loppa	loppa	35	IN PIANO	30.06.2021	NON ATTIVO	GARA	01.02.2021	Ativiti' rimasta in gara causa cambio fornitore non previsto
55	Nastri	A4-4 Loppa	loppa	35	IN PIANO	30.06.2021	NON ATTIVO	GARA	01.02.2021	Ativiti' rimasta in gara causa cambio fornitore non previsto

Taranto 07 gennaio 2021

Direzione Tecnica ed Operativa Ilva in A.S.

Angelo Cavallo

