

**Nota tecnica sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla  
Nota AMI Dir.78/2021 del 12/02/2021**

In data 12/02/2021, ArcelorMittal Italia S.p.A. ha provveduto a trasmettere ad ILVA in A.S. la nota Dir.78/2021 contenente l'aggiornamento del cronoprogramma di esecuzione lavori relativi alla prescrizione n.6 del Piano ambientale avente il seguente oggetto:

**Oggetto:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 recante "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13" – Istanza di proroga mediante convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.61 e dell'art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 29 settembre 2017, Prescrizione 6 – Decreto Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 212 del 29.09.2020 – Prescrizioni dettate dalla Conferenza di servizi istruttoria del 27 novembre 2020 dalla Conferenza di servizi decisoria del 16 dicembre 2020 – Trasmissione aggiornamento del cronoprogramma delle attività connesse alla prescrizione 6. (ID n. 90/10728)

*Oggetto nota AMI Dir.78 del 12/02/2021*

Per quanto riportato nell'ultima frase della citata nota Dir.78/2021 la Società ArcelorMittal Italia S.p.A. precisa che "non intende comunque prestare acquiescenza al DM 212/2020 che ha contestato davanti al TAR Lazio con il giudizio RG 8130/2020 attualmente pendente. A questo fine richiama quanto statuito dal giudice amministrativo con il Decreto monocratico del 27 gennaio 2021 n.507, nel quale viene riconosciuto che dalle Conferenza di Servizi istruttoria del 27 novembre 2020 e decisoria del 16 dicembre 2020, è scaturito un nuovo quadro prescrittivo e temporale sostitutivo del precedente".

Nell'ambito della suddetta Conferenza di Servizi decisoria del 16/12/2020 per gli interventi di chiusura nastri e torri è stato previsto quanto segue:

**1.** Si prescrive al Gestore la chiusura dei nastri e delle torri in quota entro il **31 gennaio 2021**, ad eccezione delle attività di chiusura dei seguenti nastri e torri in quota, che devono comunque essere concluse nel rispetto del seguente cronoprogramma:

ID	Nastro Codice Identificativo	Materiale trasportato	Data di completamento chiusura
51	A2-14/1	minerale	28/02/2021
11	D2	calcare	30/04/2021
62	6/37	coke	30/04/2021
57	E24	agglomerato	31/05/2021
13	CV26-28-30 AFO4	fini agglomerato, coke, minerale	30/06/2021
14	CV18	fini agglomerato e minerale	30/06/2021
15	CV15	fini coke	30/06/2021
16	CV15.2	fini coke	30/06/2021
17	CV6.44	coke	30/06/2021
18	CV22	fini agglomerato	30/06/2021
19	CV23	fini agglomerato	30/06/2021
20	15-1	fini coke	30/06/2021
21	24	fini agglomerato	30/06/2021
22	6/45	coke	30/06/2021
26	CONV19	fini agglomerato e minerale	30/06/2021

ID	Torre Codice Identificativo	Materiale trasportato	Data di completamento chiusura
84	Torre S1-TH3	minerale fossile	30/02/2021
75	Torre TC CV14	fini coke	30/03/2021
76	Torre TC CV17	fini minerale	30/03/2021
79	Torre TC CV18 & parte alta Silo E3	fini agglomerato e minerale	30/03/2021
70	Torre 2 – scarico e rinvio materiale CV26- 28-30	fini agglomerato, coke, minerale	30/04/2021
73	Torre TC CV15	fini coke	30/04/2021
71	Torre TC 6/44	Coke	30/06/2021
72	Torre TC CV23	fini agglomerato	30/06/2021
74	Torre TC CV22	fini agglomerato	30/06/2021
77	Torre TC CV21	fini agglomerato	30/06/2021

2. Si prescrive al Gestore la chiusura dei nastri in piano entro il **30 aprile 2021**, ad eccezione delle attività di chiusura dei seguenti nastri in piano, che dovranno comunque essere concluse nel rispetto del seguente cronoprogramma:

ID	Nastro Codice Identificativo	Materiale trasportato	Data di completamento chiusura
1	A5/6	fini minerale	30/06/2021
53	A4-2 Loppa	loppa	30/06/2021
54	A4-3 Loppa	loppa	30/06/2021
55	A4-5 Loppa	loppa	30/06/2021
46	A5-1, A2-14 Trincerone	minerale	31/07/2021
60	A1-20	minerale e fossile	31/07/2021

Pertanto, con riferimento ai termini di completamento degli interventi di chiusura nastri e torri, la situazione derivante dai dati riportati nel cronoprogramma trasmesso da AMI in allegato con la nota in oggetto risulta in sintesi essere la seguente:


- i nastri e le torri in quota con termine di completamento entro il 31/01/2021, come da cronoprogramma allegato alla Dir 560/20 presa a riferimento nella CdS decisoria del 16/12/2020, sono stati chiusi nel termine previsto;
- per i n.25 interventi per i quali è stata prevista una eccezione di completamento al 31/01/2021 la situazione risulta essere la seguente:
  - per n.7 interventi (posizioni: 16, 20, 51, 73, 74, 79, 84) viene indicato che sono stati completati in anticipo ai tempi previsti;
  - per n.7 interventi (posizioni: 11, 18, 19, 21, 62, 72, 77) viene indicato che il nastro o la torre non è in esercizio e che il relativo riavvio avverrà solo dopo la loro completa chiusura;
  - per n.11 interventi (posizioni: 13, 14, 15, 17, 22, 26, 57, 70, 71, 75, 76) viene indicata una previsione di completamento entro i termini prescritti al suddetto punto 1 del verbale CdS;
- i nastri in piano con termine di completamento entro il 30/04/2021, come da cronoprogramma allegato alla Dir 560/20 presa a riferimento nella CdS decisoria del 16/12/2020, non riportano variazioni rispetto al termine previsto;
- i 6 interventi (posizioni: 1, 53, 54, 55, 46, 60) per i quali è stata prevista una eccezione di completamento al 30/04/2021, AMI indica una previsione di completamento entro i termini prescritti. Si specifica che per le posizioni (1, 53, 54 e 55) risultano al momento non essere ancora attivi i relativi cantieri come rappresentato nel seguente stralcio del cronoprogramma.

N°	Nastro/Torre	Codice identificativo	Materiale trasportato	Lunghezza totale nastro (m)	Nastro/Torre "In piano" o "In quota"	Data prevista di completamento lavori	Stato Cantiere	Fase Cantiere	Previsione riattivazione Cantiere	Note
1	Nastri	A5/6	fini minerali	30	IN PIANO	30/06/2021	NON ATTIVO	GARA	01/03/2021	Attività posticipata di 5 mesi su data apertura cantiere causa cambio fornitore non previsto
53	Nastri	A4-2 Leppa	leppa	35	IN PIANO	30/06/2021	NON ATTIVO	GARA	01/03/2021	Attività rimessa in gara causa cambio fornitore non previsto
54	Nastri	A4-3 Leppa	leppa	35	IN PIANO	30/06/2021	NON ATTIVO	GARA	01/03/2021	Attività rimessa in gara causa cambio fornitore non previsto
55	Nastri	A4-5 Leppa	leppa	35	IN PIANO	30/06/2021	NON ATTIVO	GARA	01/03/2021	Attività rimessa in gara causa cambio fornitore non previsto

In termini globali la situazione derivante dai dati riportati nel cronoprogramma trasmesso da AMI in allegato con la nota Dir.78/2021 in oggetto con riferimento ai termini di completamento degli interventi di chiusura nastri e torri è rappresentata dal seguente prospetto.

Completamento lavori - (Cronoprogramma allegato a nota AMI Dir.78 del 12/02/2021)															
	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20	gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	Totale
<b>NASTRI</b>	1	2	5	5	4	8	2	14	5	3	0	1	10	2	62
<b>TORRI</b>	6	0	4	5	5	7	4	6	4	4	1	0	1	0	47
<b>TOTALE</b>	7	2	9	10	9	15	6	20	9	7	1	1	11	2	109
N° interventi completati e/o con completamento previsto entro febbraio/2021 (*)											N° interventi con completamento previsto nel periodo marzo + luglio/2021				
87											22				
(*) Comprensivi di n.7 (nastri+torri) non in esercizio al 12/02/2021 il cui completamento pur essendo previsto entro giugno 2021, AMI evidenzia che il relativo riavvio avverrà solo dopo la loro completa chiusura															

La relativa distribuzione temporale risulta essere rappresentata dal seguente grafico.

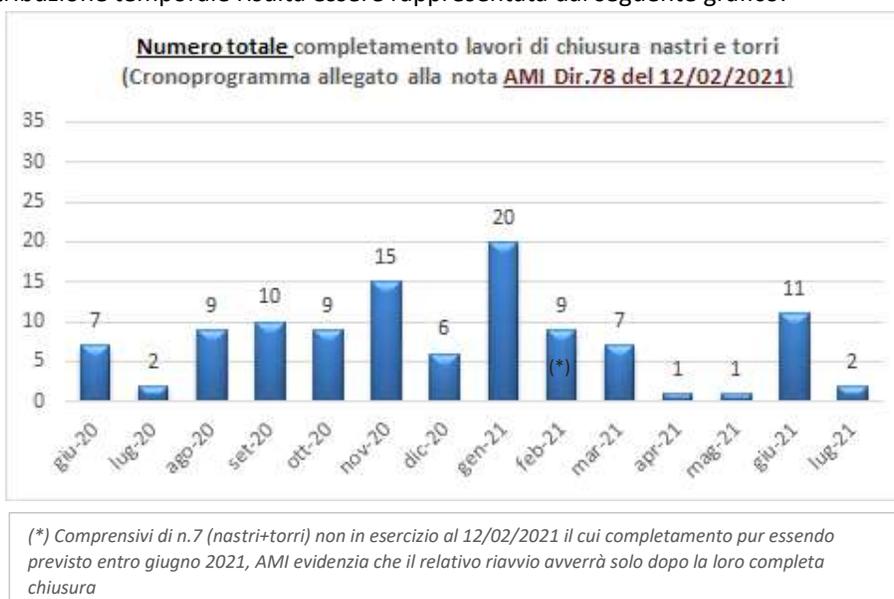

Taranto 16 febbraio 2021

Direzione Tecnica ed Operativa Ilva in A.S.

Angelo Cavallo
