



**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO - VALFABBRICA
SS. 76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

PERIZIA DI VARIANTE

<p>CONTRAENTE GENERALE:</p> 	<p><i>Il responsabile del Contraente Generale:</i></p>  Ing. Federico Montanari	<p><i>Il responsabile Integrazioni delle Prestazioni Specialistiche:</i></p>  Ing. Salvatore Lieto
---	---	--

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese

Mandataria: **PROGETTAZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE PROGIN S.p.A.** Mandanti:

		
--	---	--

<p>RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER L'A.T.I.</p>  Ing. Antonio Grimaldi	
---	--

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Iginio Farotti	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE Ing. Salvatore Chirico	IL DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Peppino Marascio
--	---	--

<p>2.1.2 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE Secondo stralcio funzionale: Matelica Nord - Matelica Sud/ Castelraimondo Nord ATTIVITA' ARCHEOLOGICA DI 2^ FASE <i>Cronoprogramma</i></p>	<p>SCALA: ---</p> <p>DATA: Novembre 2019</p>
---	--


Codice Unico di Progetto (CUP) **F12C03000050021** (Assegnato CIPE 20-04-2015)

Codice elaborato:

Opera	Tratto	Settore	CEE	WBS	Id. doc.	N. prog.	Rev.
L 0 7 0 3	2 1 2	E	2 4	E T 0 0 0 1	C R 0	0 1	C

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto		Controllato	Approvato
A	Luglio 2019	Emissione	PROGIN	PROGIN	S. Lieto	A. Grimaldi
B	Settembre 2019	Emissione a seguito nota QMU 3773-P del 04/09/2019	PROGIN	PROGIN	S. Lieto	A. Grimaldi
C	Settembre 2019	Emissione a seguito nota QMU 3773-P del 04/09/2019	PROGIN	PROGIN	S. Lieto	A. Grimaldi

Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Remaining Duration	2019												2020												2021																							
					May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec																
MAXILOTTO 2 Sub-lotto 2.2: Pedemontana delle Marche-2°LF PERIZIA ARCHEOL		01-Jul-19	10-Sep-21	803																																																
EX LOTTO 2 DA PK 3+655.9 A PK 8+420		01-Jul-19	10-Sep-21	803																																																
TRATTO DA PK 3+655.9 A PK 5+010		01-Jul-19	10-Sep-21	803																																																
Interferenze		01-Jul-19	10-Sep-21	803																																																
Archeologia 2° fase		01-Jul-19	10-Sep-21	803																																																
Area "A2"		01-Jul-19	10-Sep-21	803																																																
220INTARC.A2.10	Indagini 2° Fase - Attività precritte da SBAM a Set-18	01-Jul-19	31-Mar-20	275																																																
220INTARC.A2.30	Tempo Disponibile per Ulteriori Prescrizioni	01-Apr-20	10-May-20	40																																																
220INTARC.A2.20	Svincolo SBAM area "A2" - Avvio Opere Civili		25-May-20	0																																																
220INTARC.A2.40	Opere Civili Interferite	26-May-20	10-Sep-21	473																																																
OPERE CIVILI INTERFERITI		26-May-20	10-Sep-21	328																																																
CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE DA KM 3+290 A KM 3+3655,90 (EX LOTTO 1)-1		26-May-20	16-Feb-21	182																																																
Lavori		26-May-20	16-Feb-21	182																																																
220CS19L0010	preparazione dei piani di posa	26-May-20	19-Jun-20	18																																																
220CS19L0020	bonifica	22-Jun-20	17-Jul-20	20																																																
220CS19L003A	scavo	20-Jul-20	28-Jul-20	7																																																
220CS19L003B	rilevato	20-Jul-20	13-Oct-20	62																																																
220CS19L0040	sistemazione idraulica, cunette e fossi di guardia	23-Sep-20	02-Dec-20	51																																																
220CS19L005A	sovrastuttura stradale - fondazione stradale	19-Nov-20	17-Dec-20	20																																																
220CS19L005B	sovrastuttura stradale - base/binder	18-Dec-20	15-Jan-21	14																																																
220CS19L0070	barriere di sicurezza	18-Jan-21	26-Jan-21	7																																																
220CS19L005C	sovrastuttura stradale - usura	18-Jan-21	26-Jan-21	7																																																
220CS19L0060	opere a verde e di finitura	27-Jan-21	16-Feb-21	15																																																
220CS19L0080	segnaletica	27-Jan-21	04-Feb-21	7																																																
CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE DA KM 3+655.90 A KM 4+256,00 (EX LOTTO 2)		29-Sep-20	10-Sep-21	239																																																
Lavori		29-Sep-20	10-Sep-21	239																																																
220CS35A0020	bonifica	29-Sep-20	02-Nov-20	25																																																
220CS35A003B	rilevato	19-Nov-20	22-Feb-21	60																																																
220CS35A003A	scavo	01-Dec-20	04-Dec-20	4																																																
220CS35A0040	sistemazione idraulica, cunette e fossi di guardia	01-Apr-21	11-May-21	28																																																
220CS35A005A	sovrastuttura stradale - fondazione stradale	26-May-21	16-Jun-21	15																																																
220CS35A005B	sovrastuttura stradale - base/binder	01-Jul-21	14-Jul-21	10																																																
220CS35A005C	sovrastuttura stradale - usura	21-Jul-21	26-Jul-21	4																																																
220CS35A0070	barriere di sicurezza	30-Jul-21	04-Aug-21	4																																																
220CS35A0080	segnaletica	30-Jul-21	04-Aug-21	4																																																
220CS35A0060	opere a verde e di finitura	10-Aug-21	10-Sep-21	24																																																
CORPO STRADALE SVINCOLO MATELICA OVEST al km 3+709,65		18-Jun-20	12-May-21	226																																																
Lavori		18-Jun-20	12-May-21	226																																																
220CS33003A	scavo	18-Jun-20	15-Jul-20	20																																																
220CS330010	preparazione dei piani di posa	16-Jul-20	29-Sep-20	54																																																
220CS330020	bonifica	16-Jul-20	10-Sep-20	41																																																
220CS33003B	rilevato	30-Sep-20	17-Dec-20	56																																																
220CS330040	sistemazione idraulica, cunette e fossi di guardia	26-Nov-20	03-Feb-21	42																																																
220CS33005A	sovrastuttura stradale - fondazione stradale	15-Jan-21	18-Feb-21	25																																																
220CS33005B	sovrastuttura stradale - base/binder	19-Feb-21	10-Mar-21	14																																																
220CS33005C	sovrastuttura stradale - usura	11-Mar-21	19-Mar-21	7																																																
220CS330070	barriere di sicurezza	22-Mar-21	30-Mar-21	7																																																
220CS330080	segnaletica	22-Mar-21	30-Mar-21	7																																																
220CS330060	opere a verde e di finitura	31-Mar-21	12-May-21	30																																																
MURO DI SOSTEGNO IN C.A. AD "U"; L=70m; H f.t.= 2.00/4.90m ALLA PROGR. 3+715.00		26-May-20	09-Dec-20	140																																																
Lavori		26-May-20	09-Dec-20	140																																																
220MU340010	scavi	26-May-20	16-Jun-20	15																																																

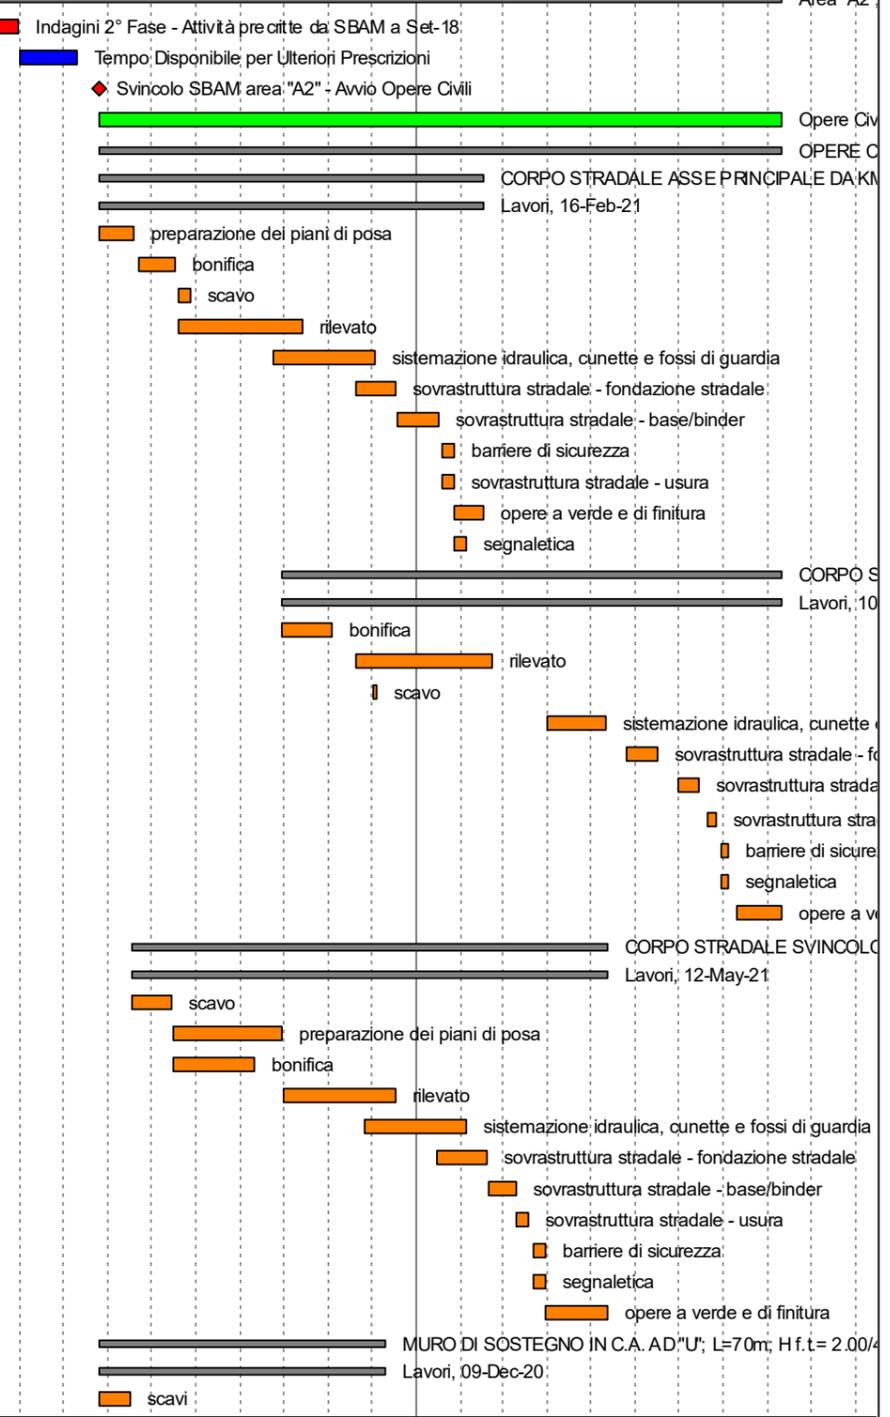

█ Opere Civili Interferite █ Remaining Work █ Indagini 2° Fase - Attività precritte da SBAM a Set-18 █ Tempo Disponibile per Ulteriori Prescrizioni
█ Summary ◆ Milestone

Date	Revision	Checked	Approved
Jun-19	POD REV.A - Perizia Archeologia	PCC	DG
Sep-19	POD REV.B - Perizia Archeologia	PCC	DG
Nov-19	POD REV.C - Perizia Archeologia	PCC	DG

Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Remaining Duration	2019												2020												2021														
					May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec							
TOMBINO CIRCOLARE DN1500MM PK 3+940,00					29-Oct-20	21-Dec-20	37	TOMBINO CIRCOLARE DN1500MM PK 3+940,00, 21-Dec-20																																			
Lavori					29-Oct-20	21-Dec-20	37	Lavori, 21-Dec-20																																			
220OI45M0010	scavi	29-Oct-20	18-Nov-20	15	scavi																																						
220OI45M0020	tubazioni rivestimenti e opere in cls	19-Nov-20	30-Nov-20	8	tubazioni rivestimenti e opere in cls																																						
220OI45M0030	opere di imbocco a monte e a valle	01-Dec-20	21-Dec-20	14	opere di imbocco a monte e a valle																																						
Area "A4"					01-Nov-19	10-Sep-21	680	Area "A4"																																			
220INTARC.A4.10	Indagini archeologiche 2° Fase area "A4" MATTM (splateamento)	01-Nov-19	30-Dec-19	60	Indagini archeologiche 2° Fase area "A4" MATTM (splateamento)																																						
220INTARC.A4.20	Tempo Disponibile per Ulteriori Prescrizioni	31-Dec-19	17-Nov-20	323	Tempo Disponibile per Ulteriori Prescrizioni																																						
220INTARC.A4.30	Svincolo SBAM area "A4" - Avvio Opere Civili		02-Dec-20	0	Svincolo SBAM area "A4" - Avvio Opere Civili																																						
220INTARC.A2.60	Opere Civili Interferite	03-Dec-20	10-Sep-21	282	Opere Civili Interferite																																						
OPERE CIVILI INTERFERITI					03-Dec-20	10-Sep-21	192	OPERE CIVILI INTERFERITI																																			
CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE DA KM 4+270,95 A KM 5+000,00 (EX LOTTO 2)					03-Dec-20	10-Sep-21	192	CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE DA KM 4+270,95 A KM 5+000,00 (EX LOTTO 2)																																			
Lavori					03-Dec-20	10-Sep-21	192	Lavori, 10-Sep-21																																			
220CS35B0010	preparazione dei piani di posa	03-Dec-20	14-Dec-20	7	preparazione dei piani di posa																																						
220CS35B003A	scavo	15-Dec-20	23-Dec-20	7	scavo																																						
220CS35B0020	bonifica	24-Dec-20	12-Jan-21	7	bonifica																																						
220CS35B003B	rilevato	13-Jan-21	16-Feb-21	25	rilevato																																						
220CS35B0040	sistemazione idraulica, cunette e fossi di guardia	17-Feb-21	07-May-21	57	sistemazione idraulica, cunette e fossi di guardia																																						
220CS35B005A	sovrastuttura stradale - fondazione stradale	10-May-21	23-Jun-21	32	sovrastuttura stradale - fondazione stradale																																						
220CS35B005B	sovrastuttura stradale - base/binder	24-Jun-21	13-Jul-21	14	sovrastuttura stradale - base/binder																																						
220CS35B005C	sovrastuttura stradale - usura	14-Jul-21	22-Jul-21	7	sovrastuttura stradale - usura																																						
220CS35B0070	barriere di sicurezza	23-Jul-21	02-Aug-21	7	barriere di sicurezza																																						
220CS35B0080	segnaletica	23-Jul-21	03-Aug-21	8	segnaletica																																						
220CS35B0060	opere a verde e di finitura	03-Aug-21	10-Sep-21	29	opere a verde e di finitura																																						
MURO DI CONTRORIPA IN SX DAPK 4+369,71 A PK 4+478					24-Dec-20	22-Mar-21	56	MURO DI CONTRORIPA IN SX DAPK 4+369,71 A PK 4+478																																			
Lavori					24-Dec-20	22-Mar-21	56	Lavori, 22-Mar-21																																			
220MU76A0010	scavi	24-Dec-20	08-Jan-21	5	scavi																																						
220MU76A0020	fondazioni profonde e palificate	11-Jan-21	05-Feb-21	20	fondazioni profonde e palificate																																						
220MU76A0030	opere in fondazione	08-Feb-21	22-Feb-21	11	opere in fondazione																																						
220MU76A0040	opere in elevazione	23-Feb-21	08-Mar-21	10	opere in elevazione																																						
220MU76A0070	opere varie e di finitura	09-Mar-21	22-Mar-21	10	opere varie e di finitura																																						
MURO DI CONTRORIPA IN DX DAPK 4+409,19 A PK 4+478					11-Jan-21	25-Mar-21	54	MURO DI CONTRORIPA IN DX DAPK 4+409,19 A PK 4+478																																			
Lavori					11-Jan-21	25-Mar-21	54	Lavori, 25-Mar-21																																			
220MU76C0010	scavi	11-Jan-21	15-Jan-21	5	scavi																																						
220MU76C0020	fondazioni profonde e palificate	18-Jan-21	03-Feb-21	13	fondazioni profonde e palificate																																						
220MU76C0030	opere in fondazione	17-Feb-21	26-Feb-21	8	opere in fondazione																																						
220MU76C0040	opere in elevazione	01-Mar-21	11-Mar-21	9	opere in elevazione																																						
220MU76C0070	opere varie e di finitura	12-Mar-21	25-Mar-21	10	opere varie e di finitura																																						
TRATTO DA PK 5+010 A PK 5+850					01-Nov-19	10-Sep-21	680	TRATTO DA PK 5+010 A PK 5+850																																			
Interferenze					01-Nov-19	10-Sep-21	680	Interferenze																																			
Archeologia 2° fase					01-Nov-19	10-Sep-21	680	Archeologia 2° fase																																			
Area "5"					01-Nov-19	10-Sep-21	680	Area "5"																																			
220INTARC.A5.10	Indagini 2° Fase - Attività precltte da SBAM a Set-18	01-Nov-19	31-Dec-19	61	Indagini 2° Fase - Attività precltte da SBAM a Set-18																																						
220INTARC.A5.30	Tempo Disponibile per Ulteriori Prescrizioni	01-Jan-20	14-Feb-20	45	Tempo Disponibile per Ulteriori Prescrizioni																																						
220INTARC.A5.20	Svincolo SBAM area "A5" - Avvio Opere Civili		29-Feb-20	0	Svincolo SBAM area "A5" - Avvio Opere Civili																																						
220INTARC.A2.70	Opere Civili Interferite	02-Mar-20	10-Sep-21	392	Opere Civili Interferite																																						
OPERE CIVILI INTERFERITI					02-Mar-20	10-Sep-21	387	OPERE CIVILI INTERFERITI																																			
GALLERIA "MISTRIANELLO"					02-Mar-20	01-Jul-21	336	GALLERIA "MISTRIANELLO"																																			
Lavori					02-Mar-20	01-Jul-21	336	Lavori, 01-Jul-21																																			
220GA300020	movimenti di terra, scavi a cielo aperto	02-Mar-20	15-Feb-21	240	movimenti di terra, scavi a cielo aperto																																						
220GA300010	opere di sostegno e consolidamento	06-May-20	18-Feb-21	198	opere di sostegno e consolidamento																																						
220GA300040	platea / arco rovescio	18-Jun-20	11-Jan-21	140	platea / arco rovescio																																						
220GA300050	calotta, piedritti / muri in elevazione	17-Nov-20	23-Apr-21	105	calotta, piedritti / muri in elevazione																																						

■ Opere Civili Interferite ◆ Milestone
■ Remaining Work Summary
■ Indagini 2° Fase - Attività precltte da SBAM a Set-18
■ Tempo Disponibile per Ulteriori Prescrizioni

Page 3 of 5		Date	Revision	Checked	Approved
		Jun-19	POD REV.A - Perizia Archeologia	PCC	DG
		Sep-19	POD REV.B - Perizia Archeologia	PCC	DG
		Nov-19	POD REV.C - Perizia Archeologia	PCC	DG

