

**Nota tecnica sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla
Nota AMI Dir.152/2021 del 19/03/2021**

In data 19/03/2021, ArcelorMittal Italia S.p.A. ha provveduto a trasmettere ad ILVA in A.S. la nota Dir.152/2021 contenente l'aggiornamento del cronoprogramma di esecuzione lavori relativi alla prescrizione n.6 del Piano ambientale avente il seguente oggetto:

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 recante "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, della legge 1 febbraio 2016, n. 13" – Istanza di proroga mediante convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.61 e dell'art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 29 settembre 2017, Prescrizione 6 – Decreto Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 212 del 29.09.2020 – Prescrizioni dettate dalla Conferenza di servizi istruttoria del 27 novembre 2020 dalla Conferenza di servizi decisoria del 16 dicembre 2020 – Trasmissione aggiornamento del cronoprogramma delle attività connesse alla prescrizione 6. (ID n. 90/10728)

Oggetto nota AMI Dir.152 del 19/03/2021

Per quanto riportato nell'ultima frase della citata nota Dir.152/2021 la Società ArcelorMittal Italia S.p.A. precisa che *"non intende comunque prestare acquiescenza al DM 212/2020 che ha contestato davanti al TAR Lazio con il giudizio RG 8130/2020 attualmente pendente. A questo fine richiama quanto statuito dal giudice amministrativo con l'Ordinanza del 19 febbraio 2021 n.1081, nella quale viene riconosciuto che dalle Conferenza di Servizi istruttoria del 27 novembre 2020 e decisoria del 16 dicembre 2020, è scaturito un nuovo quadro prescrittivo e temporale sostitutivo del precedente"*.

Nell'ambito della suddetta Conferenza di Servizi decisoria del 16/12/2020 per gli interventi di chiusura nastri e torri era stato previsto quanto segue:

1. Si prescrive al Gestore la chiusura dei nastri e delle torri in quota entro il 31 gennaio 2021, ad eccezione delle attività di chiusura dei seguenti nastri e torri in quota, che devono comunque essere concluse nel rispetto del seguente cronoprogramma:

| ID | Nastro Codice Identificativo | Materiale trasportato | Data di completamento chiusura |
|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 51 | A2-14/1 | minerale | 28/02/2021 |
| 11 | D2 | calcare | 30/04/2021 |
| 62 | 6/37 | coke | 30/04/2021 |
| 57 | E24 | agglomerato | 31/05/2021 |
| 13 | CV26-28-30 AFO4 | fini agglomerato, coke, minerale | 30/06/2021 |
| 14 | CV18 | fini agglomerato e minerale | 30/06/2021 |
| 15 | CV15 | fini coke | 30/06/2021 |
| 16 | CV15.2 | fini coke | 30/06/2021 |
| 17 | CV6.44 | coke | 30/06/2021 |
| 18 | CV22 | fini agglomerato | 30/06/2021 |
| 19 | CV23 | fini agglomerato | 30/06/2021 |
| 20 | 15-1 | fini coke | 30/06/2021 |
| 21 | 24 | fini agglomerato | 30/06/2021 |
| 22 | 6/45 | coke | 30/06/2021 |
| 26 | CONV19 | fini agglomerato e minerale | 30/06/2021 |

| ID | Torre Codice Identificativo | Materiale trasportato | Data di completamento chiusura |
|----|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| 84 | Torre SI-TH3 | minerale fossile | 30/02/2021 |
| 75 | Torre TC CV14 | fini coke | 30/03/2021 |
| 76 | Torre TC CV17 | fini minerale | 30/03/2021 |
| 79 | Torre TC CV18 & parte alta Silo E3 | fini agglomerato e minerale | 30/03/2021 |
| 70 | Torre 2 – scarico e riavvio materiale CV26- 28-30 | fini agglomerato, coke, minerale | 30/04/2021 |
| 73 | Torre TC CV15 | fini coke | 30/04/2021 |
| 71 | Torre TC 6/44 | Coke | 30/06/2021 |
| 72 | Torre TC CV23 | fini agglomerato | 30/06/2021 |
| 74 | Torre TC CV22 | fini agglomerato | 30/06/2021 |
| 77 | Torre TC CV21 | fini agglomerato | 30/06/2021 |

2. Si prescrive al Gestore la chiusura dei nastri in piano entro il 30 aprile 2021, ad eccezione delle attività di chiusura dei seguenti nastri in piano, che dovranno comunque essere concluse nel rispetto del seguente cronoprogramma:

| ID | Nastro Codice Identificativo | Materiale trasportato | Data di completamento chiusura |
|----|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 | A5/6 | fini minerale | 30/06/2021 |
| 53 | A4-2 Loppa | loppa | 30/06/2021 |
| 54 | A4-3 Loppa | loppa | 30/06/2021 |
| 55 | A4-5 Loppa | loppa | 30/06/2021 |
| 46 | A5-1, A2-14 Trincerone | minerale | 31/07/2021 |
| 60 | A1-20 | minerale e fossile | 31/07/2021 |

Pertanto, con riferimento ai termini di completamento degli interventi di chiusura nastri e torri, la situazione derivante dai dati riportati nel cronoprogramma trasmesso da AMI in allegato con la nota in oggetto risulta in sintesi essere la seguente:


- i nastri e le torri in quota con termine di completamento entro il 31/01/2021, come da cronoprogramma allegato alla Dir 560/2020 presa a riferimento nella CdS decisoria del 16/12/2020, risultano essere stati chiusi entro tale termine;
- per i n.25 interventi per i quali era stata prevista una eccezione di completamento al 31/01/2021 la situazione risulta essere la seguente:
 - per n.8 interventi (posizioni: 16, 20, 51, 62, 73, 74, 79, 84) viene indicato che sono stati completati;
 - per n.6 interventi (posizioni: 11, 18, 19, 21, 72, 77) viene indicato che il nastro o la torre non è in esercizio e che il relativo riavvio avverrà solo dopo la loro completa chiusura;
 - per n.11 interventi (posizioni: 13, 14, 15, 17, 22, 26, 57, 70, 71, 75, 76) viene indicata una previsione di completamento entro i termini prescritti al suddetto punto 1 del verbale CdS e per i quali AMI riporta nel campo note la seguente indicazione “Nastri non in esercizio dalla fermata di AFO/4”;
- per i nastri e le torri in piano ancora da realizzare, con termine di completamento entro il 30/04/2021 come da cronoprogramma allegato alla nota Dir.560/20 presa a riferimento nella CdS decisoria del 16/12/2020, non vengono riportate variazioni rispetto al termine previsto, ad eccezione dell'intervento sulla torre in piano di cui alla posizione n.121 per la quale è stata aggiornata la previsione di completamento al 31/03/2021 con uno slittamento di ca. 1 mese rispetto alla data del 28/02/2021 indicata nel cronoprogramma allegato alla nota Dir.560/2020;
- per i n.6 interventi relativi alle posizioni: 1, 46, 53, 54, 55, 60, per i quali era stata prevista una eccezione di completamento al 30/04/2021, AMI indica una previsione di completamento entro i termini prescritti. Si specifica che vengono attualmente riportati come “attivi” anche i cantieri relativi alle posizioni (1, 53, 54 e 55), che precedentemente risultavano ancora non attivi.

In termini globali la situazione derivante dai dati riportati nel cronoprogramma trasmesso da AMI in allegato con la nota Dir.152/2021 in oggetto con riferimento ai termini di completamento degli interventi di chiusura nastri e torri è rappresentata dal seguente prospetto.

| Completamento lavori - (Cronoprogramma allegato a nota AMI Dir.152 del 19/03/2021) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | giu-20 | lug-20 | ago-20 | set-20 | ott-20 | nov-20 | dic-20 | gen-21 | feb-21 | mar-21 | apr-21 | mag-21 | giu-21 | lug-21 | Totale |
| NASTRI | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 62 |
| TORRI | 6 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| TOTALE | 7 | 2 | 9 | 10 | 8 | 15 | 7 | 20 | 8 | 8 | 1 | 1 | 11 | 2 | 109 |

| | |
|---|---|
| N° interventi completati e/o con completamento previsto entro marzo 2021 (*) | N° interventi con completamento previsto nel periodo aprile - luglio 2021 |
| 94 | 15 |
| (*) Comprensivi di n.6 (nastri+torri) non in esercizio per i quali, AMI evidenzia che il relativo riavvio avverrà solo dopo la loro completa chiusura | |

La relativa distribuzione temporale risulta essere rappresentata dal seguente grafico.

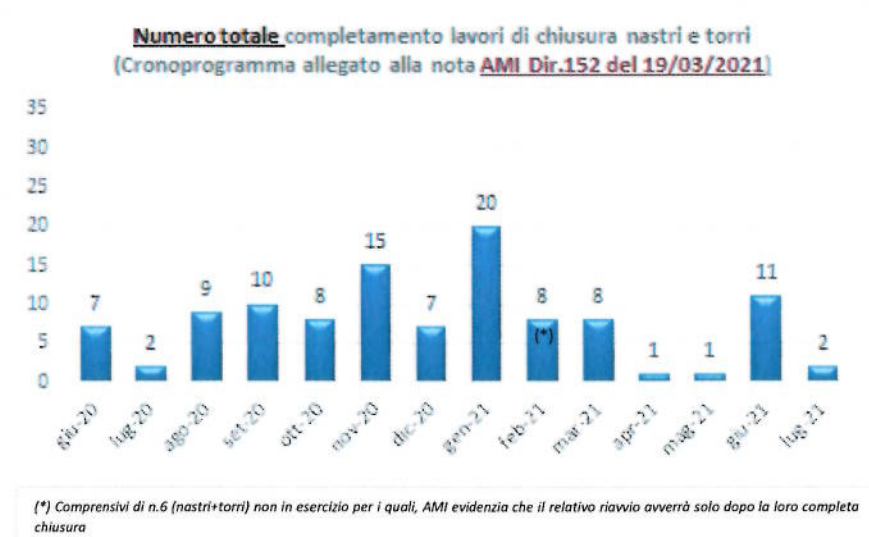

Taranto 20 marzo 2021

Direzione Tecnica ed Operativa Ilva in A.S.

Angelo Cavallo
