



REGIONE BASILICATA
 PROVINCIA DI MATERA
 COMUNI DI MONTECAGLIOSO E
 POMARICO



AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.LGS. 387/2003

Progetto Definitivo
 Parco eolico "Piana dell'Imperatore" e opere connesse

TITOLO ELABORATO

A.14 Cronoprogramma

CODICE ELABORATO

COMMESSA	FASE	ELABORATO	REV.
F0355	A	R14	B

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione

SCALA

—

DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
giugno 2021	emissione per revisione punto di consegna	GMA	GDS	GMA
ottobre 2020	prima emissione	GMA	GDS	GMA

PROPONENTE

FRI-EL

FRI-EL S.p.A.
 Piazza della Rotonda 2
 00186 Roma (RM)
 fri-elspa@legalmail.it
 P. Iva 01652230218
 Cod. Fisc. 07321020153

PROGETTAZIONE

 **F4 ingegneria srl**
 via Di Giura - Centro Direzionale, 85100 Potenza
 Tel: +39 0971 1 944 797 - Fax: +39 0971 5 54 52
 www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
 (ing. Giuseppe Manzi)



 Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).




	Nome	Durata	Avvio	Termine	9 ago 21					16 ago 21					23 ago 21					30 ag								
					M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M		
1	Parco Eolico "Piana dell...	615 giorni	06/08/21 9.00	14/12/23 18.00																								
2	Iter autorizzativo	260 giorni	06/08/21 9.00	04/08/22 18.00																								
3	Permitting	200 giorni	06/08/21 9.00	12/05/22 18.00																								
4	Contratto EPC	60 giorni	13/05/22 9.00	04/08/22 18.00																								
5	Fase di Cantiere	330 giorni	05/08/22 9.00	09/11/23 18.00																								
6	Cantierizzazione	10 giorni	05/08/22 9.00	18/08/22 18.00																								
7	Viabilità	120 giorni	19/08/22 9.00	02/02/23 18.00																								
8	Fondazioni	60 giorni	23/12/22 9.00	16/03/23 18.00																								
9	Sottostazione Elettrica...	90 giorni	19/08/22 9.00	22/12/22 18.00																								
10	Cavidotti	200 giorni	03/02/23 9.00	09/11/23 18.00																								
11	Interno	60 giorni	17/03/23 9.00	08/06/23 18.00																								
12	esterno e SSE	200 giorni	03/02/23 9.00	09/11/23 18.00																								
13	Montaggio aerogenera...	80 giorni	17/03/23 9.00	06/07/23 18.00																								
14	Messa in esercizio	25 giorni	10/11/23 9.00	14/12/23 18.00																								
15	Energizzazione	15 giorni	10/11/23 9.00	30/11/23 18.00																								
16	Avvio produzione	10 giorni	01/12/23 9.00	14/12/23 18.00																								

o 21					6 set 21					13 set 21					20 set 21					27 set 21					4 ott 21					11 ott 21					18 ott 21					25 ott 21					1 nov 21																													
M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D


8 nov 21	15 nov 21	22 nov 21	29 nov 21	6 dic 21	13 dic 21	20 dic 21	27 dic 21	3 gen 22	10 gen 22
L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V

17 gen 22					24 gen 22					31 gen 22					7 feb 22					14 feb 22					21 feb 22					28 feb 22					7 mar 22					14 mar 22					21 mar 22																										
S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D


2	28 mar 22					4 apr 22					11 apr 22					18 apr 22					25 apr 22					2 mag 22					9 mag 22					16 mag 22					23 mag 22					30																												
G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L




mag 22					6 giu 22					13 giu 22					20 giu 22					27 giu 22					4 lug 22					11 lug 22					18 lug 22					25 lug 22					1 ago 22																														
M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D

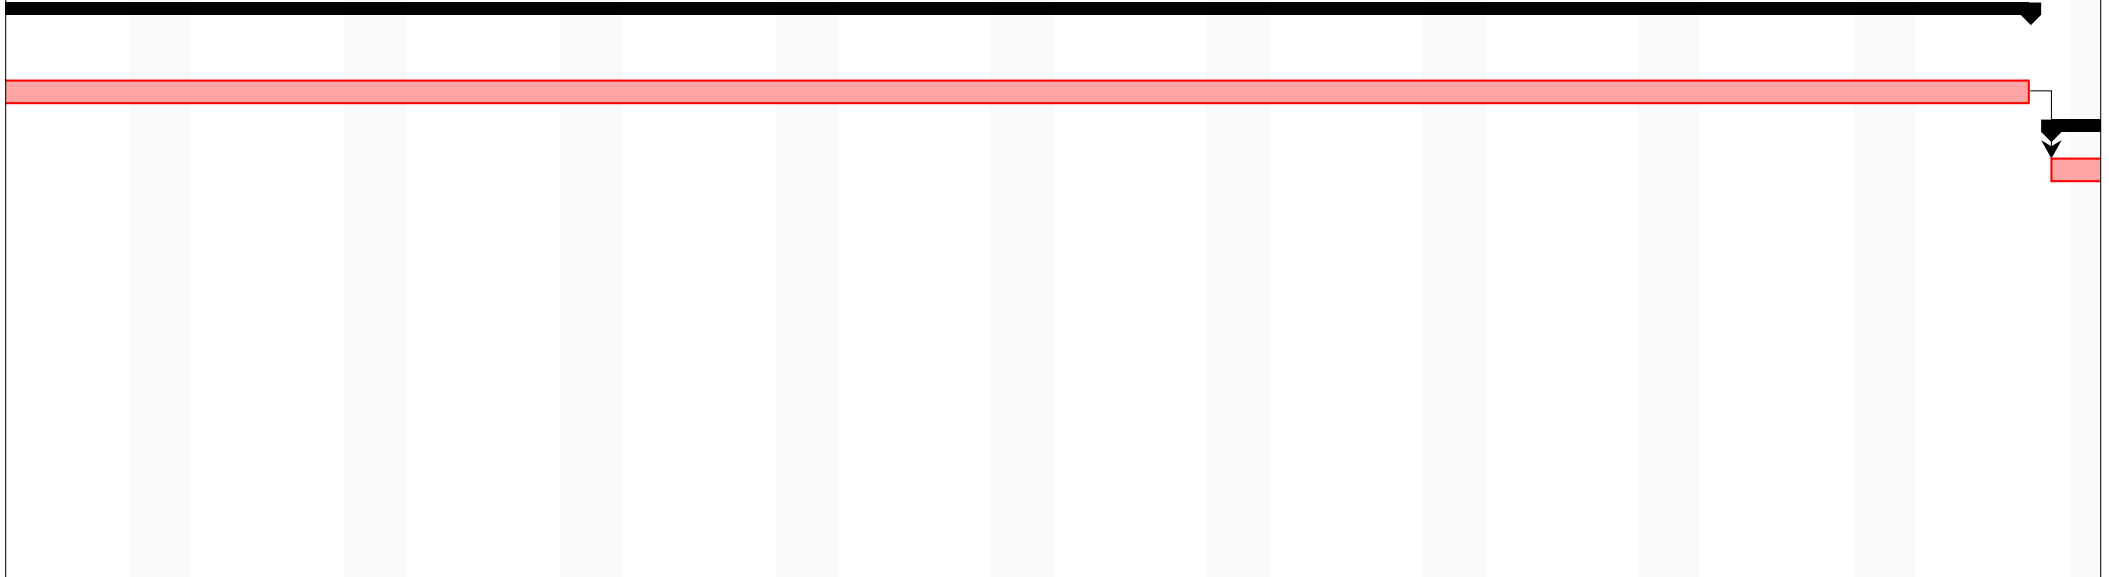


8 ago 22				15 ago 22				22 ago 22				29 ago 22				5 set 22				12 set 22				19 set 22				26 set 22				3 ott 22				10 ott 22																											
D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D

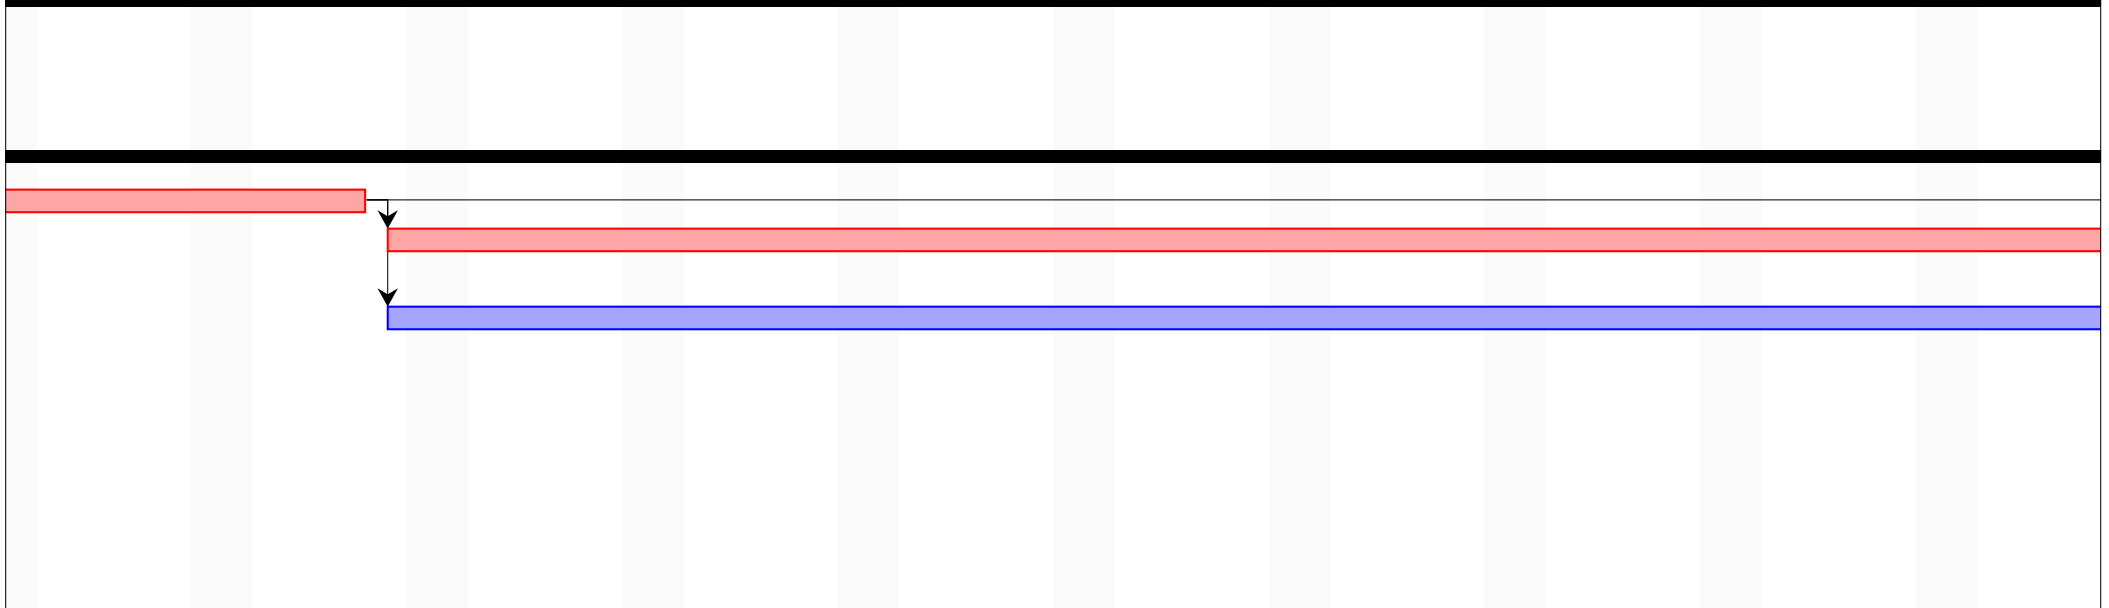


17 ott 22				24 ott 22				31 ott 22				7 nov 22				14 nov 22				21 nov 22				28 nov 22				5 dic 22				12 dic 22				19 dic										
V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M




: 22					26 dic 22					2 gen 23					9 gen 23					16 gen 23					23 gen 23					30 gen 23					6 feb 23					13 feb 23					20 feb 23																													
M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D

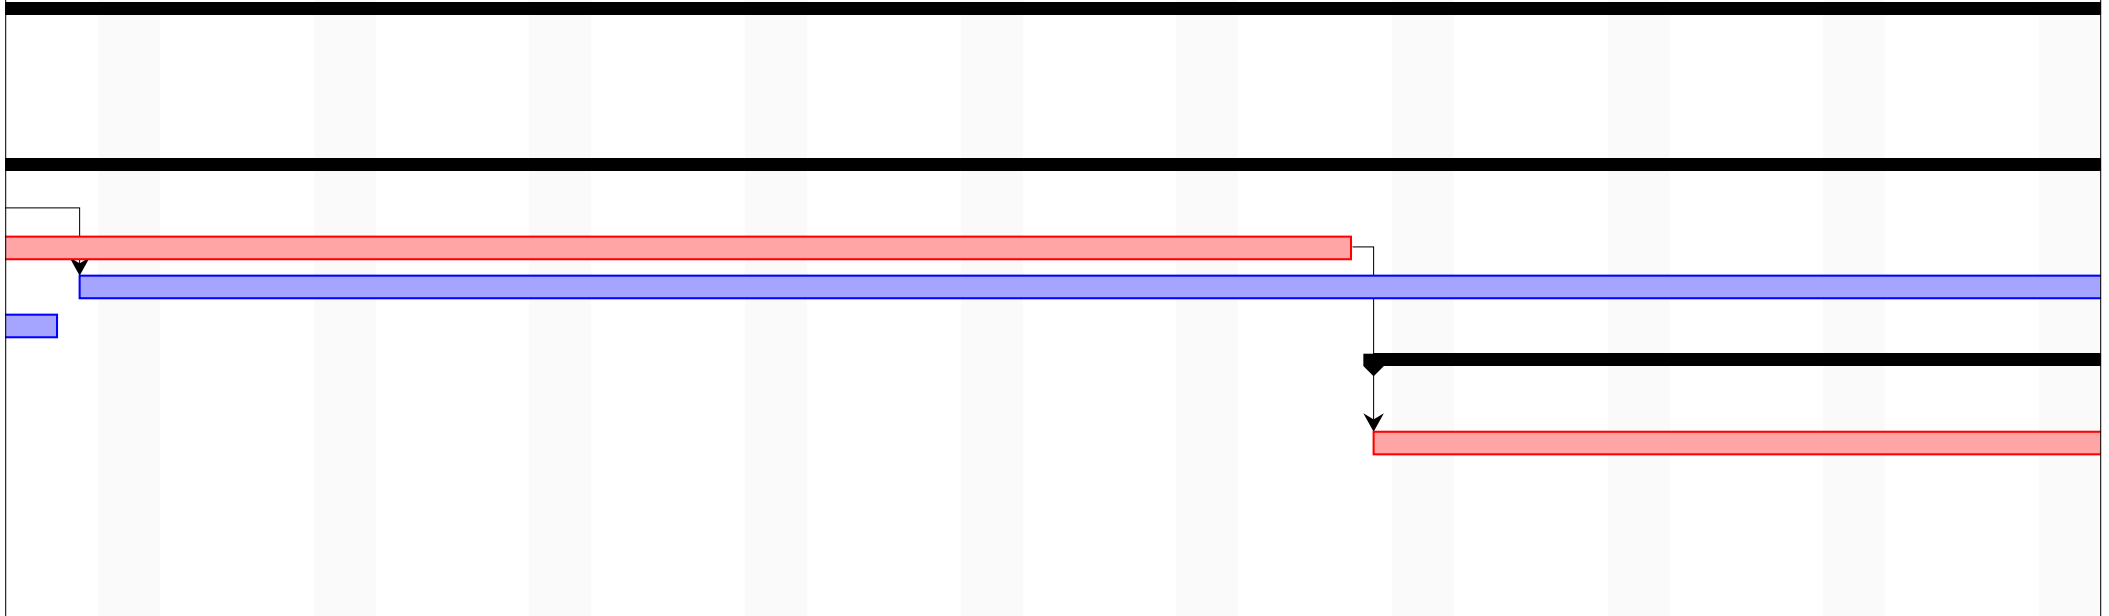

27 feb 23				6 mar 23				13 mar 23				20 mar 23				27 mar 23				3 apr 23				10 apr 23				17 apr 23				24 apr 23				1 mag 23																																								
L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D

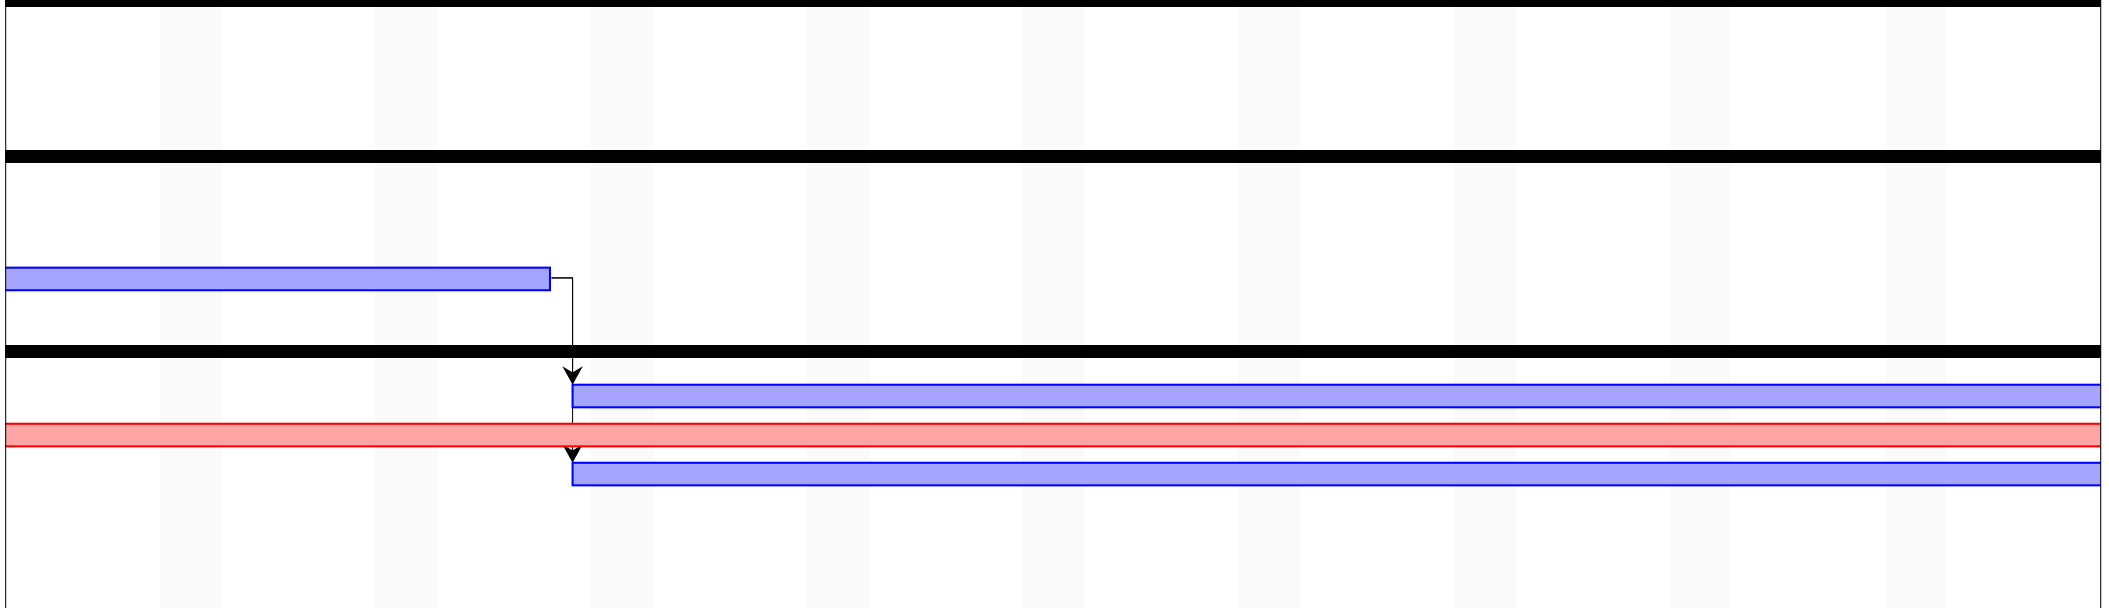


8 mag 23				15 mag 23				22 mag 23				29 mag 23				5 giu 23				12 giu 23				19 giu 23				26 giu 23				3 lug 23				10 lug 23										
S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M

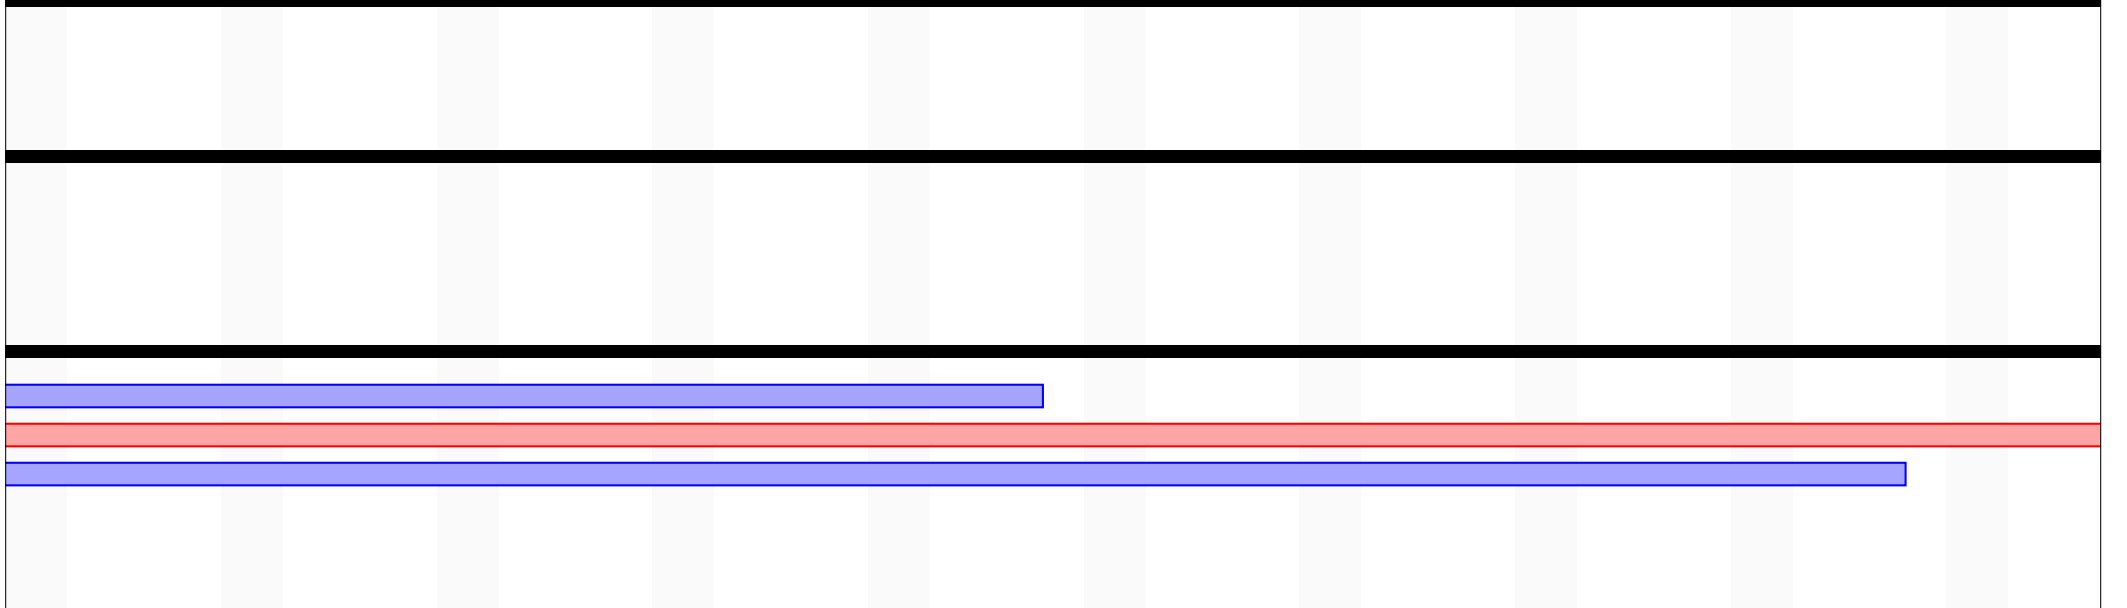

	17 lug 23		24 lug 23		31 lug 23		7 ago 23		14 ago 23		21 ago 23		28 ago 23		4 set 23		11 set 23		18						
G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L

set 23					25 set 23					2 ott 23					9 ott 23					16 ott 23					23 ott 23					30 ott 23					6 nov 23					13 nov 23					20 nov 23																																					
M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D

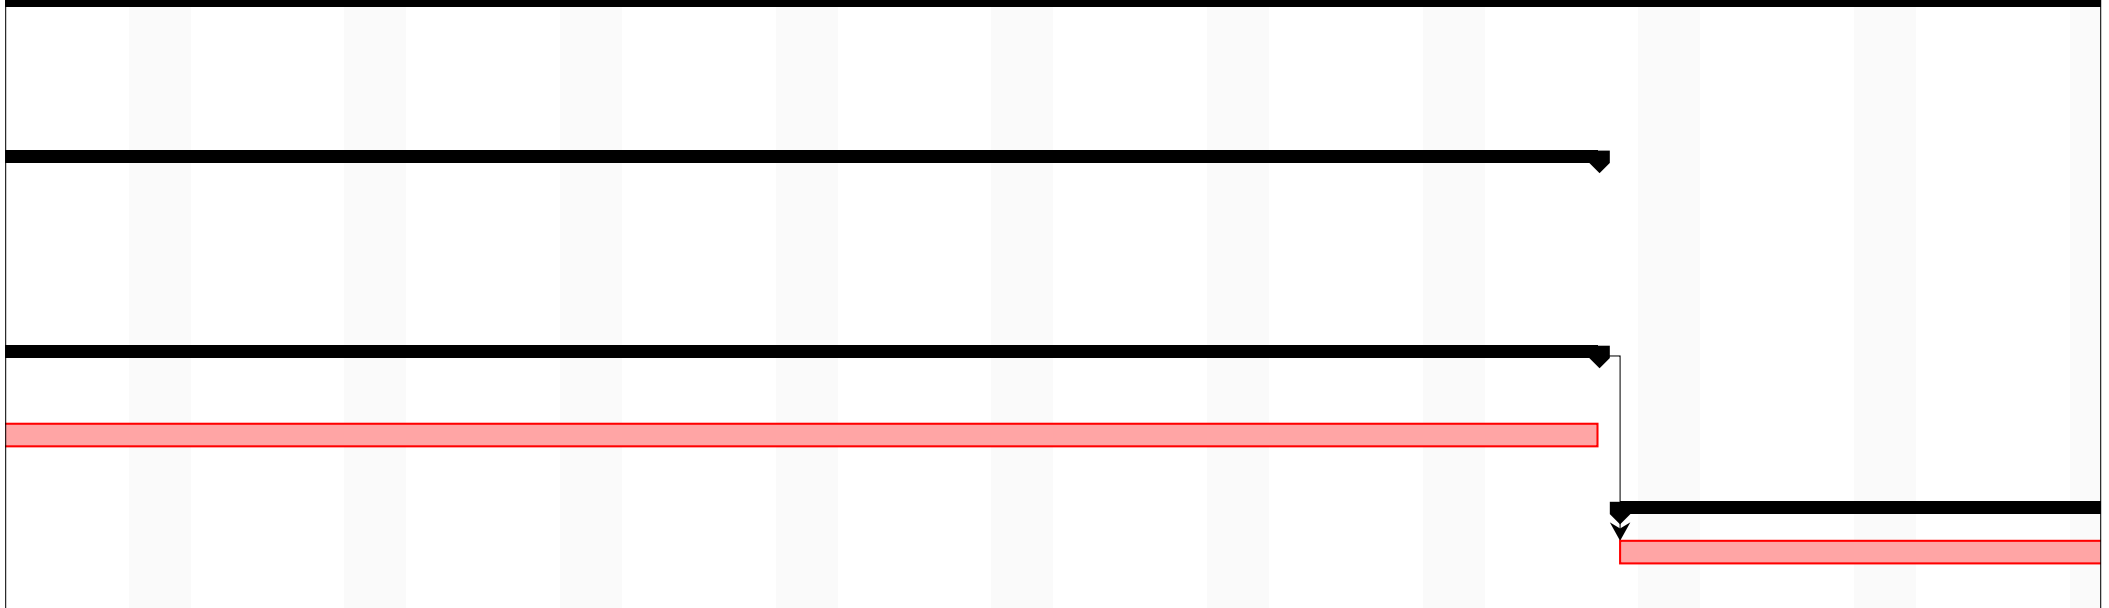

27 nov 23					4 dic 23					11 dic 23					18 dic 23					25 dic 23					1 gen 24					8 gen 24																			
D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
