

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



PROGETTO di FATTIBILITA'

**PIANO DECENNALE DI SVILUPPO DELLE RETI
DI TRASPORTO REGIONALE DEL GAS NATURALE
2021-2030 LOTTO FUNZIONALE 1**

TITOLO DELL'ELABORATO

**CRONOPROGRAMMA E WBS
CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA**

Emissione revisione: rev.0

PROPONENTE

**GASDOTTI
ALPINI**

»	Responsabile Pianificazione	Firma Ing. Nicola Recchia	Data 02.11.21
---	--------------------------------	------------------------------	------------------

**GASDOTTI
ALPINI**

»	Legale Rappresentante	Firma Sandro Dalla Torre	Data 02.11.21
---	--------------------------	-----------------------------	------------------

**GASDOTTI
ALPINI**

CODICE	IMPIANTO	FASE	TIPO	CAT.	N	R
TR1	TN	F	R	140	005	0

INDICE

1 CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI.....	1
--	---

1 CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Il presente documento ha l'obiettivo di descrivere il cronoprogramma degli interventi del **LOTTO FUNZIONALE 1** del piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di Gasdotti Alpini nel periodo 2021-2030.

La mappa seguente riporta la localizzazione dei principali interventi sul territorio illustrati nel presente Piano.

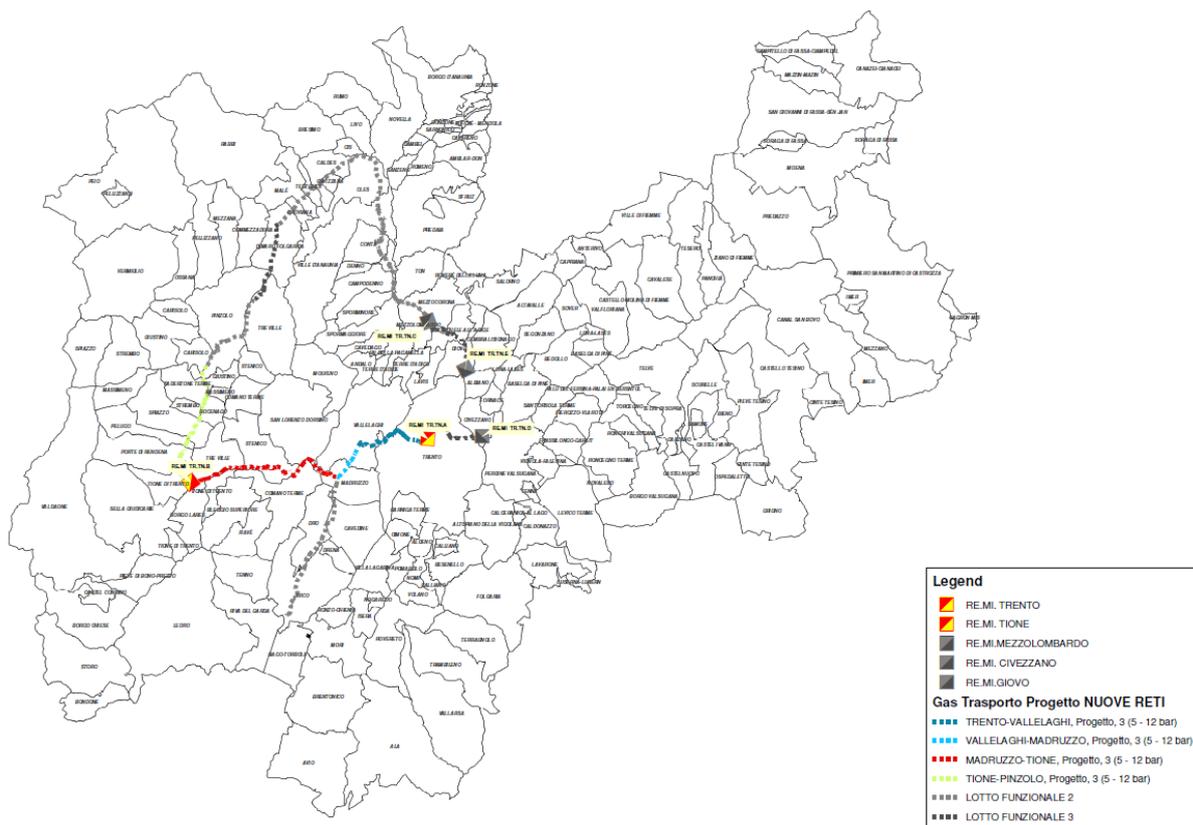


Figura 1 Estratto interventi Piano decennale 2021-2030 LOTTO FUNZIONALE 1

Si allega di seguito una scheda riassuntiva delle varie tratte in cui sono riportate le principali date di inizio e fine dell'intervento. La pianificazione ha tenuto conto della difficoltà di realizzazione delle singole tratte, del possibile numero di squadre da impiegare per cantiere e di una ipotesi di sospensione dei lavori per i periodi invernali e turistici.

COD.	Denominazione	Cronologia Interventi	Data Inizio Lavori	Tempo di realizzazione (gg)	Eventuali sospensioni	Tempo di realizzazione Totale (gg)	Data Fine Lavori
TR1.TN.001	TRENTO-VALLELAGHI	1	01/02/2022	214	30	244	02/10/2022
TR1.TN.002	VALLELAGHI-MADRUZZO	2	04/07/2022	99	10	109	20/10/2022
TR1.TN.003	MADRUZZO-TIONE	3	20/09/2022	381	30	411	04/11/2023
TR1.TN.004	TIONE-PINZOLO	4	21/08/2022	342	90	432	26/10/2023

Tabella 2 Cronoprogramma interventi RETI Piano decennale 2021-2030 LOTTO FUNZIONALE 1

Contestualmente ad alcune tratte è prevista anche la realizzazione di n.2 cabine di riduzione e misura del gas naturale (RE.MI.) come di seguito riportato.

COD.	Denominazione	Data Inizio Lavori	Tempo di realizzazione Totale (gg)	Data Fine Lavori
TR1.TN.A	TRENTO VELA	15/11/2022	180	14/05/2023
TR1.TN.B	TIONE	01/03/2023	90	30/05/2023

Tabella 2 Cronoprogramma interventi RE.MI. Piano decennale 2021-2030 LOTTO FUNZIONALE 1

In particolare:

- l'intervento TR1.TN.A verrà realizzato a valle dell'intervento TR1.TN.01
- l'intervento TR1.TN.B verrà realizzato a valle dell'intervento TR1.TN.02 e contestualmente all'intervento TR1.TN.3

Per un maggior dettaglio si rimanda all'allegato del presente documento.

ALLEGATO CRONOPROGRAMMA

ID	Modalità attività	Note	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Calendario attività	3° trimestre		1° trimestre		3° trimestre		1° trimestre		3° trimestre		1° trimestre	
									lug	ott	gen	apr	lug	ott	gen	apr	lug	ott	gen	apr
1																				
2																				
3		TR.TN.001	TRENTO-VALLELAGHI	327 g	02/08/2021	01/11/2022		Nessuno												
4			Progettazione definitiva/esecutiva	60 g	02/08/2021	30/09/2021		trasporto												
5			Invio e ottenimento autorizzazioni	90 g	01/10/2021	29/12/2021	4	trasporto												
6			Appalto	30 g	30/12/2021	28/01/2022	5	trasporto												
7			Esecuzione lavori	244 g	01/02/2022	02/10/2022		trasporto												
8			Chiusura tecnico contabile	30 g	03/10/2022	01/11/2022	7	trasporto												
9		TR.TN.002	VALLELAGHI-MADRUZZO					Nessuno												
10			Progettazione definitiva/esecutiva	60 g	03/01/2022	03/03/2022		trasporto												
11			Invio autorizzazioni	90 g	04/03/2022	01/06/2022	10	trasporto												
12			Appalto	30 g	02/06/2022	01/07/2022	11	trasporto												
13			Esecuzione lavori	109 g	04/07/2022	20/10/2022		trasporto												
14			Chiusura tecnico contabile	30 g	21/10/2022	19/11/2022	13	trasporto												
15		TR.TN.003	MADRUZZO-TIONE					Nessuno												
16			Progettazione definitiva/esecutiva	60 g	07/02/2022	07/04/2022		trasporto												
17			Invio autorizzazioni	90 g	08/04/2022	06/07/2022	16	trasporto												
18			Appalto	30 g	07/07/2022	05/08/2022	17	trasporto												
19			Esecuzione lavori	411 g	20/09/2022	04/11/2023		trasporto												
20			Chiusura tecnico contabile	30 g	05/11/2023	04/12/2023	19	trasporto												
21		TR.TN.004	TIONE-PINZOLO					Nessuno												
22			Progettazione definitiva/esecutiva	60 g	14/02/2022	14/04/2022		trasporto												
23			Invio autorizzazioni	90 g	15/04/2022	13/07/2022	22	trasporto												
24			Appalto	30 g	14/07/2022	12/08/2022	23	trasporto												
25			Esecuzione lavori	432 g	21/08/2022	26/10/2023		trasporto												
26			Chiusura tecnico contabile	30 g	27/10/2023	25/11/2023	25	trasporto												
27																				
28		TR.TN.A	REMI TRENTO VELA					Nessuno												
29			Progettazione definitiva/esecutiva	60 g	02/05/2022	30/06/2022		trasporto												
30			Invio autorizzazioni	90 g	01/07/2022	28/09/2022	29	trasporto												
31			Appalto	30 g	29/09/2022	28/10/2022	30	trasporto												
32			Esecuzione lavori	180 g	15/11/2022	13/05/2023		trasporto												
33			Chiusura tecnico contabile	30 g	14/05/2023	12/06/2023	32	trasporto												
34		TR.TN.B	REMI DI TIONE					Nessuno												
35			Progettazione definitiva/esecutiva	60 g	01/09/2022	30/10/2022		trasporto												
36			Invio autorizzazioni	90 g	31/10/2022	28/01/2023	35	trasporto												
37			Appalto	30 g	29/01/2023	27/02/2023	36	trasporto												
38			Esecuzione lavori	90 g	01/03/2023	29/05/2023		trasporto												
39			Chiusura tecnico contabile	30 g	30/05/2023	28/06/2023	38	trasporto												

Gasdotti Alpini srl

Via Manzoni, 24 – 38068 ROVERETO (TN)

Tel. +39 0464 456111

E-mail : info@cert.gasdottoalpini.it

www.gasdottialpini.it
