

REGIONE TOSCANA

Provincia di Grosseto (GR)

COMUNE DI MANCIANO



2	EMISSIONE PER ENTI ESTERNI	27/09/21	SIGNORELLO A.	FURNO C.	NASTASI A.
1	EMISSIONE PER ENTI ESTERNI	02/12/20	SIGNORELLO A.	FURNO C.	NASTASI A.
0	EMISSIONE PER COMMENTI	26/11/20	SIGNORELLO A.	FURNO C.	NASTASI A.
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROL.	APPROV.

Committente:

IBERDROLA RENOVABLES ITALIA S.p.A.



Sede legale in Piazzale dell'Industria, 40, 00144, Roma
Partita I.V.A. 06977481008 - PEC: iberdrolarenovablesitalia@pec.it

Società di Progettazione:

Ingegneria & Innovazione



Via Jonica, 16 - Loc. Belvedere - 96100 Siracusa (SR) Tel. 0931.1663409
Web: www.antexgroup.it e-mail: info@antexgroup.it

Progetto:

IMPIANTO FOTOVOLTAICO MANCIANO

Progettista/Resp. Tecnico

Dott. Ing. Giuseppe Basso
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Siracusa
n° 1860 sez. A

Elaborato:

RELAZIONE SULLA DISMISSIONE DELL'IMPIANTO
E RIPRISTINO DEI LUOGHI

Scala:

NA

Nome DIS/FILE:

C20007S05-PD-RT-27-02

Allegato:

1/1

F.to:

A4

Livello:

DEFINITIVO

*Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.*



Sommario

1. Premessa	3
2. Scopo del Documento	4
3. Approntamento del cantiere e dismissione dell'impianto	4
4. Gestione moduli fotovoltaici	4
5. Gestione strutture di sostegno	5
6. Gestione materiale ed apparati elettrici ed elettronici	5
7. Cabine elettriche, pozzetti prefabbricati, piste e piazzole	5
8. Opere di ripristino ambientale	6
9. Opere di copertura e stabilizzazione	7
10. Stima dei tempi necessari alla dismissione e cronoprogramma di dismissione	7
11. Stima dei costi di dismissione	8



REALIZZAZIONE PARCO FOTOVOLTAICO "MANCIANO"
RELAZIONE SULLA DISMISSIONE DELL'IMPIANTO E
RIPRISTINO DEI LUOGHI



27/09/2021

REV: 2

Pag. 3

1. Premessa

Su incarico di Iberdrola Renovables Italia S.p.A., la società ANTEX GROUP Srl ha redatto il progetto definitivo per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare, denominato Impianto Fotovoltaico "Manciano", da realizzarsi nei territori del comune di Manciano (GR) – Regione Toscana.

Il progetto per il quale si richiede la connessione in rete è un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare che prevede di installare 122.226 moduli fotovoltaici bifacciali in silicio monocristallino da 510 Wp ciascuno, su strutture ad inseguimento monoassiale in acciaio zincato a caldo. Tutta l'energia elettrica prodotta verrà ceduta alla rete.

Le attività di progettazione definitiva sono state sviluppate dalla società di ingegneria ANTEX Group Srl.

ANTEX Group Srl è una società che fornisce servizi globali di consulenza e management ad Aziende private ed Enti pubblici che intendono realizzare opere ed investimenti su scala nazionale ed internazionale.

È costituita da selezionati e qualificati professionisti uniti dalla comune esperienza professionale nell'ambito delle consulenze ingegneristiche, tecniche, ambientali, gestionali, legali e di finanza agevolata.

Sia ANTEX che IBERDROLA pongono a fondamento delle attività e delle proprie iniziative, i principi della qualità, dell'ambiente e della sicurezza come espressi dalle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 18001 nelle loro ultime edizioni.

2. Scopo del Documento

Come è noto, ai sensi dell'articolo 12 del d.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387 vige "l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto".

La vita attesa di impianti fotovoltaici è stimata in circa 35 anni senza necessità di rifacimento.

E' evidente, in ragione della prevedibile evoluzione delle tecnologie fotovoltaiche in termini di efficienza dei moduli e della "parity grid" in termini di costi unitari del chilowattora prodotto, potrà esservi la possibilità di un rifacimento e non una dismissione dell'impianto; in questo caso si renderà necessario rimuovere le componenti tecnologiche dell'impianto stesso con la sostituzione, in particolare, dei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, del trasformatore, nonché degli altri apparati elettrici ed elettronici dell'impianto e, se presenti, l'impianto di illuminazione, i sistemi elettronici di allarme e telecontrollo e, forse, per deperimento, la recinzione ed il cancello.

Le linee di connessione elettrica alla rete ed interne all'impianto, nonché ai componenti in materiale cementizio o inerte (cabine, pozzetti, piste, ecc.) hanno una vita stimata in cinquant'anni. Quindi, è verosimile che non ci sarà un fine vita definito per l'impianto, potendo essere rifatto per intero per continuare la sua vita nel tempo e in maniera più efficiente. Comunque ove si decida di smantellarlo per intero e ripristinare lo stato dei luoghi o farne oggetto di rifacimento totale o comunque, durante l'esercizio, per la sostituzione di alcuni componenti tecnologici non più efficienti, si pone sempre il problema della dismissione e della gestione, totale o parziale, dei rifiuti.

3. Approntamento del cantiere e dismissione dell'impianto

A fine vita si procederà prima allo smantellamento dell'impianto e delle strutture accessorie presenti e dopo al ripristino e risistemazione dell'area dell'impianto.

E' previsto l'affidamento a ditta specializzata delle operazioni suddette, con l'apertura di un apposito cantiere.

Si ritiene che l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto comprenda implicitamente anche l'autorizzazione alla messa in ripristino dello stato dei luoghi, previa dismissione dell'impianto medesimo.

Per la costituzione del nuovo cantiere dovrà essere inviata apposita comunicazione alle autorità competenti, indicando le fasi operative, le aree di stoccaggio temporaneo previste e le modalità di gestione dei materiali di risulta (rifiuti speciali) nonché quelle preposte alla sicurezza sui cantieri.

La dismissione prevede lo smantellamento dei moduli fotovoltaici avendo cura di non romperli, vetri in particolare, e di stocarli separatamente dalle strutture di sostegno in metallo.

A questo punto si procederà con la raccolta dei cavi di collegamento e dei necessari scavi per lo scalzamento degli stessi.

La fase successiva prevede la raccolta di tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche per poi passare alla fase di smantellamento di tutte le opere edili prefabbricate e no.

4. Gestione moduli fotovoltaici

I pannelli fotovoltaici verranno gestiti in conformità al D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151 relativo alla gestione dei rifiuti speciali apparecchiature ed apparati elettronici nei quali essi sono compresi (CER: 200136).

In ogni caso, oltre la componentistica elettrica ed elettronica, anche i moduli fotovoltaici rientrano nell'ambito di applicazione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) la cui gestione è disciplinata dalla Direttiva 2012/19/EU.

Si è costituita a livello europeo l'Associazione "PV Cycle", costituita da principali operatori del settore, per la gestione dei pannelli fotovoltaici fine vita utile ed esistono già alcuni impianti di gestione operativi, soprattutto in Germania.

In Italia le imprese del settore stanno muovendo i primi passi.

Per le diverse tipologie di pannelli (c-Si, p-Si, a-Si, CdTe, CIS), si sta mettendo a punto la migliore tecnologia per il recupero e riciclaggio dei materiali, soprattutto del silicio di grado solare o i metalli pregiati.

I moduli fotovoltaici sono costituiti da materiali non pericolosi cioè silicio (che costituisce le celle), il vetro (protezione frontale), fogli di materiale plastico EVA (protezione posteriore) e alluminio (per la cornice).

La composizione in peso di un pannello fotovoltaico a Si cristallino è la seguente: vetro (CER 170202):74,16% (recupero:90%); alluminio (cornici) (CER 170402):10,30%; silicio (celle) (CER 10059) c-Si:3,48% (recupero 90%); Eva (tedlar) (CER 200139):10,75% (recupero 0.0%); altro (ribbon) (CER 170407):2,91% (recupero:95%).

Il recupero complessivo in peso supera l'85%.

I soli strati sottili dei moduli rappresentano il 50-60 per cento del valore dei materiali dell'intera unità.

5. Gestione strutture di sostegno

Le strutture di sostegno sono costituite prevalentemente di metallo. Tutti i materiali di risulta (ferro e acciaio CER 170405, e/o metalli misti 170407) saranno avviati a recupero secondo la normativa vigente.

6. Gestione materiale ed apparati elettrici ed elettronici

Le linee elettriche, i quadri di campo e gli apparati e le strumentazioni elettroniche (inverter, trasformatori, ecc.) delle cabine, gli eventuali impianti di illuminazione e di videosorveglianza saranno rimossi ed avviate al recupero presso società specializzate autorizzate.

La strumentazione e i macchinari ancora funzionanti verranno riutilizzati in altra sede ed i materiali non riutilizzabili, gestiti come rifiuti, saranno anch'essi inviati al recupero presso aziende specializzate, con recupero principalmente di ferro, materiale plastico e rame.

I materiali appartengono a diverse categorie dei codici CER (rottami elettrici ed elettronici quali apparati elettrici ed elettronici (CER: 200136), cavi di rame ricoperti (CER: 170401).

Il recupero è stimato in misura non inferiore all'80% (% superiore per i cavi elettrici).

7. Cabine elettriche, pozzetti prefabbricati, piste e piazzole

Le strutture prefabbricate delle cabine e dei pozzetti dei cavidotti, degli eventuali plinti dei pali di illuminazione e di sostegno dei paletti di recinzione e del cancello di ingresso, saranno rimosse, così come il rilevato costituito dai materiali inerti delle piste e piazzole e dell'area di accesso.

Tutti i materiali di risulta verranno avviati a recupero presso ditte esterne specializzate, saranno prodotti principalmente i seguenti rifiuti:

- materiali edili (170101, 170102, 170103, 170107)
- ferro e acciaio (170405).

La rete di recinzione in maglia metallica, ove prevista, i paletti di sostegno e il cancello di accesso, i pali di illuminazione trattandosi di strutture totalmente amovibili, saranno rimosse ripristinando lo stato originario dei luoghi.

Anche questi materiali verranno avviati a recupero presso ditte esterne specializzate, saranno prodotti rottami ferrosi (cancello, recinzione, pali di sostegno rete recinzione e pali illuminazione) (CER 170405).

8. Opere di ripristino ambientale

Terminate le operazioni di smobilizzo delle componenti l'impianto, nei casi in cui il sito non verrà più interessato da nuovi impianti o potenziamenti, si provvederà a riportare tutte le superfici interessate allo stato ante operam.

Quindi le superfici occupate dalle pannellature e dalle cabine, le strade di servizio all'impianto ed eventuali opere di regimentazione acque, una volta ripulite verranno ricoperte con uno strato di terreno vegetale di nuovo apporto e operata l'idro-semina di essenze autoctone o, nel caso di terreno precedentemente coltivato, a restituito alla funzione originaria.

Le attività di smontaggio producono le stesse problematiche della fase di costruzione: emissioni di polveri prodotte dagli scavi, dalla movimentazione di materiali sfusi, dalla circolazione dei veicoli di trasporto su strade sterrate, disturbi provocati dal rumore del cantiere e del traffico dei mezzi pesanti. Pertanto, saranno riproposte tutte le soluzioni e gli accorgimenti tecnici già adottati nella fase di costruzione e riportati nella relazione di progetto contenente gli studi ambientali.


Vista la natura dei luoghi, la morfologia e tipologia del terreno non sono previsti particolari interventi di stabilizzazione e di consolidamento ad eccezione di piccoli interventi di inerbimento mediante semina a spaglio o idro-semina di specie erbacee delle fitocenosi locali, a trapianti delle zolle e del cotico erboso nel caso in cui queste erano state in precedenza prelevate o ad impianto di specie vegetali ed arboree scelte in accordo con le associazioni vegetali rilevate. Le opere di ripristino possono essere estese a tutti gli interventi che consentono una maggiore conservazione degli ecosistemi ed una maggiore integrazione con l'ambiente naturale.

Difatti le operazioni di ripristino possono consentire, attraverso una efficace minimizzazione degli impatti, la conservazione degli habitat naturali presenti. Le opere di ripristino degli impianti fotovoltaici, si riferiscono essenzialmente al rinverdimento e al consolidamento delle superfici sottratte per la realizzazione dei percorsi e delle aree necessarie alla realizzazione dell'impianto.

Il concetto generale è quello di impiegare il più possibile tecnologie e materiali naturali, ricorrendo a soluzioni artificiali solo nei casi di necessità strutturale e/o funzionale. Deve comunque essere adottata la tecnologia meno complessa e a minor livello di energia (complessità, tecnicismo, artificialità, rigidità, costo) a pari risultato funzionale e biologico.

9. Opere di copertura e stabilizzazione

Le opere di copertura consistono nella semina di specie erbacee per proteggere il suolo dall'erosione superficiale, dalle acque di dilavamento e dall'azione dei vari agenti meteorologici, ripristinando la copertura vegetale. Sono interventi spesso integrati da interventi stabilizzanti. Le principali opere di copertura sono: le semine a spaglio, le idro-semine, le semine a spessore, le semine su reti o stuoie, le semine con coltre protettiva (paglia, fieno ecc.). Di seguito ne vengono schematizzati alcuni a seconda del dislivello da stabilizzare:

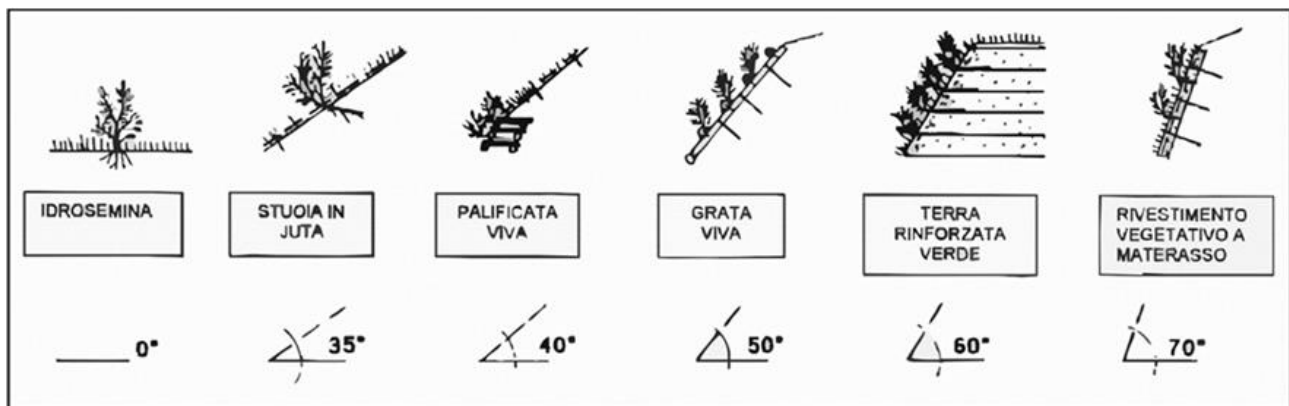

Nel caso in oggetto si considera un'area praticamente piatta.

10. Stima dei tempi necessari alla dismissione e cronoprogramma di dismissione

Si prevede che le operazioni di dismissione a fine vita impiegheranno circa 178 giorni lavorativi come stimato al crono programma seguente. Per durata delle operazioni di dismissione si intende l'esecuzione di tutte le attività di smantellamento fino alla pulizia delle aree temporanee di stoccaggio dei materiali.

Evento	Inizio [giorno]	Fine [giorno]	Durata [gg]	operai richiesti	Uomini giorno
Allestimento aree di stoccaggio, messa in sicurezza dell'area di dismissione	0	6	6	5	30
Smontaggio dei moduli fotovoltaici	6	24	18	15	270
Sfilamento cavi e cablaggi	24	38	14	11	182
Dismissione quadri di campo e parallelo cc	38	42	4	5	20
Dismissione cavidotti e pozzetti	42	44	2	5	10
Smontaggio delle strutture di supporto ed estrazione pali/viti	44	96	52	20	1040
Dismissione impianto di illuminazione	96	106	10	9	92
Dismissione impianto antifurto	106	117	11	5	55
Dismissione cabine elettriche, separazione dei rifiuti elettronici da quelli edili	117	130	13	7	91
Smantellamento recinzione	130	137	7	5	35
Smantellamento viabilità e piazzole, stesura terreno vegetale ed inerbimento	137	170	33	5	165

Selezione dei rifiuti ed avvio al riciclaggio, al riuso o a discarica	170	174	4	5	20
Pulizia delle aree di stoccaggio e chiusura del cantiere di dismissione	174	178	4	3	12
				totale uomini giorno	2022
				max operai in cantiere (contemporanei)	20
				durata attesa del cantiere (gg lavorativi)	178

11. Stima dei costi di dismissione

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Supercapitolo - 1. DISMISSIONE PARCO FOTOVOLTAICO MANCIANO Capitolo - 001 SICUREZZA SPECIALE Sottocapitolo -							
1 Dism.01F V (M)	Allestimento di cantiere temporaneo per gli interventi di dismissione del Parco Fotovoltaico e di tutti le opere connesse sia fuori che sotto terra, comprese le operazioni di rimozione di impianti, la macro attività comprende la fornitura ed il nolo per tutto il tempo necessario di barrecche, servizi igienici, locali di direzione completi di attrezzature informatiche e mobilia necessaria, mezzi speciali e quant'altro necessario e indicato nei piani di sicurezza e nel progetto di organizzazione del cantiere o richiesto dall'ufficio di direzione lavori a supporto degli interventi e sempre in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs 81/08. S'intende compresa nel costo la successiva dismissione dell'area e ripristino dello stato "ante operam", incluso i trasporti ed il conferimento in discarica di tutti i materiali di risulta.							
	Cantiere temporaneo opere di dimissione	1,000				1,00		
	Sommano (corpo)					1,00	19.839,97 €	19.839,97 €

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Supercapitolo - 1. DISMISSIONE PARCO FOTOVOLTAICO MANCIANO Capitolo - 002 SCAVI, SBANCAMENTI INFRASTRUTTURE Sottocapitolo - 1.2.1.							
2 Dism.07F V (M)	Demolizione e rimozione di opere di fondazione in calcestruzzo armato di qualunque forma e dimensione, eseguito con mezzo meccanico, compreso il carico del materiale sul cassone di raccolta ed il conferimento presso discarica autorizzata, per tutte le opere poste sopra o sotto il piano di campagna, incluso quota parte di scavo e ricolmo con terreno di scavo, ad esclusione della fornitura e posa in opera di terreno vegetale computato in altra voce. Demolizione fondazioni Cabine Elettriche Rimozione plinti illuminazione	12,000 84,000	12,200 1,000	2,500 1,000	0,400 1,000	146,40 84,00		
	Sommano (mc)					230,40	337,94 €	77.861,38 €
3 DS01 (M)	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere RIMOZIONE RILEVATO STRADALE E FONDAZIONE (spessore di progetto 30 cm finito) Strade Perimetrali al parco lungh. 7280 ml (sede di carreggiata + scolo acque + cavidotti largh. 8.8 ml) Strada interna (sede carreggiata largh. 5,00 + zanelle ml)		7280,000 966,000	8,800 6,000	0,300 0,300	0,00 19219,20 1738,80		
	Sommano (m³)					20958,00	4,47 €	93.682,26 €
4 Dism.11F V (M)	Rimozione di teli impermeabili/tessuti, posti sul terreno per opere di drenaggio o consolidamento, accatastamento nell'area di cantiere, carico sul cassone di raccolta, escluso trasporto e conferimento presso discarica autorizzata al recupero di materiali speciali. Rimozione di Geocell Rimozione di Geotextile				78340,000 78340,000	78340,00 78340,00		
	Sommano (mq)					156680,00	0,80 €	125.344,00 €
	Supercapitolo - 1. DISMISSIONE PARCO FOTOVOLTAICO MANCIANO Capitolo - 003 DISMISSIONE CAVI E CAVIDOTTI Sottocapitolo - 1.3.1.							
5 Dism.10F V (M)	Rimozione di Cavidotto e cavi (cavo a fibra ottica e terna), compresa la rimozione per il successivo smaltimento del nastro di segnalazione e della piastra di protezione. Il costo comprende lo scavo a sezione obbligata, il recupero dei materiali da rifiuto, il tiraggio dei cavi, sono esclusi dalla voce il ricolmo del terreno da computare in altra voce. Sono compresi i costi per il carico sul cassone di raccolta e il trasporto presso area di deposito interna al cantiere o in zona esterna predisposta per il successivo conferimento presso centro autorizzato allo smaltimento e recupero dei materiali riciclabili. Cavidotto Interno Parco M.T. (Lu=1735+3594+92+222+120+132+209+451+800) Cavidotto Esterno Parco M.T.		7355,000 3900,000			7355,00 3900,00		

Numero e codice	Descrizione	MISURE			Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.			
	Sommano (ml)				11255,00	28,98 €	326.169,90 €
6 DS04 (M)	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.						
	CAVIDOTTO Tipo A 400x1200 - n.1 tema				0,00		
	Tratto Cabina Centrale - diramazione a tre terne sotto CS4		1735,000	0,400	1,000	694,00	
	Tratto diramazione due terne sotto CSG e ritorno		3594,000	0,400	1,000	1437,60	
	CAVIDOTTO Tipo B 600x1200 - n.2 Terne				0,00		
	Tratto CS8		92,000	0,600	1,000	55,20	
	Tratto CS7		222,000	0,600	1,000	133,20	
	Tratto CS9		120,000	0,600	1,000	72,00	
	Tratto CS10		132,000	0,600	1,000	79,20	
	Tratto CS1		209,000	0,600	1,000	125,40	
	Ramo perimetrale da CS4 a CS5		451,000	0,600	1,000	270,60	
	CAVIDOTTO Tipo C 1000x1200 - n.4 terne				0,00		
	Tratto perimetrale da Cabina centrale a CS4		800,000	1,000	1,000	800,00	
	CAVIDOTTO ESTERNO PARCO				0,00		
	CAVIDOTTO Tipo D 1300x1200 - n.4 terne				0,00		
	Cabina Centrale - SSU		3900,000	1,300	1,000	5070,00	
	CAVIDOTTO Tipo A 400x1200 - n.1 tema				0,00		
	Tratto Cabina Centrale - diramazione a tre terne sotto CS4		1735,000	0,400	1,000	694,00	
	Tratto diramazione due terne sotto CSG e ritorno		3594,000	0,400	1,000	1437,60	
	CAVIDOTTO Tipo B 600x1200 - n.2 Terne				0,00		
	Tratto CS8		92,000	0,600	1,000	55,20	
	Tratto CS7		222,000	0,600	1,000	133,20	
	Tratto CS9		120,000	0,600	1,000	72,00	
	Tratto CS10		132,000	0,600	1,000	79,20	
	Tratto CS1		209,000	0,600	1,000	125,40	
	Ramo perimetrale da CS4 a CS5		451,000	0,600	1,000	270,60	
	CAVIDOTTO Tipo C 1000x1200 - n.4 terne				0,00		
	Tratto perimetrale da Cabina centrale a CS4		800,000	1,000	1,000	800,00	
	CAVIDOTTO ESTERNO PARCO				0,00		
	CAVIDOTTO Tipo D 1300x1200 - n.4 terne				0,00		
	Cabina Centrale - SSU		3900,000	1,300	1,000	5070,00	
	Sommano (m³)				17474,40	3,23 €	56.442,31 €
	Supercapitolo - 1. DISMISSIONE PARCO FOTOVOLTAICO MANCIANO						
	Capitolo - 004 DISMISSIONE SISTEMI ACCESSORI E RECINZIONE						
	Sottocapitolo - 1.4.1.						
7 Dism.11F V (M)	Sfilaggio cavi elettrici e trasporto presso ditta specializzata per il suo smaltimento e riuso. Sono compresi tutti gli oneri necessari per il carico ed il trasporto presso ditta autorizzata.						
	Sfilaggio illuminazione esterna		7280,000			7280,00	
	sfilaggio rete videosorveglianza		7280,000			7280,00	
	Sommano (mq)				14560,00	0,80 €	11.648,00 €
8 Dism.12F V (M)	Rimozione di opere in ferro. Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. compreso accatastamento all'interno dell'area di cantiere, carico del materiale sul cassone di raccolta ad esclusione del trasporto e conferimento presso discarica autorizzata per rifiuti speciali riciclabili.						
	Cancello carrabile				700,000	700,00	
	pedonale				250,000	250,00	

Numero e codice	Descrizione	MISURE			Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.			
	Recinzione peso medio ml 25 kg/ml		7280,000		25,000	182000,00	
	Sommano (kg)					182950,00	0,25 € 45.737,50 €
9 Dism.17 FV (M)	Smontaggio sistemi accessori (antifurto, illuminazione, LPS), dismissione e pulizia delle aree temporanee di stoccaggio. Sono esclusi fondazioni, scavi e demolizioni, svilaggio di cavi, computati in altra voce.	1,000				1,00	
	Sommano (corpo)					1,00	30.000,00 € 30.000,00 €
	Supercapitolo - 1. DISMISSIONE PARCO FOTOVOLTAICO MANCIANO Capitolo - 005 TRASPORTO A RIFIUTO Sottocapitolo - 1.5.1.						
10 DS09 (M)	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento RIMOZIONE RILEVATO STRADALE E FONDAZIONE					0,00 20958,00	
	Sommano (m³)					20958,00	16,05 € 336.375,90 €
	Supercapitolo - 1. DISMISSIONE PARCO FOTOVOLTAICO MANCIANO Capitolo - 006 DISMISSIONE LOCALI TECNICI, APARECCHIATURE ELETTRICHE, PANNELLI Sottocapitolo - 1.6.1.						
11 Dism.13F V (M)	Rimozione dei locali tecnici (cabine di sottocampo e cabine primarie). prefabbricato e trasporto presso deposito per la rigenerazione degli stessi e la successiva rimessa in opera presso altro sito. Sono compresi tutti gli oneri necessari per il carico ed il trasporto presso ditta autorizzata.	12,000				12,00	
	Sommano (cad)					12,00	1.000,00 € 12.000,00 €
12 Dism.14F V (M)	Smontaggio apparecchiature elettriche quali quadri di parallelo in c.c., quadri elettrici in c.a., quadri di media tensione, inverter e trasformatore e trasporto a ditta specializzata per lo smaltimento. Sono compresi tutti gli oneri necessari per lo smontaggio e lo smaltimento presso ditta autorizzata. QUADRI DA CAMPO						
	Quadri da Campo	200,000				200,00	
	Sommano (cad)					200,00	100,00 € 20.000,00 €
13 Dism.15F V (M)	Smontaggio apparecchiature elettriche quali quadri di parallelo in c.c., quadri elettrici in c.a., quadri di media tensione, inverter e trasformatore e trasporto a ditta specializzata per lo smaltimento. Sono compresi tutti gli oneri necessari per lo smontaggio e lo smaltimento presso ditta autorizzata. INVERTER						
	Inverter	40,000				40,00	

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Sommano (cad)					40,00	1.500,00 €	60.000,00 €
14 Dism.16F V (M)	Smontaggio apparecchiature elettriche quali quadri di parallelo in c.c., quadri elettrici in c.a., quadri di media tensione, inverter e trasformatore e trasporto a ditta specializzata per lo smaltimento. Sono compresi tutti gli oneri necessari per lo smontaggio e lo smaltimento presso ditta autorizzata. TRASFORMATORI bt/MT							
	Trasformatori	12,000				12,00		
	Sommano (cad)					12,00	2.000,00 €	24.000,00 €
15 Dism.18F V (M)	Smontaggio pannelli fotovoltaici e delle strutture di supporto con idonei mezzi meccanici quali gru semovente con ventose ed accatastamento in area dedicata del cantiere, estrazione delle strutture dal terreno, smontaggio e/o tagli, rimozione delle parti elettriche di movimento, distacco dei cablaggi. Sono comprese opere di protezione degli stessi dagli agenti atmosferici in attesa del ritiro da parte di ditte specializzate ed il conseguente smaltimento e tutti gli oneri necessari per lo smontaggio, il deposito presso il cantiere ed il trasporto a centri specializzati per la rigenerazione.							
	smontaggio impianto FV				62335,260	62335,26		
	Sommano (kW)					62335,26	15,00 €	935.028,90 €
	Supercapitolo - 1. DISMISSIONE PARCO FOTOVOLTAICO MANCIANO							
	Capitolo - 007 RIPRISTINO DEI LUOGHI							
	Sottocapitolo - 1.7.1.							
16 Terr.Veg. 01 (M)	Fornitura e posa in opera con mezzo idoneo di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate o riempimento di avvalamento. Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, a qualsiasi distanza e miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.							
	Ricollocazione di terreno su sbancamento strade e cabine					0,00		
	Ricolmo strade interne				20958,000	20958,00		
	Ricolmo area cabine	12,000	12,200	2,500	0,500	183,00		
	Sommano (mc)					21141,00	30,00 €	634.230,00 €
	(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo							2.788.520,15 €

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE								
	Totale Lavorazioni							2.788.520,15 €
	Totale Sicurezza Speciale							19.839,97 €
	Totale progetto							2.808.360,12 €
QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI								
	1. DISMISSIONE PARCO FOTOVOLTAICO MANCIANO							
	001 SICUREZZA SPECIALE ---							19.839,97 €
	002 SCAVI, SBANCAMENTI INFRASTRUTTURE							296.887,64 €
	003 DISMISSIONE CAVI E CAVIDOTTI							382.612,21 €
	004 DISMISSIONE SISTEMI ACCESSORI E RECINZIONE							87.385,50 €
	005 TRASPORTO A RIFIUTO							336.375,90 €
	006 DISMISSIONE LOCALI TECNICI, APARECCHIATURE ELETTRICHE, PANNELLI							1.051.028,90 €
	007 RIPRISTINO DEI LUOGHI							634.230,00 €
	Totale Capitolo 1. DISMISSIONE PARCO FOTOVOLTAICO MANCIANO €							2.808.360,12 €

DISMISSIONE IMPIANTO MANCIANO

Distribuzione per 'Capitolo'

