

REGIONE VENETO PROVINCIA DI VENEZIA COMUNE DI VIGASIO

Impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di energia elettrica, con sistema di accumulo (energy storage system), sito nel Comune di Vigasio (VR) in località Via delle Robinie ex lottizzazione Green Village, avente potenza nominale di 22040 kW e potenza richiesta in immissione di 17970 kW alla tensione rete 20 kV, comprensivo delle opere di rete per la connessione ricadenti nel medesimo Comune di Vigasio (VR)

PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE COMPRESIVO DELLE OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

DATA: Luglio 2021

SCALA : --

PROPONENTE NextPower Development Italia S.r.l.
Via San Marco n° 21, 20121 Milano (MI)
Partita IVA 11091860962
PEC: npditalia@legalmail.it

NextPower Development Italia S.r.l.
Via San Marco, 21
20121 Milano
P. IVA - C. F. 11091860962

ELABORATO DA:

Entrope Srl
Dott. Sc. Amb. Enrico Forcucci
Via per Vittorito Zona PIP
65026 Popoli (PE)
Tel/Fax 085986763
PIVA 01819520683



Arch. Pasqualino Grifone
Villaggio UNRRA 44
66023 - Francavilla al Mare



revisione


descrizione

A

B

C

IMP
34

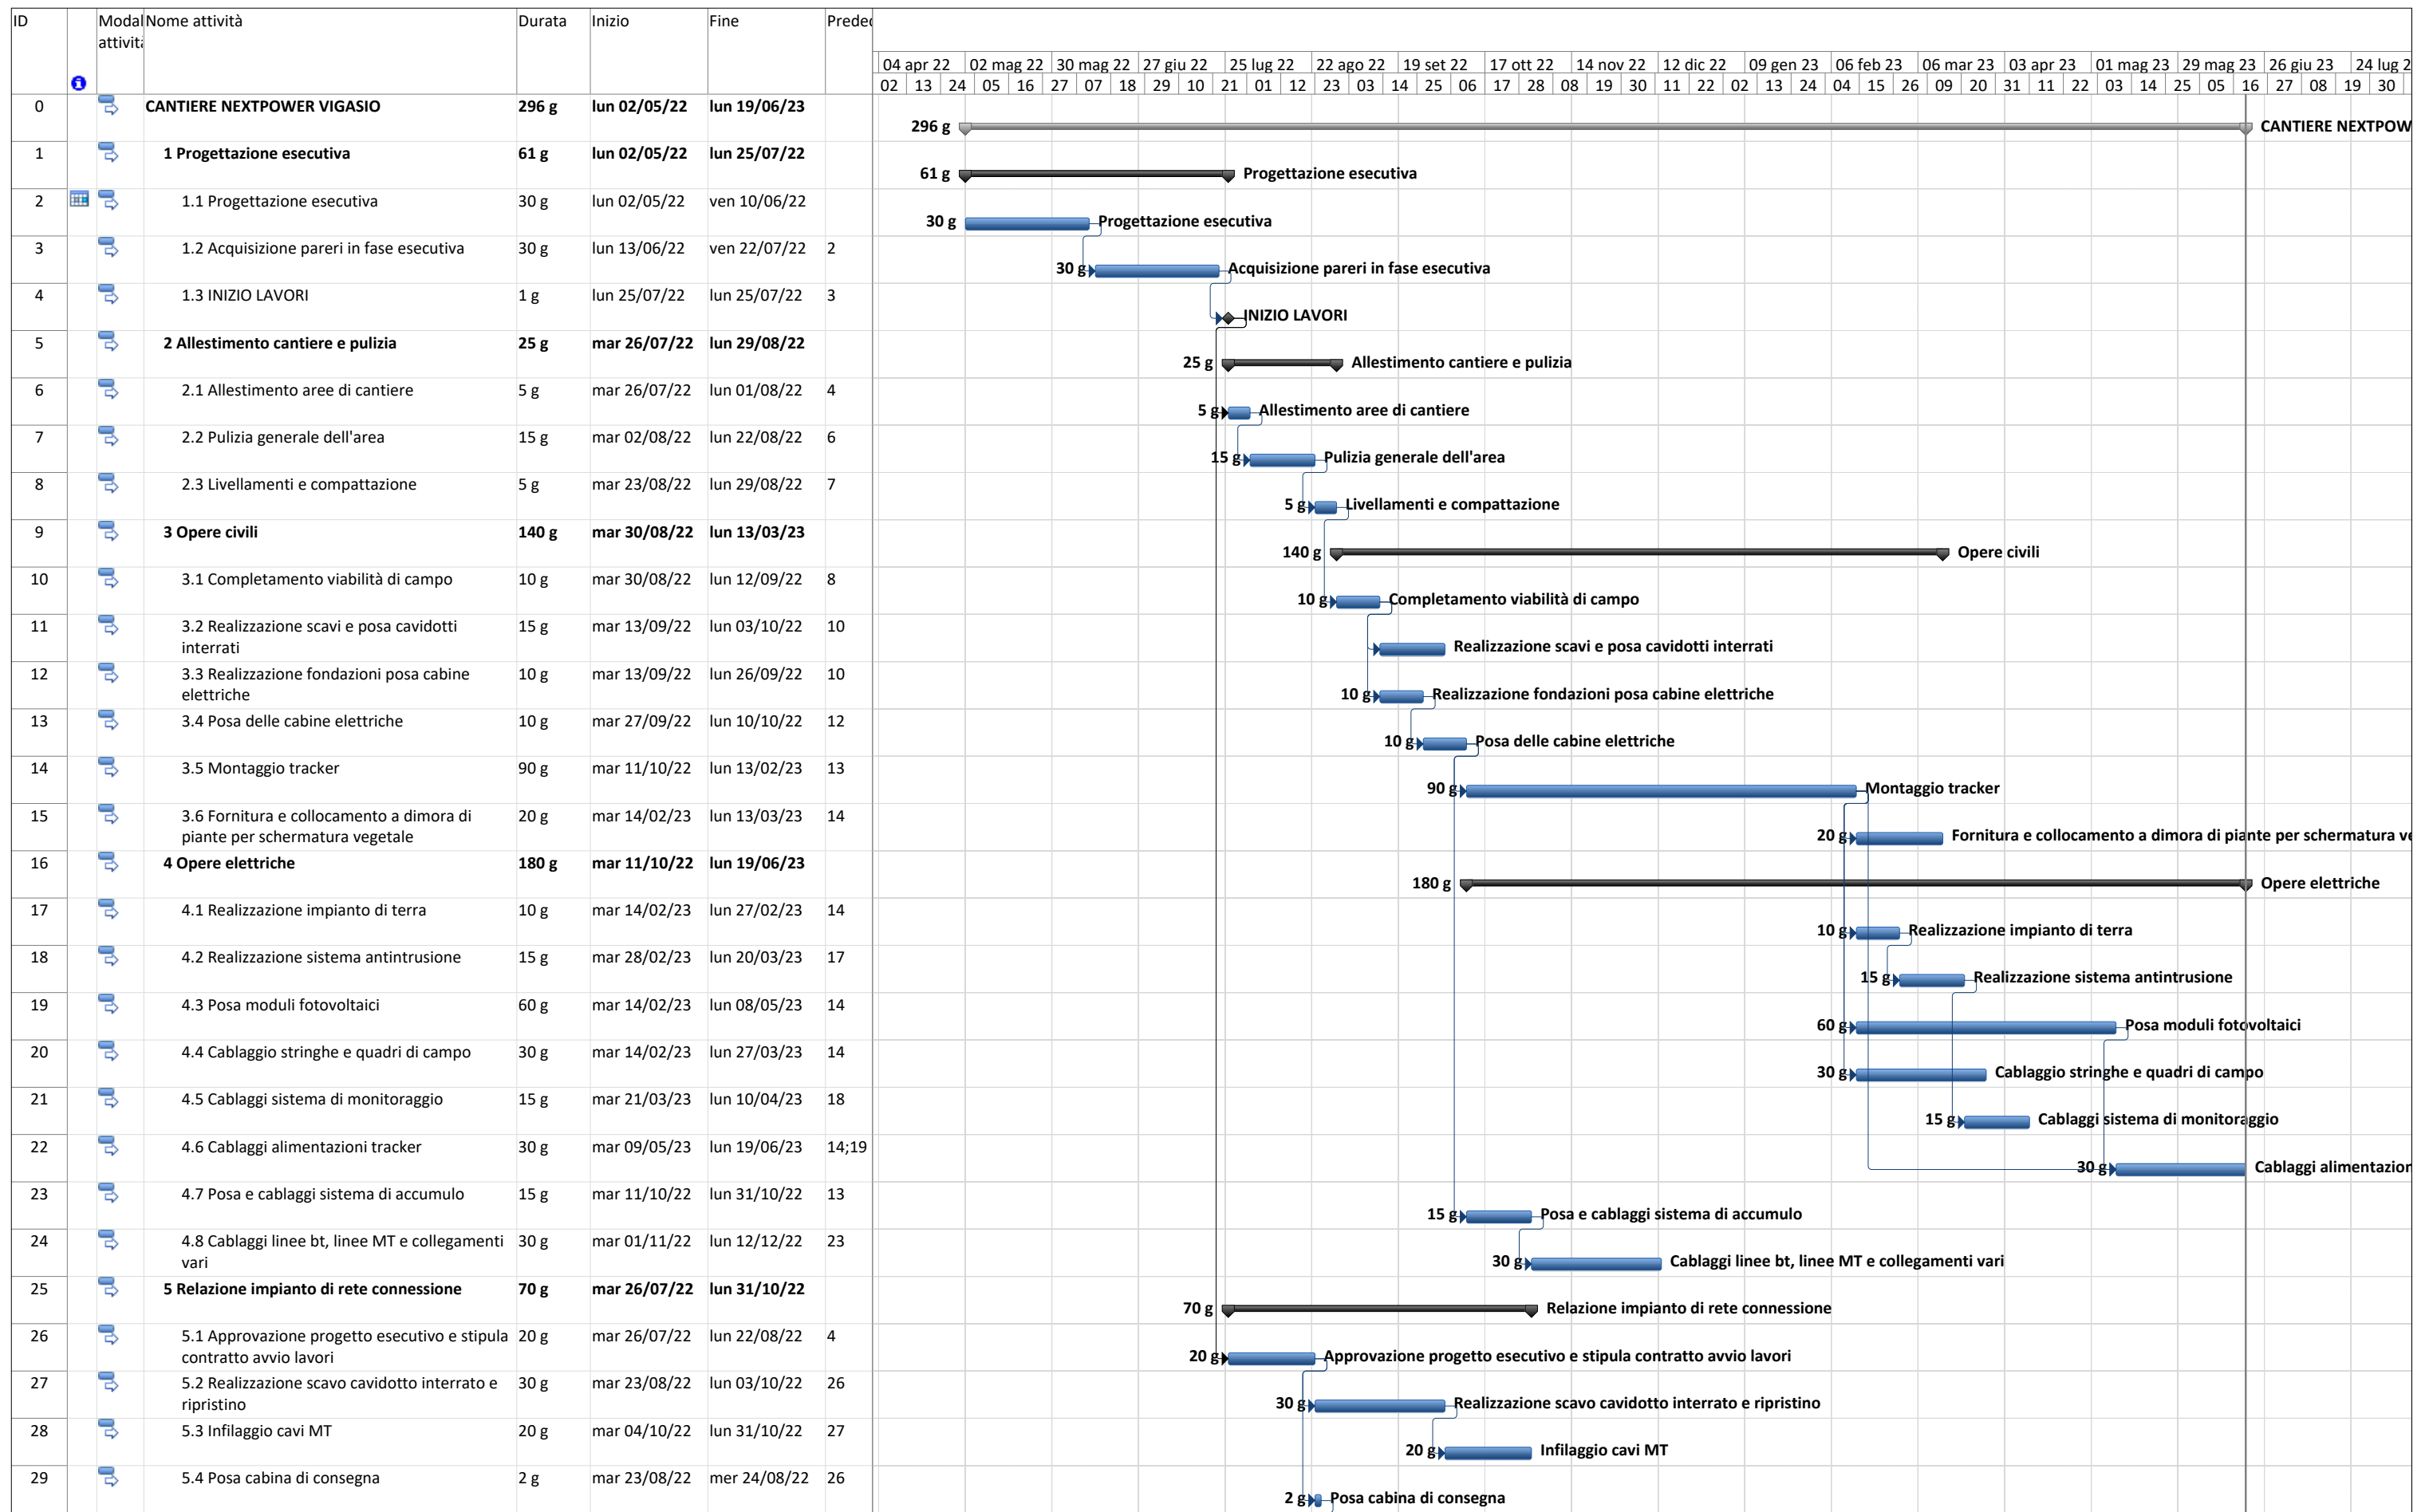

Progetto: CANTIERE NEXTPOWER
Data: ven 02/07/21

Attività		Riepilogo		Cardine esterno		Riepilogo inattiva		Attività manuale		Riepilogo manuale		Scadenza	
Divisione		Riepilogo progetto		Attività inattiva		Attività inattiva		Solo-durata		Solo inizio		Avanzamento	
Cardine		Attività esterne		Cardine inattiva		Solo-durata		Solo-durata		Solo inizio		Avanzamento	

ID	Modal attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Preced	Gantt Chart Dates																																														
							04 apr 22			02 mag 22			30 mag 22			27 giu 22			25 lug 22			22 ago 22			19 set 22			17 ott 22			14 nov 22			12 dic 22			09 gen 23			06 feb 23			06 mar 23			03 apr 23			01 mag 23			29 mag 23	
30		5.5 Allestimento elettromeccanico cabina di consegna	15 g	gio 25/08/22	mer 14/09/22	29																																															
31		5.6 Collegamenti elettrici ed impianto di terra	10 g	gio 15/09/22	mer 28/09/22	30																																															
32		6 Collaudi e consegna lavori	40 g	gio 29/09/22	mer 23/11/22																																																
33		6.1 Regolazioni e collaudo impianto di rete connessione	10 g	gio 29/09/22	mer 12/10/22	31																																															
34		6.2 Verbale finale e consegna lavori impianto di rete	5 g	gio 13/10/22	mer 19/10/22	33																																															
35		6.3 Cessione impianto di rete al distributore	15 g	gio 20/10/22	mer 09/11/22	34																																															
36		6.4 Regolazioni e collaudo impianto di produzione	5 g	gio 10/11/22	mer 16/11/22	35																																															
37		6.5 Verbale finale e consegna lavori impianto ftv	5 g	gio 17/11/22	mer 23/11/22	36																																															
38		7 MESSA IN ESERCIZIO	1 g	gio 24/11/22	gio 24/11/22	37;35																																															

Progetto: CANTIERE NEXTPOWER
Data: ven 02/07/21

Attività		Riepilogo		Cardine esterno		Riepilogo inattiva		Riporto riepilogo manuale		Solo-fine	
Divisione		Riepilogo progetto		Attività inattiva		Attività manuale		Riepilogo manuale		Scadenza	
Cardine		Attività esterne		Cardine inattiva		Solo-durata		Solo inizio		Avanzamento	
