

Impianto agro-fotovoltaico "Corigliano d'Otranto" Comune di Corigliano d'Otranto (LE)

Proponente



SORGENIA RENEWABLES S.r.l
Via Algardi, 4 – 20148 Milano
tel. 02 671941 – fax 02 67194210
<http://www.sorgenia.it>
sorgeniarenewables@sorgenia.it
PEC.sorgenia.renewables@legalmail.it



CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTA



Tiemes Srl
Via Sangiorgio 15- 20145 Milano
tel. 024983104/ fax. 0249631510
pec: info@pec.tiemes.it
www.tiemes.it


Rev.	Data emissione	Descrizione	Preparato	Approvato		
0	16.04.2021	Prima emissione	LM	VDA		
Origine File: 18014.CDO.AU.D.02.00 – Cronoprogramma		CODICE				
		Commessa	Proc	Tipo doc	Num	Rev
		18014	CDO	AU	D	02
Proprietà e diritti del presente documento sono riservati – la riproduzione è vietata / Ownership and copyright are reserved – reproduction is strictly forbidden						

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Timeline (2023-2024)											
1	1 attività owner	6 g	ven 01/07/22	ven 08/07/22		1.1 permesso a costruire											
2	1.1 permesso a costruire	1 g	ven 01/07/22	ven 01/07/22		1.1.1 esito positivo AU											
3	1.1.1 esito positivo AU	1 g	ven 01/07/22	ven 01/07/22		1.2 Due Diligence											
4	1.2 Due Diligence	5 g	lun 04/07/22	ven 08/07/22	3	1.2.1 DD Legale											
5	1.2.1 DD Legale	5 g	lun 04/07/22	ven 08/07/22		1.2.2 DD Corporative											
6	1.2.2 DD Corporative	5 g	lun 04/07/22	ven 08/07/22		1.2.3 DD amministrativo											
7	1.2.3 DD amministrativo	5 g	lun 04/07/22	ven 08/07/22		1.2.4 DD Tecnico											
8	1.2.4 DD Tecnico	5 g	lun 04/07/22	ven 08/07/22		2 Attività EPC											
9	2 Attività EPC	224 g	lun 04/07/22	gio 11/05/23		2.1 Progettazione											
10	2.1 Progettazione	25 g	lun 04/07/22	ven 05/08/22	3	2.1.1 Pull out test											
11	2.1.1 Pull out test	10 g	lun 04/07/22	ven 15/07/22		2.1.2 Progetto esecutivo impianto fotovoltaico											
12	2.1.2 Progetto esecutivo impianto fotovoltaico	15 g	lun 18/07/22	ven 05/08/22	11	2.1.3 Progetto esecutivo di connessione											
13	2.1.3 Progetto esecutivo di connessione	15 g	lun 18/07/22	ven 05/08/22	11	2.2 Procurement incluso consegna in sito											
14	2.2 Procurement incluso consegna in sito	60 g	lun 08/08/22	ven 28/10/22	12	2.2.1 Moduli											
15	2.2.1 Moduli	45 g	lun 08/08/22	ven 07/10/22		2.2.2 Fondazioni tracker											
16	2.2.2 Fondazioni tracker	25 g	lun 08/08/22	ven 09/09/22		2.2.3 Strutture tracker											
17	2.2.3 Strutture tracker	35 g	lun 08/08/22	ven 23/09/22		2.2.4 Inverters											
18	2.2.4 Inverters	50 g	lun 08/08/22	ven 14/10/22		2.2.5 Stazioni MT											
19	2.2.5 Stazioni MT	55 g	lun 08/08/22	ven 21/10/22		2.2.6 Cabina di consegna - Utente											
20	2.2.6 Cabina di consegna - Utente	60 g	lun 08/08/22	ven 28/10/22		2.2.7 Silos											
21	2.2.7 Silos	60 g	lun 08/08/22	ven 28/10/22		2.2.8 Laboratorio cereali											
22	2.2.8 Laboratorio cereali	60 g	lun 08/08/22	ven 28/10/22		2.2.9 Cavi											
23	2.2.9 Cavi	60 g	lun 08/08/22	ven 28/10/22		2.2.10 Recinzione e cancelli											
24	2.2.10 Recinzione e cancelli	15 g	lun 08/08/22	ven 26/08/22		2.2.11 Sistema di monitoraggio											
25	2.2.11 Sistema di monitoraggio	30 g	lun 08/08/22	ven 16/09/22		2.2.12 Sistema di sicurezza - TVCC											
26	2.2.12 Sistema di sicurezza - TVCC	30 g	lun 08/08/22	ven 16/09/22		2.2.13 Cabina di consegna - DSO											
27	2.2.13 Cabina di consegna - DSO	60 g	lun 08/08/22	ven 28/10/22		2.2.14 Altri materiali per la connessione											
28	2.2.14 Altri materiali per la connessione	40 g	lun 08/08/22	ven 30/09/22		2.3 Installazione del cantiere											
29	2.3 Installazione del cantiere	15 g	lun 31/10/22	ven 18/11/22	14	2.3.1 Installazione del cantiere											
30	2.3.1 Installazione del cantiere	1 g	lun 31/10/22	lun 31/10/22		2.3.2 Attività di tracciamento											
31	2.3.2 Attività di tracciamento	5 g	lun 31/10/22	ven 04/11/22		2.3.3 Pulizia del sito											
32	2.3.3 Pulizia del sito	15 g	lun 31/10/22	ven 18/11/22		2.4 Costruzione dell'impianto agro-fotovoltaico											
33	2.4 Costruzione dell'impianto agro-fotovoltaico	124 g	lun 21/11/22	gio 11/05/23	29	2.4.1 Opere civili											
34	2.4.1 Opere civili	20 g	lun 21/11/22	ven 16/12/22													

Progetto: Simple Project Plan
Data: lun 20/09/21

Attività		Riepilogo		Cardine inattiva		Solo-durata		Solo inizio		Cardine esterno		Avanzamento manuale	
Divisione		Riepilogo progetto		Riepilogo inattiva		Riporto riepilogo manuale		Solo-fine		Scadenza			
Cardine		Attività inattiva		Attività manuale		Riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento			

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	T2	T3	T4	2023	T1	T2	T3	T4	2024
35	2.4.1.1 Recnizione e cancelli	20 g	lun 21/11/22	ven 16/12/22										
36	2.4.1.2 Strada temporanea	10 g	lun 21/11/22	ven 02/12/22										
37	2.4.1.3 Strada definitiva	10 g	lun 21/11/22	ven 02/12/22										
38	2.4.1.4 Fondazioni cabine e laboratorio	15 g	lun 21/11/22	ven 09/12/22										
39	2.4.1.5 Posa cabine, laboratorio e silos	15 g	lun 21/11/22	ven 09/12/22										
40	2.4.2 Lavori meccanici	65 g	lun 19/12/22	ven 17/03/23	35									
41	2.4.2.1 Installazione fondazioni tracker	20 g	lun 19/12/22	ven 13/01/23										
42	2.4.2.2 Installazione strutture tracker	20 g	lun 16/01/23	ven 10/02/23	41									
43	2.4.2.3 Montaggio moduli	25 g	lun 13/02/23	ven 17/03/23	42									
44	2.4.3 Lavori elettrici	71 g	lun 19/12/22	lun 27/03/23	35									
45	2.4.3.1 Scavi BT e MT	45 g	lun 19/12/22	ven 17/02/23										
46	2.4.3.2 Impianto di terra	45 g	lun 19/12/22	ven 17/02/23										
47	2.4.3.3 Installazione inverters	35 g	lun 19/12/22	ven 03/02/23										
48	2.4.3.4 Installazione stazioni MT	20 g	lun 19/12/22	ven 13/01/23										
49	2.4.3.5 Installazione cabina di consegna - Utente	10 g	lun 19/12/22	ven 30/12/22										
50	2.4.3.6 Installazione sistema di monitoraggio	7 g	lun 20/02/23	mar 28/02/23	45;46;47;48;49									
51	2.4.3.7 Installazione sistema di sicurezza - TVCC	15 g	lun 20/02/23	ven 10/03/23	45;46;47;48;49									
52	2.4.3.8 Test e collaudo	10 g	lun 13/03/23	ven 24/03/23	51;50									
53	2.4.3.9 Termine dei lavori impianto fotovoltaico	1 g	lun 27/03/23	lun 27/03/23	52									
54	2.4.4 Costruzione delle infrastrutture di connessione	108 g	lun 21/11/22	mer 19/04/23	29									
55	2.4.4.1 Concessioni strade	65 g	lun 21/11/22	ven 17/02/23										
56	2.4.4.2 Inizio della costruzione	1 g	lun 21/11/22	lun 21/11/22										
57	2.4.4.3 Lavori civili	60 g	lun 21/11/22	ven 10/02/23										
58	2.4.4.4 Lavori elettrici	90 g	lun 21/11/22	ven 24/03/23										
59	2.4.4.5 Testing and cold commissioning	10 g	lun 27/03/23	ven 07/04/23	55;56;57;58									
60	2.4.4.6 Termine dei lavori (connessione)	1 g	lun 10/04/23	lun 10/04/23	59									
61	2.4.4.7 Collaudo	7 g	mar 11/04/23	mer 19/04/23	60									
62	2.4.5 Esecuzione di opere e interventi accessori	33 g	mar 28/03/23	gio 11/05/23	44									
63	2.4.5.1 Esecuzione ripristini e mitigazioni	25 g	mar 28/03/23	lun 01/05/23										
64	2.4.5.2 Impianto di videosorveglianza	20 g	mar 28/03/23	lun 24/04/23										
65	2.4.5.3 Collaudo funzionale	10 g	mar 28/03/23	lun 10/04/23										
66	2.4.5.4 Smobilizzo del cantiere	7 g	mar 02/05/23	mer 10/05/23	44;54;63;64;65									
67	2.4.5.5 Avviamento impianto	1 g	gio 11/05/23	gio 11/05/23	66									

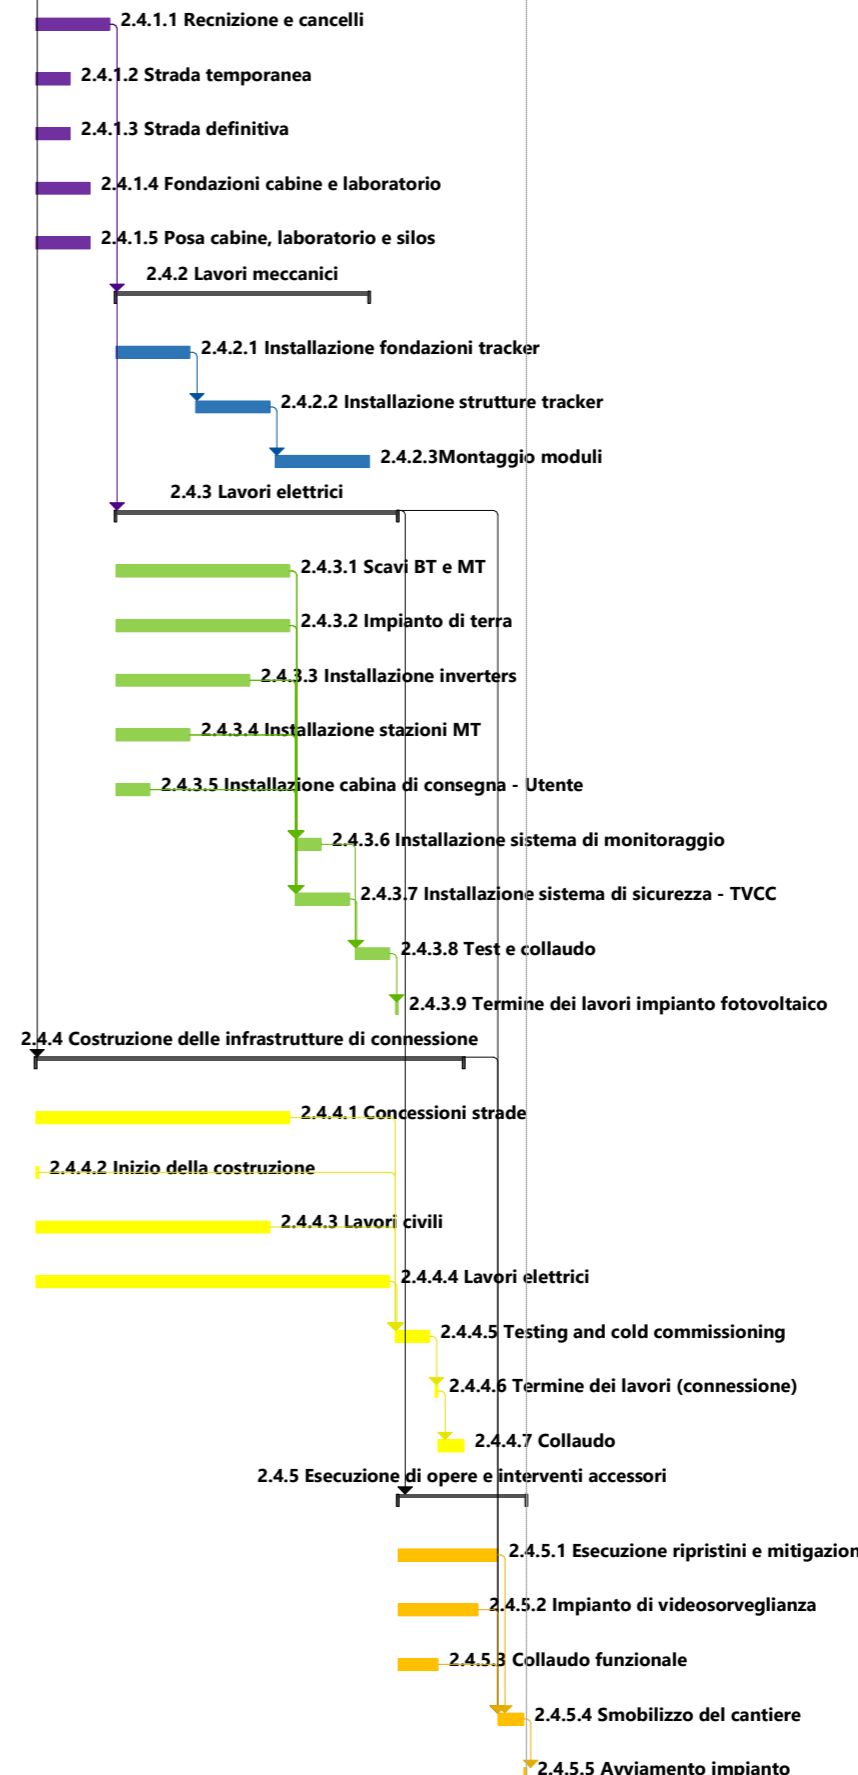

Progetto: Simple Project Plan
 Data: lun 20/09/21

Attività		Riepilogo		Cardine inattiva		Solo-durata		Solo inizio		Cardine esterno		Avanzamento manuale	
Divisione		Riepilogo progetto		Riepilogo inattiva		Riporto riepilogo manuale		Solo-fine		Scadenza			
Cardine		Attività inattiva		Attività manuale		Riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento			
