

1_AREA CANTIERE



DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Il presente piano riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico. L'appezzamento di terra soggetto dell'intervento è caratterizzato da un pendenza di circa il 10%. Il progetto prevede l'installazione di 14.511 moduli dislocati lungo tutta l'area secondo un asse sud-nord secondo linee parallele. I suddetti moduli saranno collocati sul terreno di posa su strutture che non necessitano di alcun opera di muratura ma semplicemente di una macchina battipalo che conficcherà le strutture sul terreno per una profondità di 50 cm. Oltre ai pannelli fotovoltaici l'impianto necessita di cavidotti che colleghino i moduli alle cabine di campo e quest'ultime alla cabina principale. Queste trincee saranno realizzate mediante un piccolo escavatore fornito di benna che realizzerà lo scavo a sezione obbligata per una larghezza compresa tra i 50 e gli 80 cm e una profondità massima di 100cm. L'installazione delle cabine di campo avverrà mediante di mezzo dotato di una piccola gru che collocherà nella sede predisposta l'elemento prefabbricato. Al termine dei lavori relativi all'impianto vero e proprio sarà installato un sistema di videosorveglianza ed un sistema di sensori di movimento. Il cantiere si concluderà con la piantumazione di specie arboree locali nel perimetro del lotto.


DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Per dare corso alle lavorazioni è prevista l'individuazione dell'area di intervento, della viabilità interna, della viabilità esterna e di accesso al cantiere. Allo stesso tempo è prevista la delimitazione dell'area di cantiere con recinzioni provvisorie ed in parte definitive. Ancor prima di procedere a qualsiasi lavorazione, dovrà essere organizzata l'area di cantiere. In particolare dovrà essere prescelta l'ubicazione del baraccamento. Verrà individuato il punto più idoneo per l'infissione delle paline dell'impianto di terra, verranno installati la linea elettrica ed il quadro elettrico di cantiere, quella per l'illuminazione notturna e gli impianti idrico sanitari. Dovrà essere garantito, oltre alla viabilità, lo spazio necessario per la manovra, il trasporto, il carico e lo scarico dei materiali stessi e per la loro preparazione a piè d'opera. Dette zone di lavorazione dovranno essere protette da tettoie se l'area ove sono ubicate verrà spazzata dal movimento di apparecchi di sollevamento e per la protezione dagli agenti atmosferici. L'Impresa appaltatrice dovrà prendere visione dello stato dei luoghi per poter predisporre mezzi di dimensione adeguata; si dovrà altresì esaminare l'effettiva stabilità e consistenza di tutto il percorso carrabile prescelto, terreno o asfalto, per evitare affossamenti e ribaltamenti degli automezzi durante le fasi di trasporto, carico e scarico. Oltre all'area di stoccaggio ed all'area per lavorazioni e preparazioni dei materiali da impiegare, dovranno essere individuate, l'area per il deposito temporaneo degli elementi del ponteggio e di quelli necessari alla realizzazione delle opere provvisorie oltre all'area per la raccolta dei materiali di risulta da avviare a discarica

FASI LAVORATIVE

- 1 ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CANTIERE**
 - 1.1 Preparazione area di lavoro**
 - 1.1.1 Realizzazione recinzione.
 - 1.1.2 Installazione nel cantiere di presidi igienico-sanitari.
 - 1.1.3 Posizionamento macchinari di cantiere.
 - 1.2 Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere**
 - 1.2.1 Installazione quadri elettrici di cantiere.
 - 1.2.2 Collegamento illuminazione provvisoria.
- 2 Scavi e rinterri**
 - 2.1 Livellamento del terreno.
 - 2.2 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici delle trincee passacavo.
 - 2.3 Scavo per le basi per delle cabine di campo.
- 3 Installazione pali struttura**
 - 3.1 Installazione mediante macchina battipalo dei pali reggi-pannello.
- 4 Montaggio struttura tracker**
 - 4.1 Predisposizione strutture.
 - 4.2 Installazione struttura reggi-pannello.
 - 4.3 Fissaggio e configurazione tracker.
- 5 Montaggio moduli fotovoltaici**
 - 5.1 Predisposizione moduli fotovoltaici.
 - 5.2 Fissaggio moduli fotovoltaico.
- 6 Posizionamento corrugati**
 - 6.1 Predisposizione in cantiere del materiale
 - 6.2 Posizionamento dei corrugati all'interno delle trincee.
 - 6.3 Posizionamento dei pozzetti di ispezione
 - 6.4 Collegamento con le basi delle cabine.
- 7 Posizionamento cabine prefabbricate**
 - 7.1 Predisposizione del cantiere.
 - 7.2 Posizionamento della cabina mediante mezzo meccanico
- 8 Passaggio cavi**
 - 8.1 Predisposizione materiali.
 - 8.2 Passaggio dei cavi all'interno delle tracce.
- 9 Montaggio inverter**
 - 9.1 Posizionamento delle strutture prefabbricate atte a tutelare gli inverter dagli agenti atmosferici.
 - 9.2 Montaggio inverter.
 - 9.3 Collegamento degli inverter ai quadri di sottocampo.
 - 9.4 Collegamento degli inverter alla rete cabine di campo.
- 10 Connessione alla rete pubblica**
 - 10.1 Connessione di tutti gli apparati
 - 10.2 Connessione dell'impianto alla rete principale.
- 11 Piantumazione**
 - 11.1 Preparazione del terreno.
 - 11.2 Piantumazione delle specie prescelte lungo l'area predisposta.
- 12 Installazione sistema di sicurezza**
 - 12.1 Installazione di telecamere
 - 12.2 Installazione sensori di movimento
 - 12.3 Connessione alla rete elettrica del sistema di sicurezza.
- 13 Collaudo e chiusura lavori**
 - 13.1 Collaudo
 - 13.2 Chiusura lavori

2_Ingresso Area cantiere

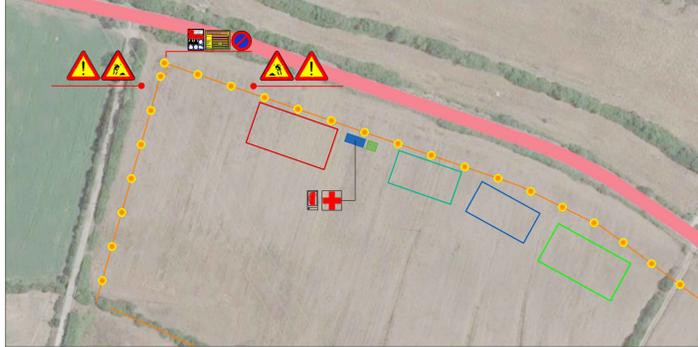

Legenda	
	BARACCA DI CANTIERE
	W.C. CHIMICO
	DEPOSITO TEMPORANEO MATERIALI
	STOCCAGGIO TEMPORANEO RIFIUTI
	PARCHEGGIO MEZZI DI CANTIERE
	STOCCAGGIO TERRE E ROCCE DA SCAVO
	AREA INTERDETTA AI MEZZI MECCANICI
	DELIMITAZIONE DI CANTIERE
	SEGNALETICA VERTICALE
	INGRESSO AL CANTIERE
	ESTINTORE PORTATILE
	CASSETTA MEDICA
	CARTELLO PRESCRIZIONI DPI
	CARTELLO DEI LAVORI
	PUNTO DI RACCOLTA
	SEGNALETICA LAMPEGGIANTE

SICUREZZA

VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI
La ditta non risponde di eventuali danni a persone o cose

1. ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	
Tipologia:	A. PREPARAZIONE AREA DI LAVORO
Descrizione:	
Modalità di esecuzione:	Provvedere a stabilire una delimitazione dell'area di cantiere, recinzione con barriere mobili o nastro segnaletico e stabilire un percorso di massima per gli addetti ed i mezzi meccanici. Tutte le lavorazioni effettuate devono comunque consentire di non lasciare situazioni di pericolo durante le ore di inattività del cantiere, avendo cura di esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, interna ed esterna al cantiere stesso e le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs. 493/96. Identificare quindi le zone di installazione dei baraccamenti e preparare il terreno provvedendo ad una bonifica del terreno e ad eliminare il ristagno delle acque meteoriche segnalando opportunamente buche, sporgenze ed ostacoli fissi presenti nell'area di cantiere.
Interconnessioni con altri lavori:	In questa prima fase di allestimento del cantiere non si prevedono interconnessioni significative con altre lavorazioni
Attrezzature e macchinari:	Macchina battipalo, Escavatore, Gruppo elettrogeno, Avvitatore, minuteria di cantiere
Materiali:	Struttura metallica, pozzetti in cemento, Corrugati di vario spessore
Analisi dei rischi:	Incendio, Esposizione a rumore
Misure provvisoriai:	Utilizzo dei DPI, Elmetto protettivo, Occhiali di protezione occhi, Guanti protezione mani, Scarpe protezione piedi Cuffie di protezione per il rumore
Dispositivi di protezione individuali:	Casco, guanti, calzature di sicurezza, cuffie, occhiali, mascherine
Riferimenti normativi:	D.Lgs 81 del 2008, Manuale di istruzione (ex D.P.R. n 547/55, n° 164756, n°303156
Note:	L'accesso nell'area di cantiere non deve essere permessa alle persone estranee alle lavorazioni. L'altezza della cesata deve essere non minore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio. Segnalare tempestivamente gli ingombri sulla strada, con segnaletica e illuminazione conforme a quanto richiesto dal regolamento edilizio e dal codice della strada. In luogo di facile consultazione esporre un cartello con indicazione dei numeri telefonici del più vicino comando dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e in generale degli enti da interpellare in caso di emergenza

Regione Sardegna
Provincia di Sassari
Comune di Sassari

Oggetto: **Progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico da 80,88 MWp denominato AGRIVOLTAICO MACCIADOSA**

Proponente: **PACIFICO**

PACIFICO CRISTALLO S.R.L.
Piazza Walther Von Vogelweide N°8,
39100, Bolzano, Italia,
P.IVA 03087880211

Titolo elaborato: Schema di cantiere

Numero elaborato: PUNTO 1.2.a.1

Orientamento:

Tipo elaborato: Di dettaglio Di modifica tecnica

Codice elaborato: Scala

REV	DATA	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato
0	07/10/2022	Prima emissione	Ing. P. Zarbo	Ing. P. Zarbo	Ing. P. Zarbo	Pacifico Cristallo srl
1						
2						
3						
4						

Logo Progettista e Denominazione commerciale

Pietro Ing. Zarbo
Via Giovanni XXIII, 12
02100 Agropoli
p.iva: 0205580846

Timbro progettista

Visti

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' (Diagramma di Gantt)

