




**REGIONE CAMPANIA
PROVINCIA DI CASERTA
COMUNE DI CANCELLO ARNONE**



**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SE DI CONDIVISIONE E TRASFORMAZIONE
30/150KV PER IL COLLEGAMENTO DI PARCHI FOTOVOLTAICI IN PROVINCIA DI CASERTA**



STARENERGIA

StarEnergia srl
sede legale Via Francesco Giordani n. 42
800122 Napoli I.VA 05769401216 PEC: starenergia@pec.it

CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTI

PROPONENTE

SCALA



INSE s.r.l.
Viale Michelangelo, 71
800129 Napoli
Tel. +39 0815797998
mail: tecnico.inse@gmail.com

CAMPANIA SOLARE s.r.l.
sede legale Via F. Giordani n. 42
800122 Napoli
Tel. +39 081 060 7743 Fax +39 081 060 7876
Rea - NA1051228 - C.F. e P.IVA 09700581219
mail: campaniasolare@starenergia.com
PEC: campaniasolare@pecditta.com
Cod. Univoco 5RU082D


-

TAVOLA

BS245-EU21-D


Revisioni e coordinamento: ing. Roberto Caldara

Rev.	Data:	Redattore :
Rev. 01	20/07/2021	INSE Srl
Rev. 02	Aprile 2022	INSE Srl
Rev. 03	Ottobre 2022	INSE Srl



COSTRUZIONE S.E. "CONDIVISA" 150 Kv con SE TRASFORMAZIONE

Id	Titolo attività	Inizio	Fine	Durata
A	STAZIONE CONDIVISA 150kV e SE TRASFORMAZIONE	01/10/2023	01/10/2024	366
1	Apertura cantiere stazione "condivisa" 150kV	01/10/2023	11/10/2023	10
2	Sistemazione area di stazione e strada di accesso	12/10/2023	21/11/2023	40
3	Posa rete di terra	22/11/2023	17/12/2023	25
4	Opere civili di stazione	18/12/2023	15/07/2024	210
5	Montaggio apparecchiature AT	16/07/2024	04/09/2024	50
6	Montaggio sistema di controllo	05/09/2024	20/09/2024	15
7	Prove stazione	21/09/2024	01/10/2024	10
B	ELETTRODOTTO 150kV IN CAVO tra SE "condivisa"-SE 380kV Cannello	02/10/2024	21/10/2024	15
8	Apertura cantiere rete AT	03/10/2024	08/10/2024	5
9	Realizzazione trincea di scavo	09/10/2024	14/10/2024	5
10	Posa in opera cavo ed esecuzione giunti	15/10/2024	17/10/2024	2
11	Prove cavi AT	18/10/2024	21/10/2024	3
C	ATTIVAZIONE STAZIONE	22/10/2024	21/11/2024	30

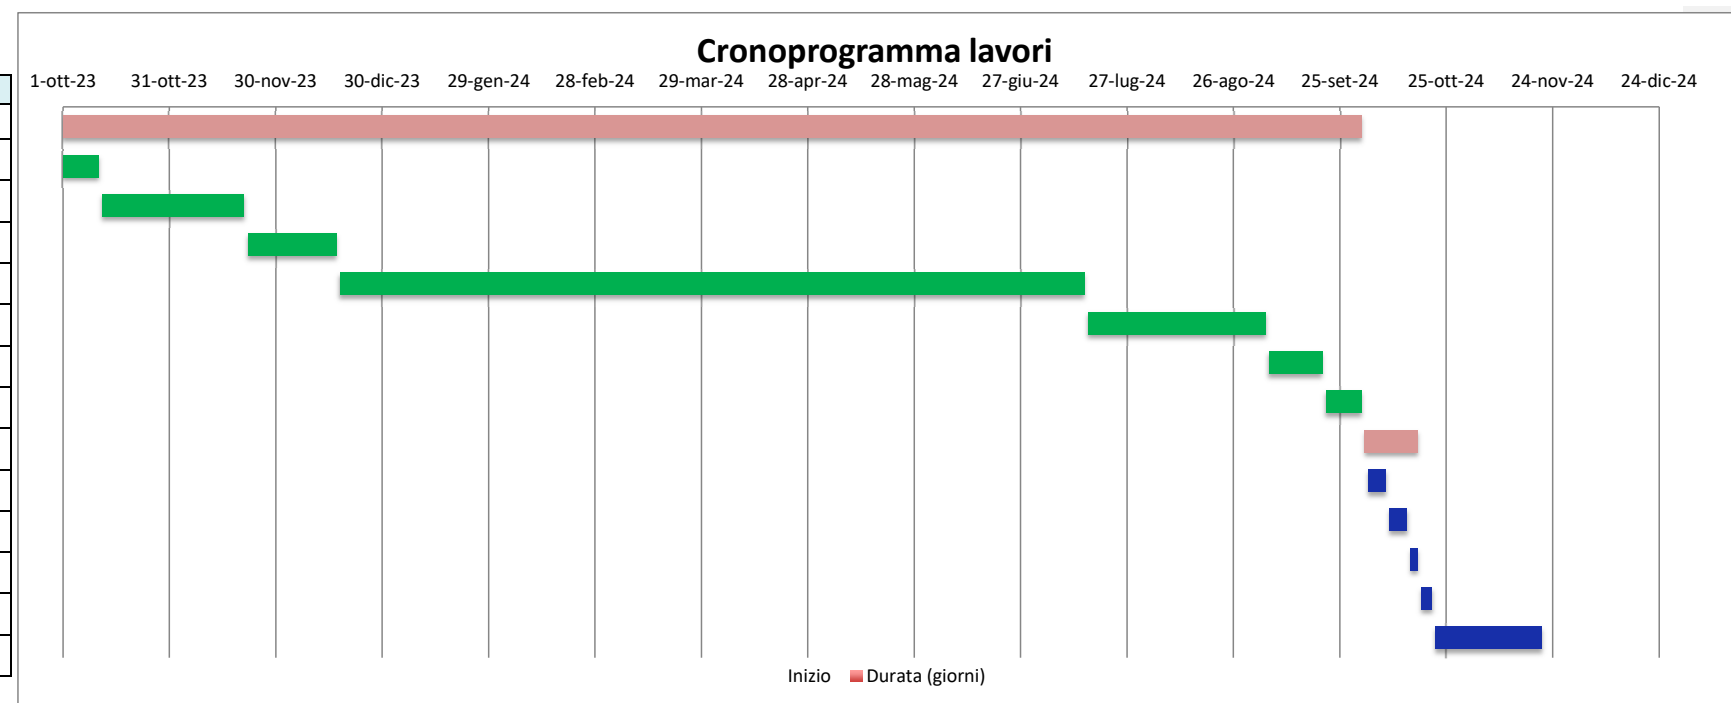

Gantt Chart

