




**REGIONE CAMPANIA  
PROVINCIA DI CASERTA  
COMUNE DI CANCELLO ARNONE**



**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SE DI CONDIVISIONE E TRASFORMAZIONE  
30/150KV PER IL COLLEGAMENTO DI PARCHI FOTOVOLTAICI IN PROVINCIA DI CASERTA**



**STARENERGIA**

StarEnergia srl  
sede legale Via Francesco Giordani n. 42  
800122 Napoli I.VA 05769401216 PEC: [starenergia@pec.it](mailto:starenergia@pec.it)

**CRONOPROGRAMMA**

**PROGETTISTI**



**INSE s.r.l.**  
Viale Michelangelo, 71  
800129 Napoli  
Tel. +39 0815797998  
mail: [tecnico.inse@gmail.com](mailto:tecnico.inse@gmail.com)

**PROPONENTE**

**CAMPANIA SOLARE s.r.l.**  
sede legale Via F. Giordani n. 42  
800122 Napoli  
Tel. +39 081 060 7743 Fax +39 081 060 7876  
Rea - NA1051228 - C.F. e P.IVA 09700581219  
mail: [campaniasolare@starenergia.com](mailto:campaniasolare@starenergia.com)  
PEC: [campaniasolare@pecditta.com](mailto:campaniasolare@pecditta.com)  
Cod. Univoco 5RU082D

**SCALA**


-

**TAVOLA**

**BS245-EU21-D**


Revisioni e coordinamento: ing. Roberto Caldara

Rev.	Data:	Redattore :
Rev. 01	20/07/2021	INSE Srl
Rev. 02	Aprile 2022	INSE Srl
Rev. 03	Ottobre 2022	INSE Srl



## COSTRUZIONE S.E. "CONDIVISA" 150 Kv con SE TRASFORMAZIONE

Id	Titolo attività	Inizio	Fine	Durata
A	<b>STAZIONE CONDIVISA 150kV e SE TRASFORMAZIONE</b>	<b>01/10/2023</b>	<b>01/10/2024</b>	<b>366</b>
1	Apertura cantiere stazione "condivisa" 150kV	01/10/2023	11/10/2023	10
2	Sistemazione area di stazione e strada di accesso	12/10/2023	21/11/2023	40
3	Posa rete di terra	22/11/2023	17/12/2023	25
4	Opere civili di stazione	18/12/2023	15/07/2024	210
5	Montaggio apparecchiature AT	16/07/2024	04/09/2024	50
6	Montaggio sistema di controllo	05/09/2024	20/09/2024	15
7	Prove stazione	21/09/2024	01/10/2024	10
B	<b>ELETTRODOTTO 150kV IN CAVO tra SE "condivisa"-SE 380kV Cannello</b>	<b>02/10/2024</b>	<b>21/10/2024</b>	<b>15</b>
8	Apertura cantiere rete AT	03/10/2024	08/10/2024	5
9	Realizzazione trincea di scavo	09/10/2024	14/10/2024	5
10	Posa in opera cavo ed esecuzione giunti	15/10/2024	17/10/2024	2
11	Prove cavi AT	18/10/2024	21/10/2024	3
C	<b>ATTIVAZIONE STAZIONE</b>	<b>22/10/2024</b>	<b>21/11/2024</b>	<b>30</b>

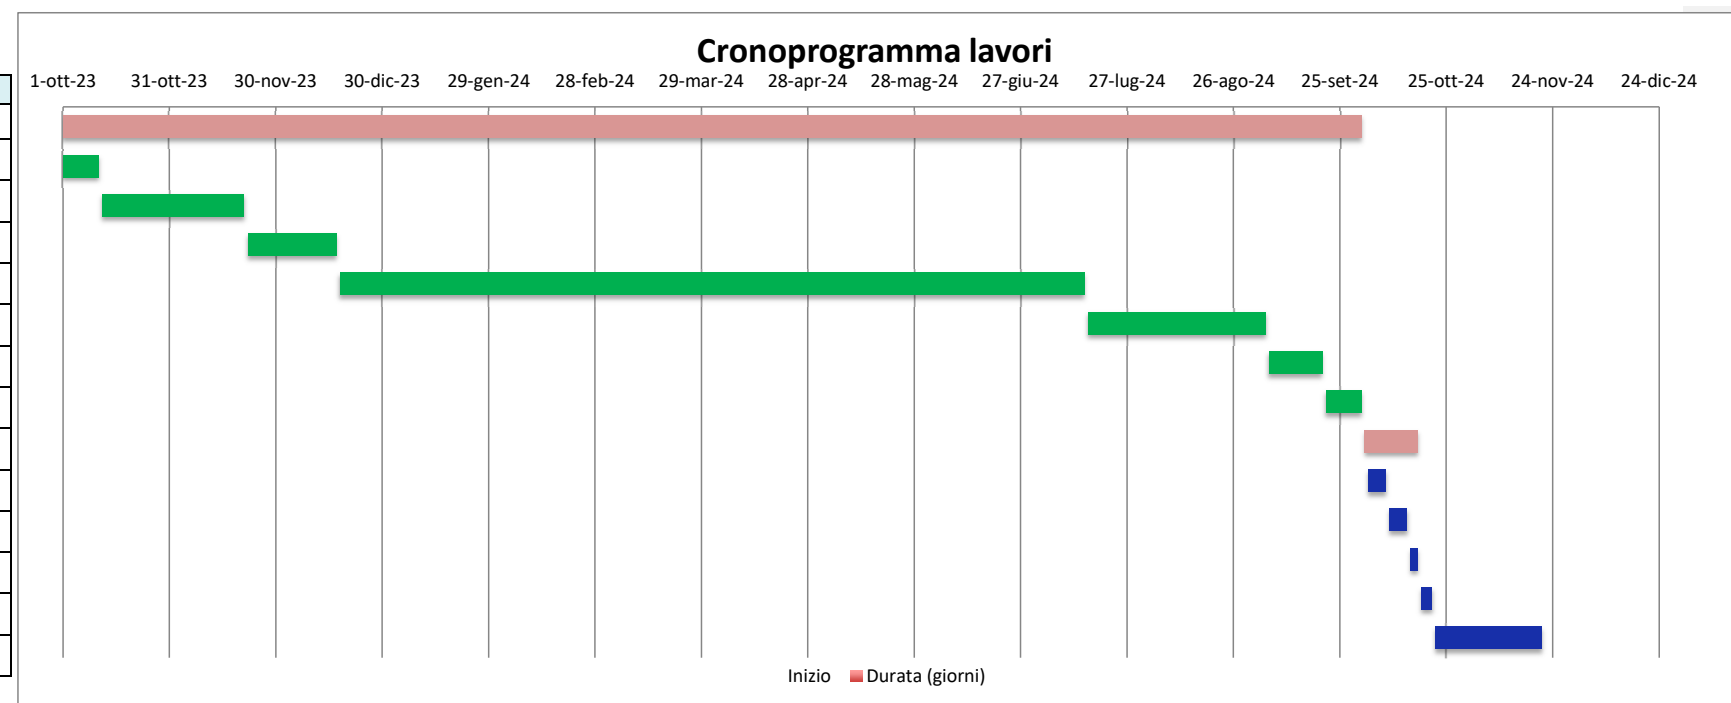

## Gantt Chart

