

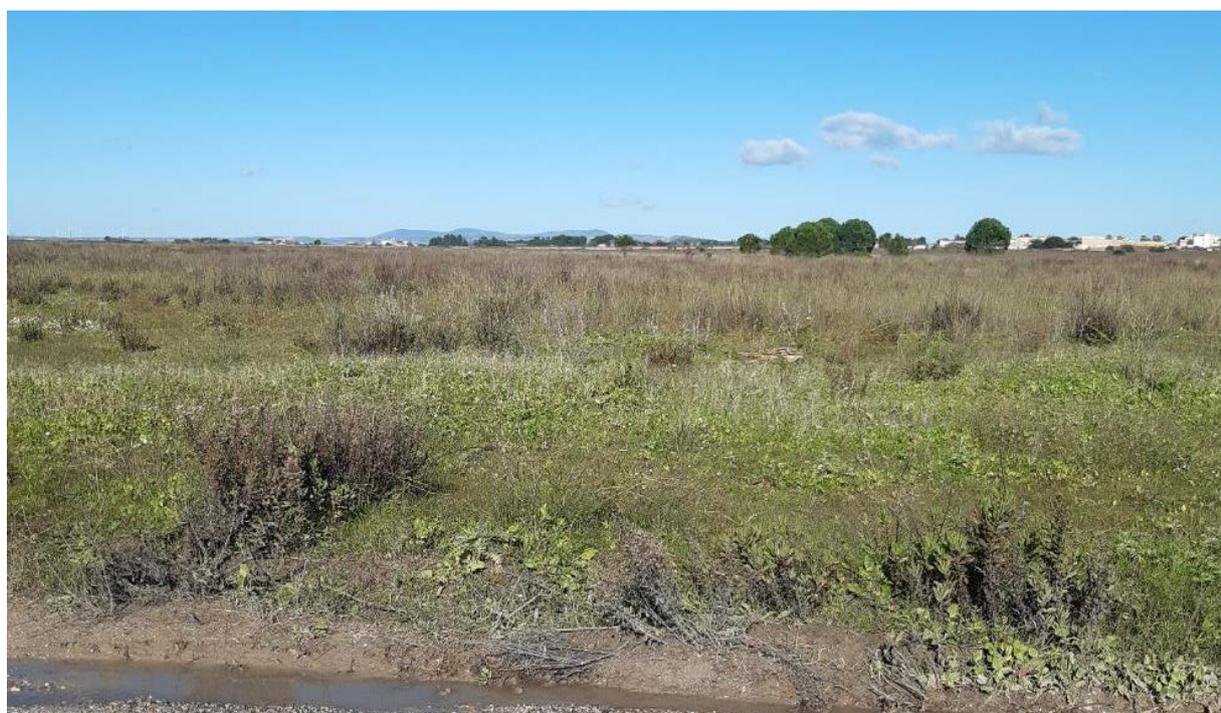
Studio di Impatto Ambientale

IMPIANTO FV E BESS – EX AEROPORTO CASTELVETRANO



Comuni di CASTELVETRANO e PARTANNA (TP)

Allegato 12

Cronoprogramma di Cantiere



Questo documento rappresenta l'Allegato 12 relativo al Cronoprogramma di Cantiere per la realizzazione di un Impianto Fotovoltaico, di potenza pari a circa 78,634 MWp e di un impianto di accumulo pari a 20 MW, nel territorio dei Comuni di Castelvetrano e di Partanna in provincia di Trapani.

27/05/2022	00	Emissione Finale	<p>Alessandro Battaqlia</p>  <p>Paola Bertolini</p>  	<p>GdL ENE/PERM ENE/BD EniPlenitude/ENGI</p>	<p>Resp. Permitting ENE/PERM Carlotta Martignoni</p>  <p>Direttore Tecnico GreenIT Federico Pugliese</p> 
Data	Revisione	Descrizione Revisione	Preparato	Controllato	Approvato

IMPIANTO FV E BESS EX AEROPORTO DI CASTELVETRANO

Impianto FV e BESS – Ex Aeroporto Castelvetro

Castelvetro (TP) – Progetto Definitivo

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI COSTRUZIONE



LAVAZZA LUCA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI
VARESE
Ingegnere
23.05.2022 12:58:02 UTC

EV-FS	00	29/04/2022	Emissione	A. Napoleoni	C. Camiciotti	L. Lavazza	G. Cacciola	A. Luce
Stato di Validità	Numero Revisione	Data	Descrizione	Stantec Preparato	Stantec verificato	Stantec Approvato	Eni Plenitude Approvato	Eni Plenitude Approvato
Indice Revisione								
Logo Committente e Denominazione Commerciale 				Nome progetto Impianto FV e BESS - Ex Aeroporto Castelvetro		ID Documento Committente 082600BJRG00029 Commessa N.		
Logo Appaltatore e Denominazione Commerciale  Stantec S.p.A						ID Documento Appaltatore N. Commessa 45503406.06		
Nome d'Impianto e Oggetto IMPIANTO FV e BESS EX AEROPORTO DI CASTELVETRANO Castelvetro (TP) – Progetto Definitivo						Scala n.a.	Numero di Pagine 1 / 2	
Titolo Documento Cronoprogramma lavori di costruzione								

Software: Microsoft Word

File Name: F0490-A-R04-A - Cronoprogramma lavori di costruzione.docx

1 CRONOPROGRAMMA LAVORI DI COSTRUZIONE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA (78,6 MWp - 70,8 MWac in immissione) + BESS (20 MW - 40 MWh)		Tempistiche previste [mesi]																																															
Attività	Settimane	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
PROCUREMENT	25																																																
Moduli	14																																																
Power Station e MTR	18																																																
Pali sostegno strutture	6																																																
Sovrastrutture e tracker	14																																																
Cavi	7																																																
Componenti BESS	10																																																
OPERE CIVILI E MECCANICHE	32																																																
Mobilizzazione cantiere	2																																																
Predisposizione area / Pulizia area	4																																																
Viabilità interna	6																																																
Fondazioni cabine ed edifici uffici	8																																																
Installazione/posa edifici ufficio-magazzino	6																																																
Scavo e posa cavidotti area impianto	10																																																
Scavo e posa cavidotto connessione esterno	12																																																
Infissione pali/Installazione montanti di fondazione	16																																																
Installazione sovrastrutture di supporto	16																																																
Installazione moduli fotovoltaici	15																																																
OPERE ELETTRICHE	20																																																
Montaggio string box	15																																																
Cablaggio stringhe e posa cavi DC	15																																																
Posa e cablaggio Power Station e MTR	16																																																
Posa e cablaggio sistema BESS	16																																																
ALTRO	20																																																
Opere di mitigazione	12																																																
Sistemi Ausiliari (es. illuminazione, sist.monitoraggio)	16																																																
COMMISSIONING E TEST	12																																																
