

COMUNE DI FOGGIA

Proponente

SR PROJECT 1 S.R.L.
 VIA LARGO GUIDO DONEGANI, 2
 20121 MILANO
 P.IVA 10707680962

*Progetto per la realizzazione di impianti di
 produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile*

Opera

PROGETTO DEFINITIVO

**DI UNA STAZIONE ELETTRICA DI "CONDIVISIONE" COSTITUITA DA 1
 STALLO CONDIVISO E 1 STAZIONE UTENZA DI TRASFORMAZIONE
 30\150 kV PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED 1
 STAZIONE DI CONDIVISIONE CON 1 STALLO CONDIVISO 150 kV**

Progettazione



M.E. Free Srl

Via Athena,29
 Cap 84047 Capaccio Paestum
 P.Iva 04596750655
 Ing. Giovanni Marsicano



IL TECNICO
 ING. GIOVANNI MARSICANO

Elaborato


Nome Elaborato:

CRONOPROGRAMMA

Contenuto Elaborato:

00	03/11/2021	PRIMA EMISSIONE	G. Marsicano	G. Marsicano	G. Marsicano
Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
Scala:					
Formato:	Codice Pratica	NSXVJO4	Codice Elaborato	IT-FGA-R24	

REALIZZAZIONE STAZIONE CONDIVISA 150 KV+ STAZIONE UTENTE	DATA INIZIO	DURATA	DATA FINE
APERTURA CANTIERE STAZIONE CONDIVISA + UTENTE	01/06/23	10	11/06/23
SISTEMAZIONE AREA CANTIERE E STRADA DI ACCESSO	11/06/23	40	21/07/23
POSA RETE DI TERRA	21/07/23	25	15/08/23
OPERE CIVILI STAZIONE	15/08/23	210	12/03/24
MONTAGGIO APPARECCHIATURE AT	12/03/24	50	01/05/24
MONTAGGIO SISTEMA DI CONTROLLO	01/05/24	15	16/05/24
PROVE STAZIONE	16/05/24	10	26/05/24

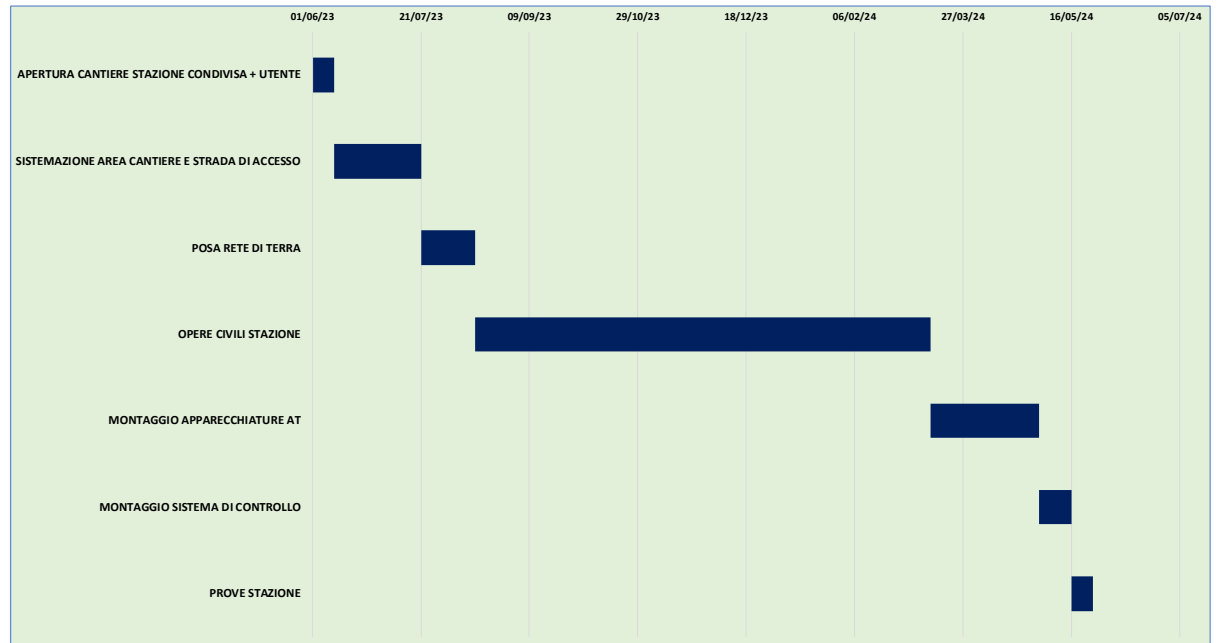

REALIZZAZIONE CAVIDOTTO AT	DATA INIZIO	DURATA	DATA FINE
APERTURA CANTIERE CAVIDOTTO AT	04/06/23	6	10/06/23
REALIZZAZIONE TRINCEA DI SCAVO	10/06/23	40	20/07/23
POSA IN OPERA CAVO ED ESECUZIONE GIUNTI	20/07/23	20	09/08/23
PROVE CAVI AT	09/08/23	5	14/08/23

