



INTERNAL CODE

C22FSTR001WR017_00

PAGE

1 di/of 1

TITLE: Cronoprogramma lavori

AVAILABLE LANGUAGE: IT

“IMPIANTO EOLICO DI 54 MW IN LOCALITA’ PIANA DELLA TAVERNA” COMUNI DI STIGLIANO E CRACO (MT)

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Il Tecnico

Ing. Leonardo Splendido


File:C22FSTR001WR017_00_Cronoprogramma lavori

00	23/12/2022	EMISSIONE PER ITER AUTORIZZATIVO	P. Cabrera		L. Splendido
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
VALIDATION					
NOME		NOME		NOME	
COLLABORATORS		VERIFIED BY		VALIDATED BY	
PROJECT / PLANT STIGLIANO EO		INTERNAL CODE			
		C22FSTR001WR017_00			
CLASSIFICATION: COMPANY			UTILIZATION SCOPE		

ID	Task Name	Durata	Inizio	Fine	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag
1	IMPIANTO EOLICO STIGLIANO	346 g	01/09/2023	26/12/2024	IMPIANTO EOLICO STIGLIANO																				
2	ALLESTIMENTO E APERTURA CANTIERE	4 g	01/09/2023	06/09/2023	ALLESTIMENTO E APERTURA CANTIERE																				
3	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO	148 g	07/09/2023	01/04/2024																					
4	Realizzazione strade e piazzole	118 g	07/09/2023	19/02/2024																					
5	Strada Area di Trasbordo	6 g	07/09/2023	14/09/2023	Strada Area di Trasbordo																				
6	Piazzola Area di Trasbordo	10 g	15/09/2023	28/09/2023	Piazzola Area di Trasbordo																				
7	Strada WTG 1 + Strada WTG 2	88 g	29/09/2023	30/01/2024	Strada WTG 1 + Strada WTG 2																				
8	Piazzola WTG 1	14 g	31/01/2024	19/02/2024	Piazzola WTG 1																				
9	Piazzola WTG 2	14 g	31/01/2024	19/02/2024	Piazzola WTG 2																				
10	Strada WTG 3	10 g	29/09/2023	12/10/2023	Strada WTG 3																				
11	Piazzola WTG 3	14 g	13/10/2023	01/11/2023	Piazzola WTG 3																				
12	Strada WTG 4 + WTG 5	35 g	29/09/2023	16/11/2023	Strada WTG 4 + WTG 5																				
13	Piazzola WTG 4	14 g	17/11/2023	06/12/2023	Piazzola WTG 4																				
14	Piazzola WTG 5	14 g	17/11/2023	06/12/2023	Piazzola WTG 5																				
15	Strada WTG 6 + WTG 7	30 g	07/12/2023	17/01/2024	Strada WTG 6 + WTG 7																				
16	Piazzola WTG 6	14 g	18/01/2024	06/02/2024	Piazzola WTG 6																				
17	Piazzola WTG 7	14 g	18/01/2024	06/02/2024	Piazzola WTG 7																				
18	Strada WTG 8 + WTG 9 + Strada Area a servizio della cabina di raccolta	32 g	07/12/2023	19/01/2024	Strada WTG 8 + WTG 9 + Strada Area a servizio della cabina di raccolta																				
19	Piazzola WTG 8	14 g	22/01/2024	08/02/2024	Piazzola WTG 8																				
20	Piazzola WTG 9	14 g	22/01/2024	08/02/2024	Piazzola WTG 9																				
21	Realizzazione scavo e fondazioni	88 g	02/11/2023	04/03/2024																					
22	Fondazione WTG 1	10 g	20/02/2024	04/03/2024	Fondazione WTG 1																				
23	Fondazione WTG 2	10 g	20/02/2024	04/03/2024	Fondazione WTG 2																				
24	Fondazione WTG 3	10 g	02/11/2023	15/11/2023	Fondazione WTG 3																				
25	Fondazione WTG 4	10 g	07/12/2023	20/12/2023	Fondazione WTG 4																				
26	Fondazione WTG 5	10 g	07/12/2023	20/12/2023	Fondazione WTG 5																				
27	Fondazione WTG 6	10 g	07/02/2024	20/02/2024	Fondazione WTG 6																				
28	Fondazione WTG 7	10 g	07/02/2024	20/02/2024	Fondazione WTG 7																				
29	Fondazione WTG 8	10 g	09/02/2024	22/02/2024	Fondazione WTG 8																				
30	Fondazione WTG 9	10 g	09/02/2024	22/02/2024	Fondazione WTG 9																				
31	Montaggio aerogeneratore	98 g	16/11/2023	01/04/2024																					
32	Installazione aerogeneratore WTG 1	20 g	05/03/2024	01/04/2024	Installazione aerogeneratore WTG 1																				
33	Installazione aerogeneratore WTG 2	20 g	05/03/2024	01/04/2024	Installazione aerogeneratore WTG 2																				
34	Installazione aerogeneratore WTG 3	20 g	16/11/2023	13/12/2023	Installazione aerogeneratore WTG 3																				
35	Installazione aerogeneratore WTG 4	20 g	21/12/2023	17/01/2024	Installazione aerogeneratore WTG 4																				
36	Installazione aerogeneratore WTG 5	20 g	21/12/2023	17/01/2024	Installazione aerogeneratore WTG 5																				

Project: cronoprogramma stiglian
Date: 16/12/2022

Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Slippage	
Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Avanzamento manuale	

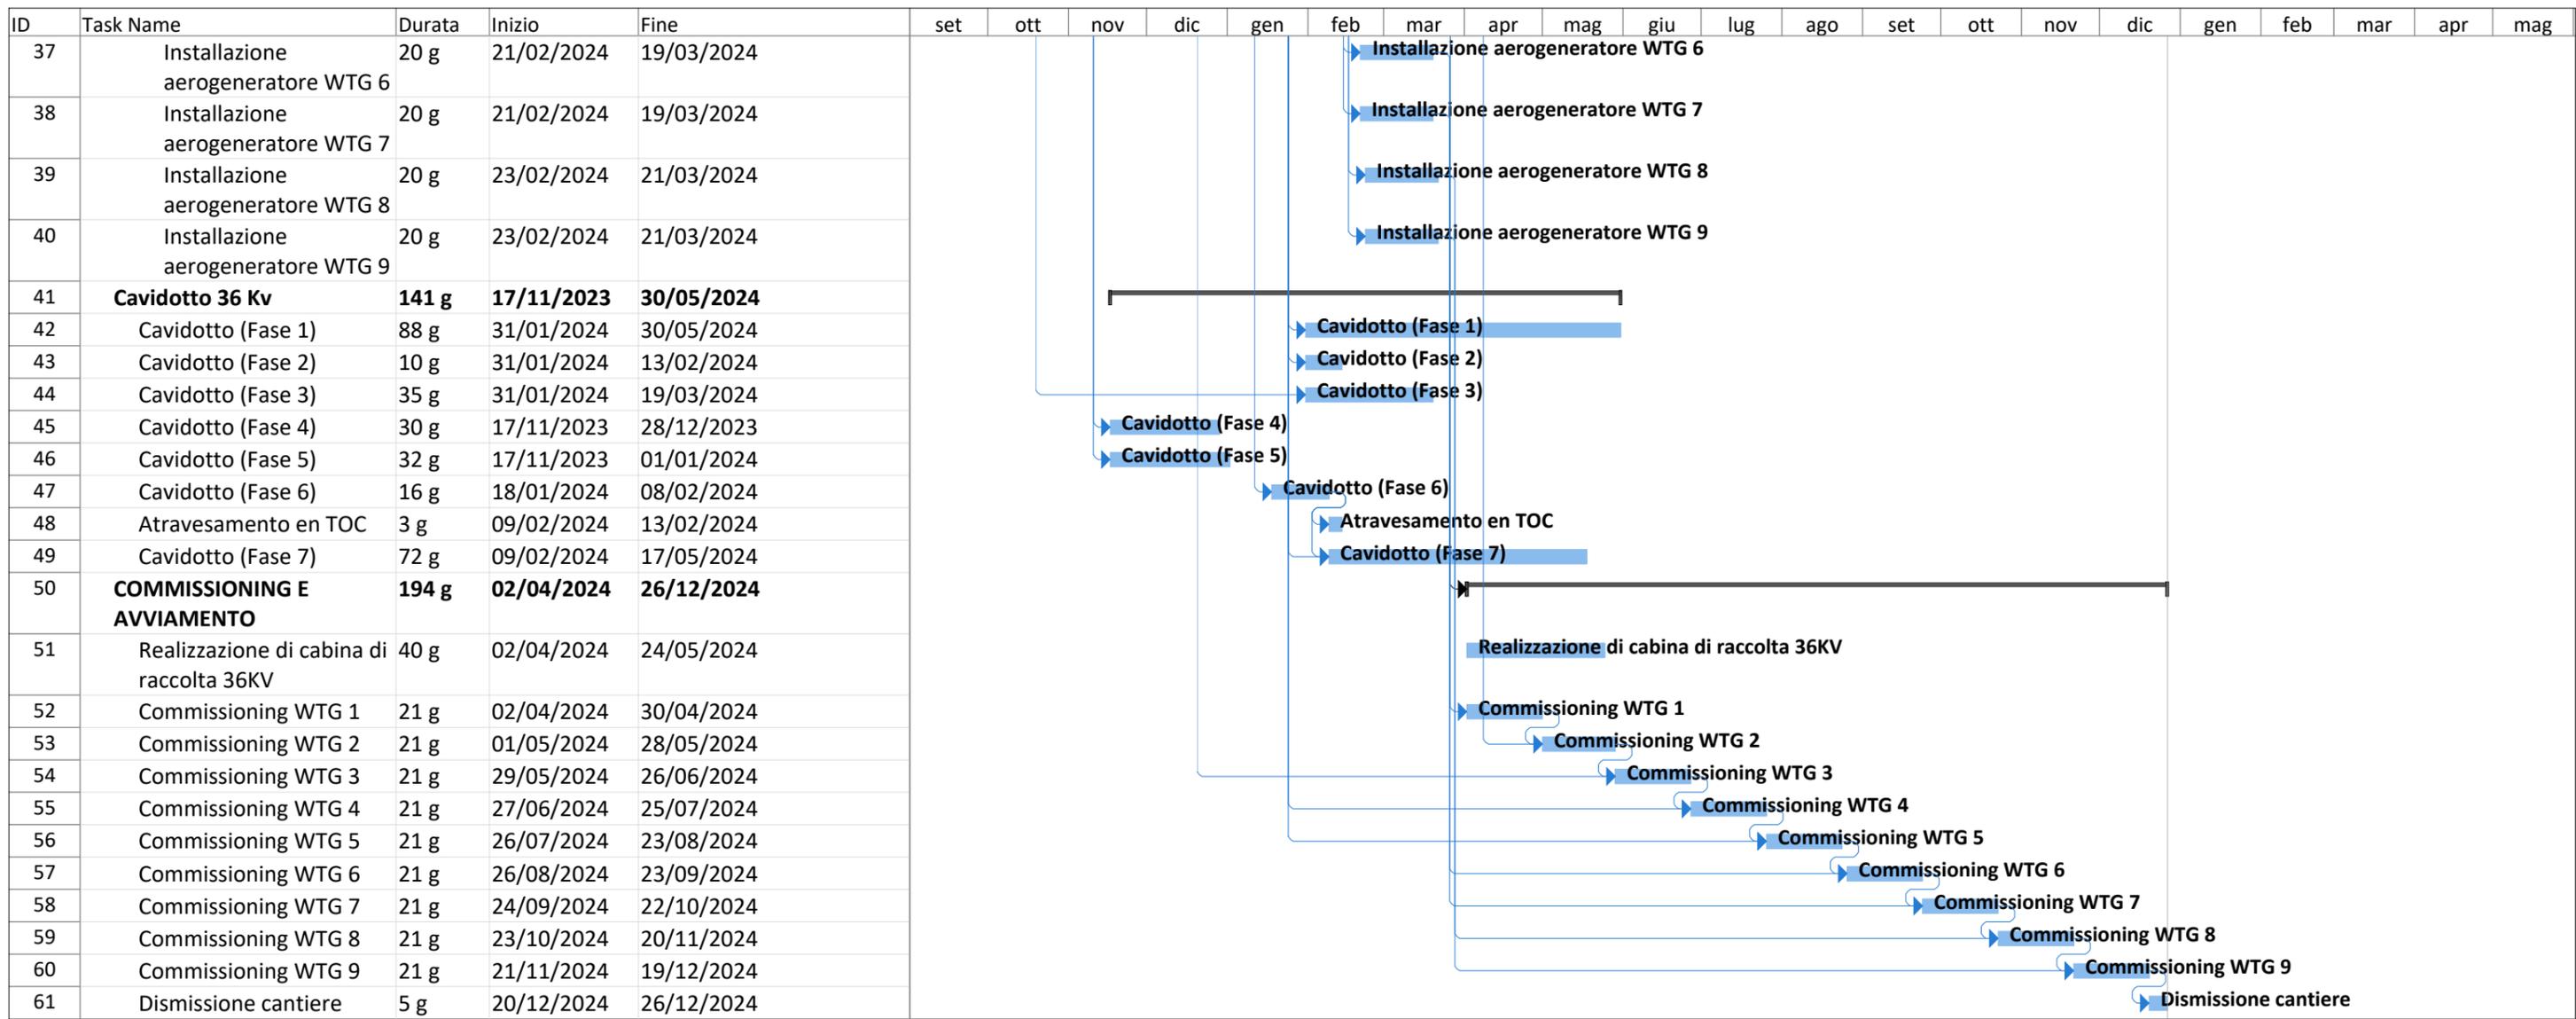

Il Tecnico

Ing. Leonardo Splendido

Project: cronoprogramma stiglian Date: 16/12/2022	Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
	Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Progress	
	Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Slippage	
	Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Avanzamento manuale	
