

REGIONE
BASILICATA



PROVINCIA DI
MATERA



COMUNE DI
STIGLIANO

OGGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRI-VOLTAICO
A TERRA "STIGLIANO" DELLA POTENZA NOMINALE DI 20 MW
LOCALITA' "STANZALAURO" NEL COMUNE DI STIGLIANO (MT)

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI



PROPONENTE:

COMPAGNIA DEL SOLE DUE S.R.L.
P.IVA IT04320530985
VIA ALDO MORO, 28
25043- BRENO (BS)

PROGETTAZIONE:

Ing. Carmen Martone
Iscr. n. 1872
Ordine Ingegneri Potenza
C.F. MRTCMN73D56H703E




Geol. Raffaele Nardone
Iscr. n. 243
Ordine Geologi Basilicata
C.F. NRDRFL71H04A509H




EGM PROJECT S.R.L.
VIA VERRASTRO 15/A
85100- POTENZA (PZ)
P.IVA 02094310766
REA PZ-206983

Livello prog.	Cat. opera	N° . prog.elaborato	Tipo elaborato	N° foglio	Tot. fogli	Nome file	Scala
PD	I.IF	A.10	R				
REV.	DATA	DESCRIZIONE			ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	GENNAIO 2023	Emissione				Geol. Raffaele Nardone EGM Project	Ing. Carmen Martone EGM Project



Nome attività	Durata	Settimana -1	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6							Settimana 7							Settimana 8							Settimana 9							Settimana 10							Settimana 11											
		-2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75							
Recinzione e apprestamenti del cantiere	19 g	[Barra grigia con frecce ai capi]																																																																																		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	9 g	Z1	[Barra blu]																																																																																	
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	10 g																																																																																			
Impianti di servizio del cantiere	18 g																																																																																			
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	8 g																																																																																			
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	10 g																																																																																			
Lavori accessori per fotovoltaico a terra	83 g																																																																																			
Scavi e rinterrati	20 g																																																																																			
Scavo a sezione obbligata	10 g																																																																																			
Rinterro di scavo eseguito a macchina	10 g																																																																																			
Recinzione per fotovoltaico a terra	22 g																																																																																			
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali	10 g																																																																																			
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strut	6 g																																																																																			
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	6 g																																																																																			
Fondazioni per fotovoltaico a terra	12 g																																																																																			
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondaz	3 g																																																																																			
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fc	5 g																																																																																			
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	4 g																																																																																			
Impianti solari fotovoltaici	29 g																																																																																			
Installazione di sistema di accumulo	14 g																																																																																			
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	15 g																																																																																			
Smobilizzo del cantiere	5 g																																																																																			
LEGENDA Zona:																																																																																				
Z1 = ZONA UNICA																																																																																				

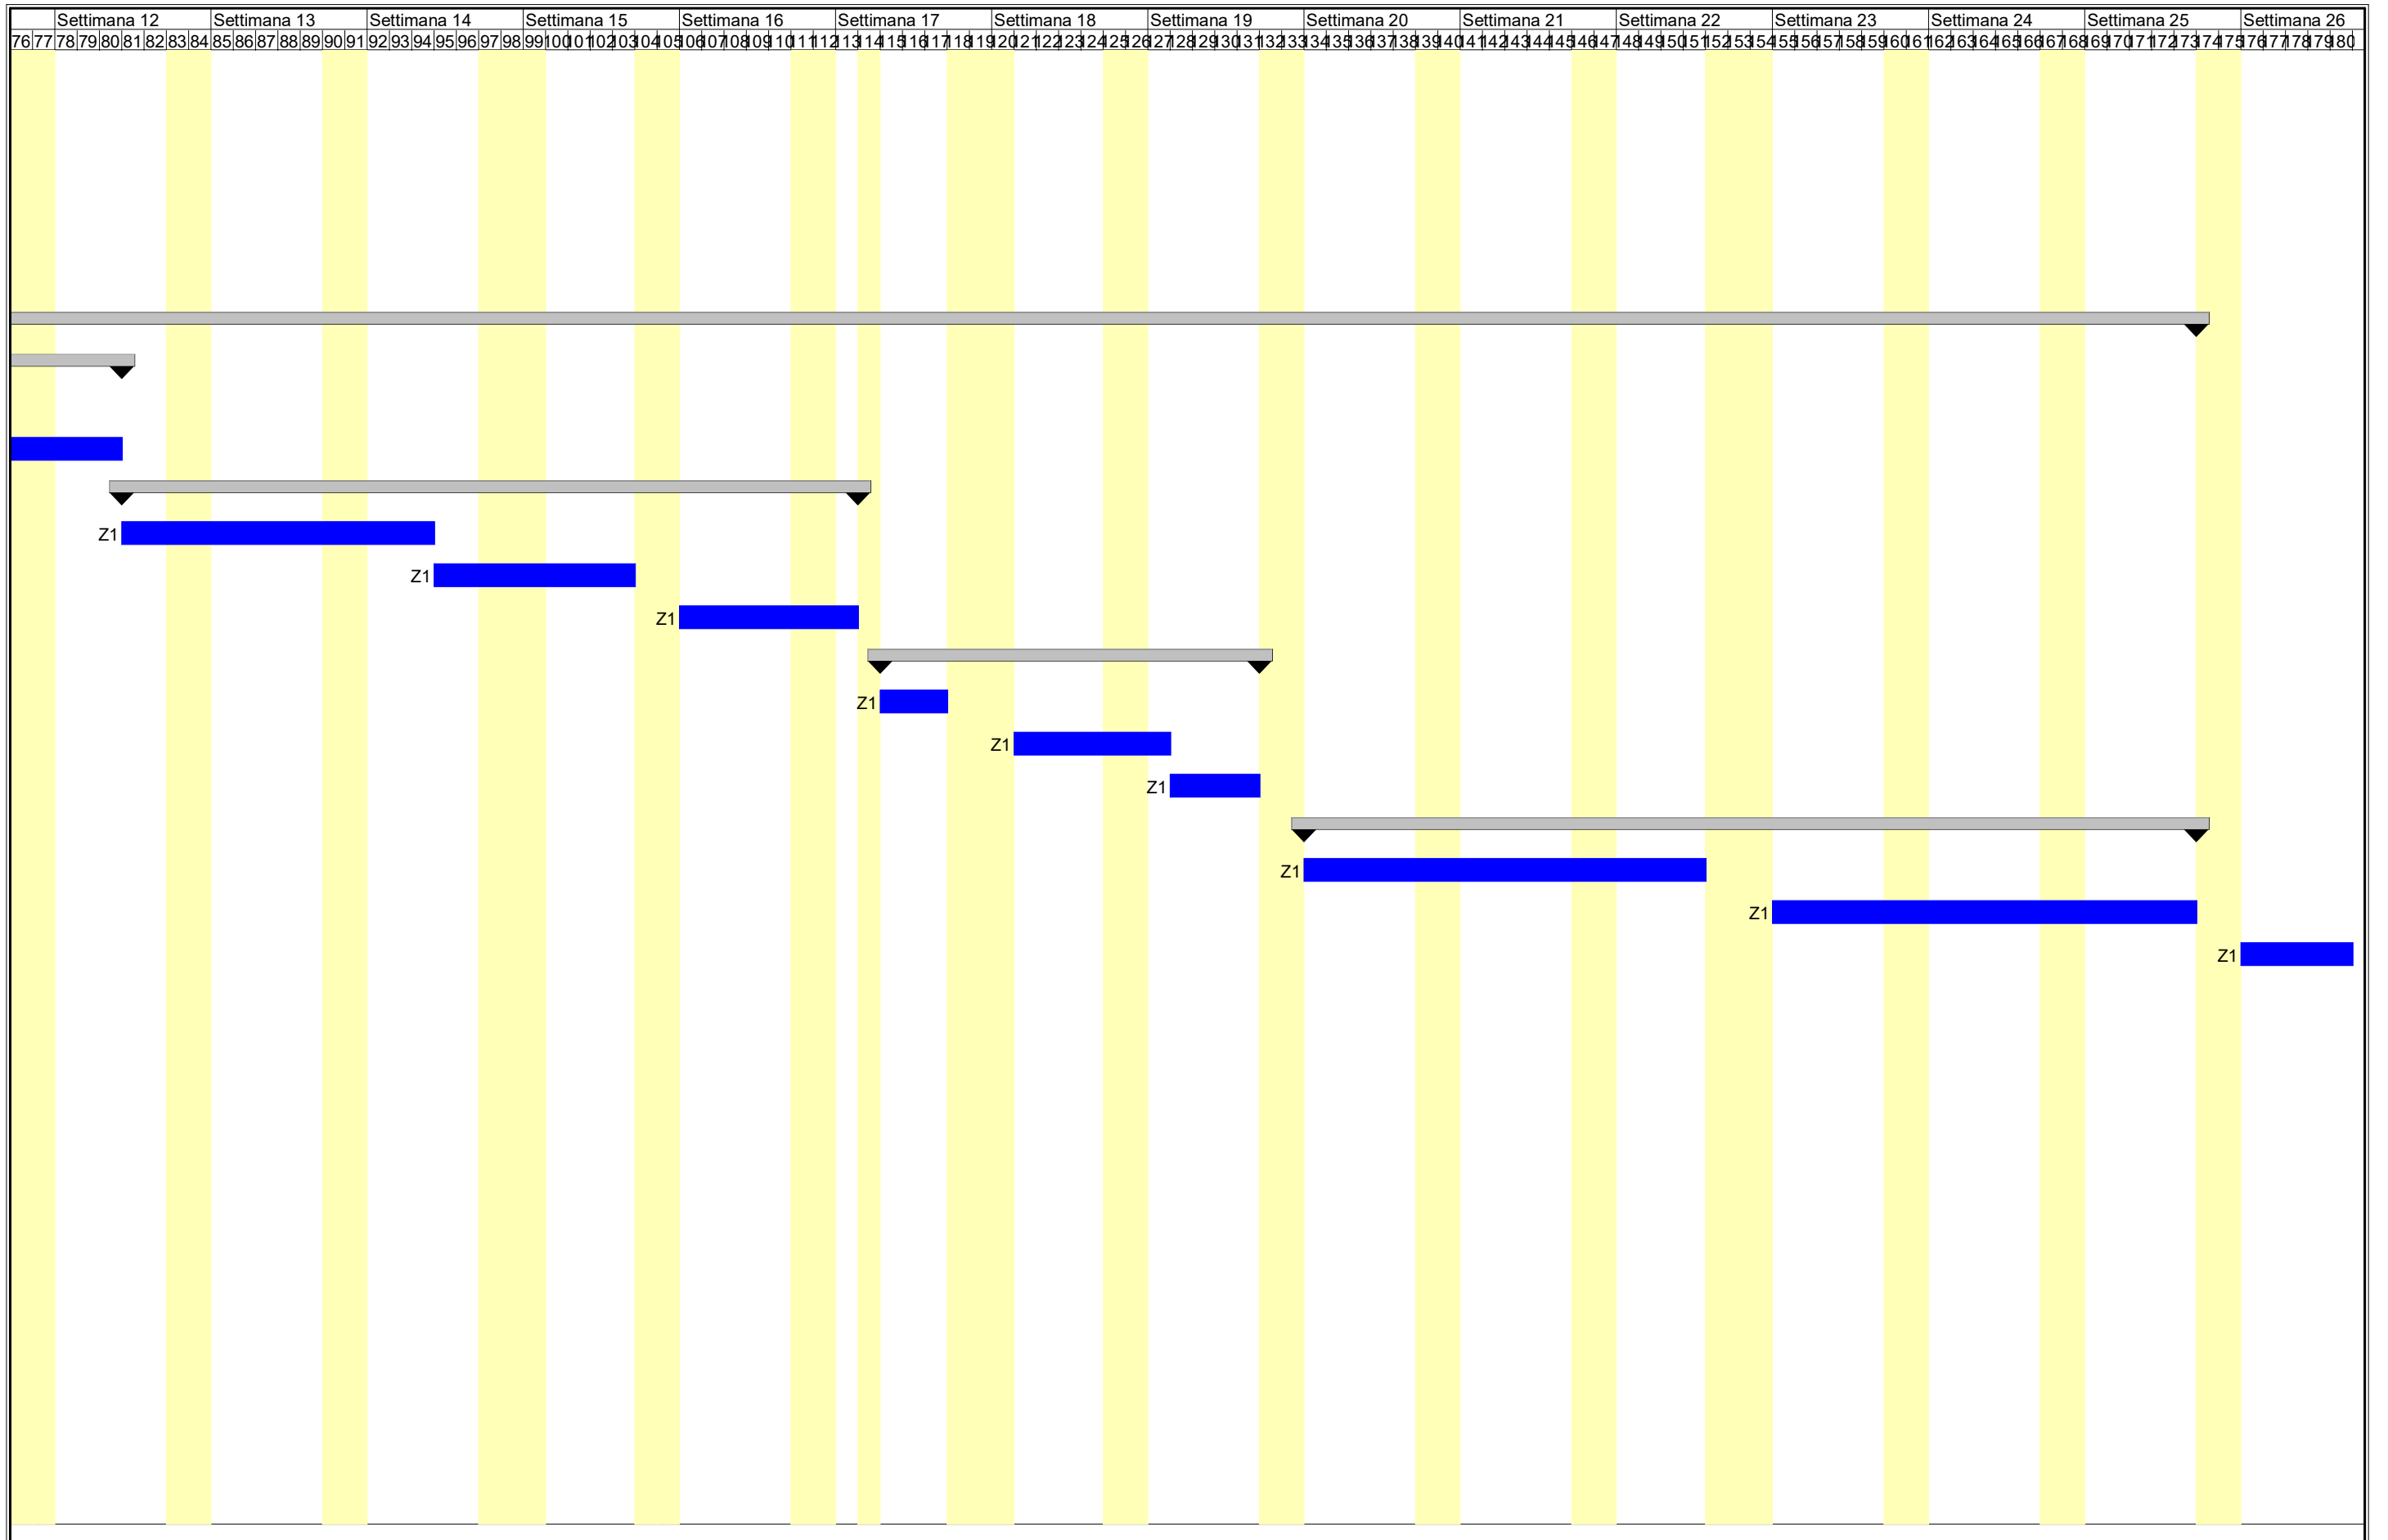

18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45																																
Settimana 27				Settimana 28				Settimana 29				Settimana 30				Settimana 31				Settimana 32				Settimana 33				Settimana 34				Settimana 35				Settimana 36				Settimana 37				Settimana 38				Settimana 39				Settimana 40				Settimana 41			

