

N. rev	Nota di revisione	Data	Firma	Controllo
D01	Emissione	15/06/2023		

Oggetto:
 PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO VIA (art. 23 del Dlgs 152/2006 ssmi) + AUR
 Comune di Sassari (SS) - "Località Tanca Beca"
 Progetto di un Impianto Fotovoltaico a Terra Potenza Nominale 143,87 MWp e Sistema di
 Accumulo Elettrochimico della Potenza Nominale di 70MW/560MWh connesso alla rete RTN

Titolo del disegno:
CRONOPROGRAMMA

Società Proponente:
 e-Solar 5 srl
 Via Augusto Gargana, 34 - Viterbo
 Tel:Fax.: +39 0761 972329; Mob.: +39 338 6316126;




Progettazione :
 Ing. Vincenzo CHIRICOTTO
 Strada Fastello, 65 - Viterbo
 Tel.Fax.: +39 0761 972329; Mob.: +39 338 6316126;
 Email: vincenzo@chiricotto.it;





R35


Data: 15/06/2023

		Nome	Durata	Awvio	Termine
1		Opere di Ingegneria	105 giorni	25/11/24 9.00	21/04/25 9.00
2		Rilievi topografici	15 giorni	25/11/24 9.00	16/12/24 9.00
3		Progetti esecutivi	30 giorni	16/12/24 9.00	27/01/25 9.00
4		Autorizzazione Enti (Geni...)	60 giorni	27/01/25 9.00	21/04/25 9.00
5		Sistemazione aree di c...	60 giorni	21/04/25 9.00	14/07/25 9.00
6		Recinzioni	15 giorni	21/04/25 9.00	12/05/25 9.00
7		Opere di cantiere	15 giorni	12/05/25 9.00	02/06/25 9.00
8		Strade e viabilità	30 giorni	02/06/25 9.00	14/07/25 9.00
9		Connessione RTN	210 giorni	27/01/25 9.00	17/11/25 9.00
10		Ingegneria	60 giorni	27/01/25 9.00	21/04/25 9.00
11		Autorizzazione Enti	60 giorni	21/04/25 9.00	14/07/25 9.00
12		Opere in SE Terna	90 giorni	14/07/25 9.00	17/11/25 9.00
13		Elettrodotto Stallo SE ...	30 giorni	14/07/25 9.00	25/08/25 9.00
14		Elettrodotto da SE Ute...	90 giorni	14/07/25 9.00	17/11/25 9.00
15		Sottostazione Utente	270 giorni	27/01/25 9.00	09/02/26 9.00
16		Ingegneria	60 giorni	27/01/25 9.00	21/04/25 9.00
17		Autorizzazione	60 giorni	21/04/25 9.00	14/07/25 9.00
18		Opere civili	60 giorni	14/07/25 9.00	06/10/25 9.00
19		Elettromeccanico	90 giorni	06/10/25 9.00	09/02/26 9.00
20		Impianto fotovoltaico	220 giorni	12/05/25 9.00	16/03/26 9.00
21		Opere civili	60 giorni	12/05/25 9.00	04/08/25 9.00
22		Posa cavi	40 giorni	04/08/25 9.00	29/09/25 9.00
23		Posa Tracker	90 giorni	29/09/25 9.00	02/02/26 9.00
24		Moduli	90 giorni	29/09/25 9.00	02/02/26 9.00
25		Posa Inverter distribuiti	30 giorni	02/02/26 9.00	16/03/26 9.00
26		Impianto Storage	112 giorni	12/05/25 9.00	15/10/25 9.00
27		Opere Civili	20 giorni	12/05/25 9.00	09/06/25 9.00
28		Opere Impiantistiche MT ...	30 giorni	09/06/25 9.00	21/07/25 9.00
29		Installazione Container B...	60 giorni	21/07/25 9.00	13/10/25 9.00
30		Collaudi	2 giorni	13/10/25 9.00	15/10/25 9.00
31		Compensazione e mitig...	30 giorni	14/07/25 9.00	25/08/25 9.00
32		Compensazione Bosco	30 giorni	14/07/25 9.00	25/08/25 9.00
33		Compensazione Fascia	30 giorni	14/07/25 9.00	25/08/25 9.00
34		Mitigazione	15 giorni	14/07/25 9.00	04/08/25 9.00

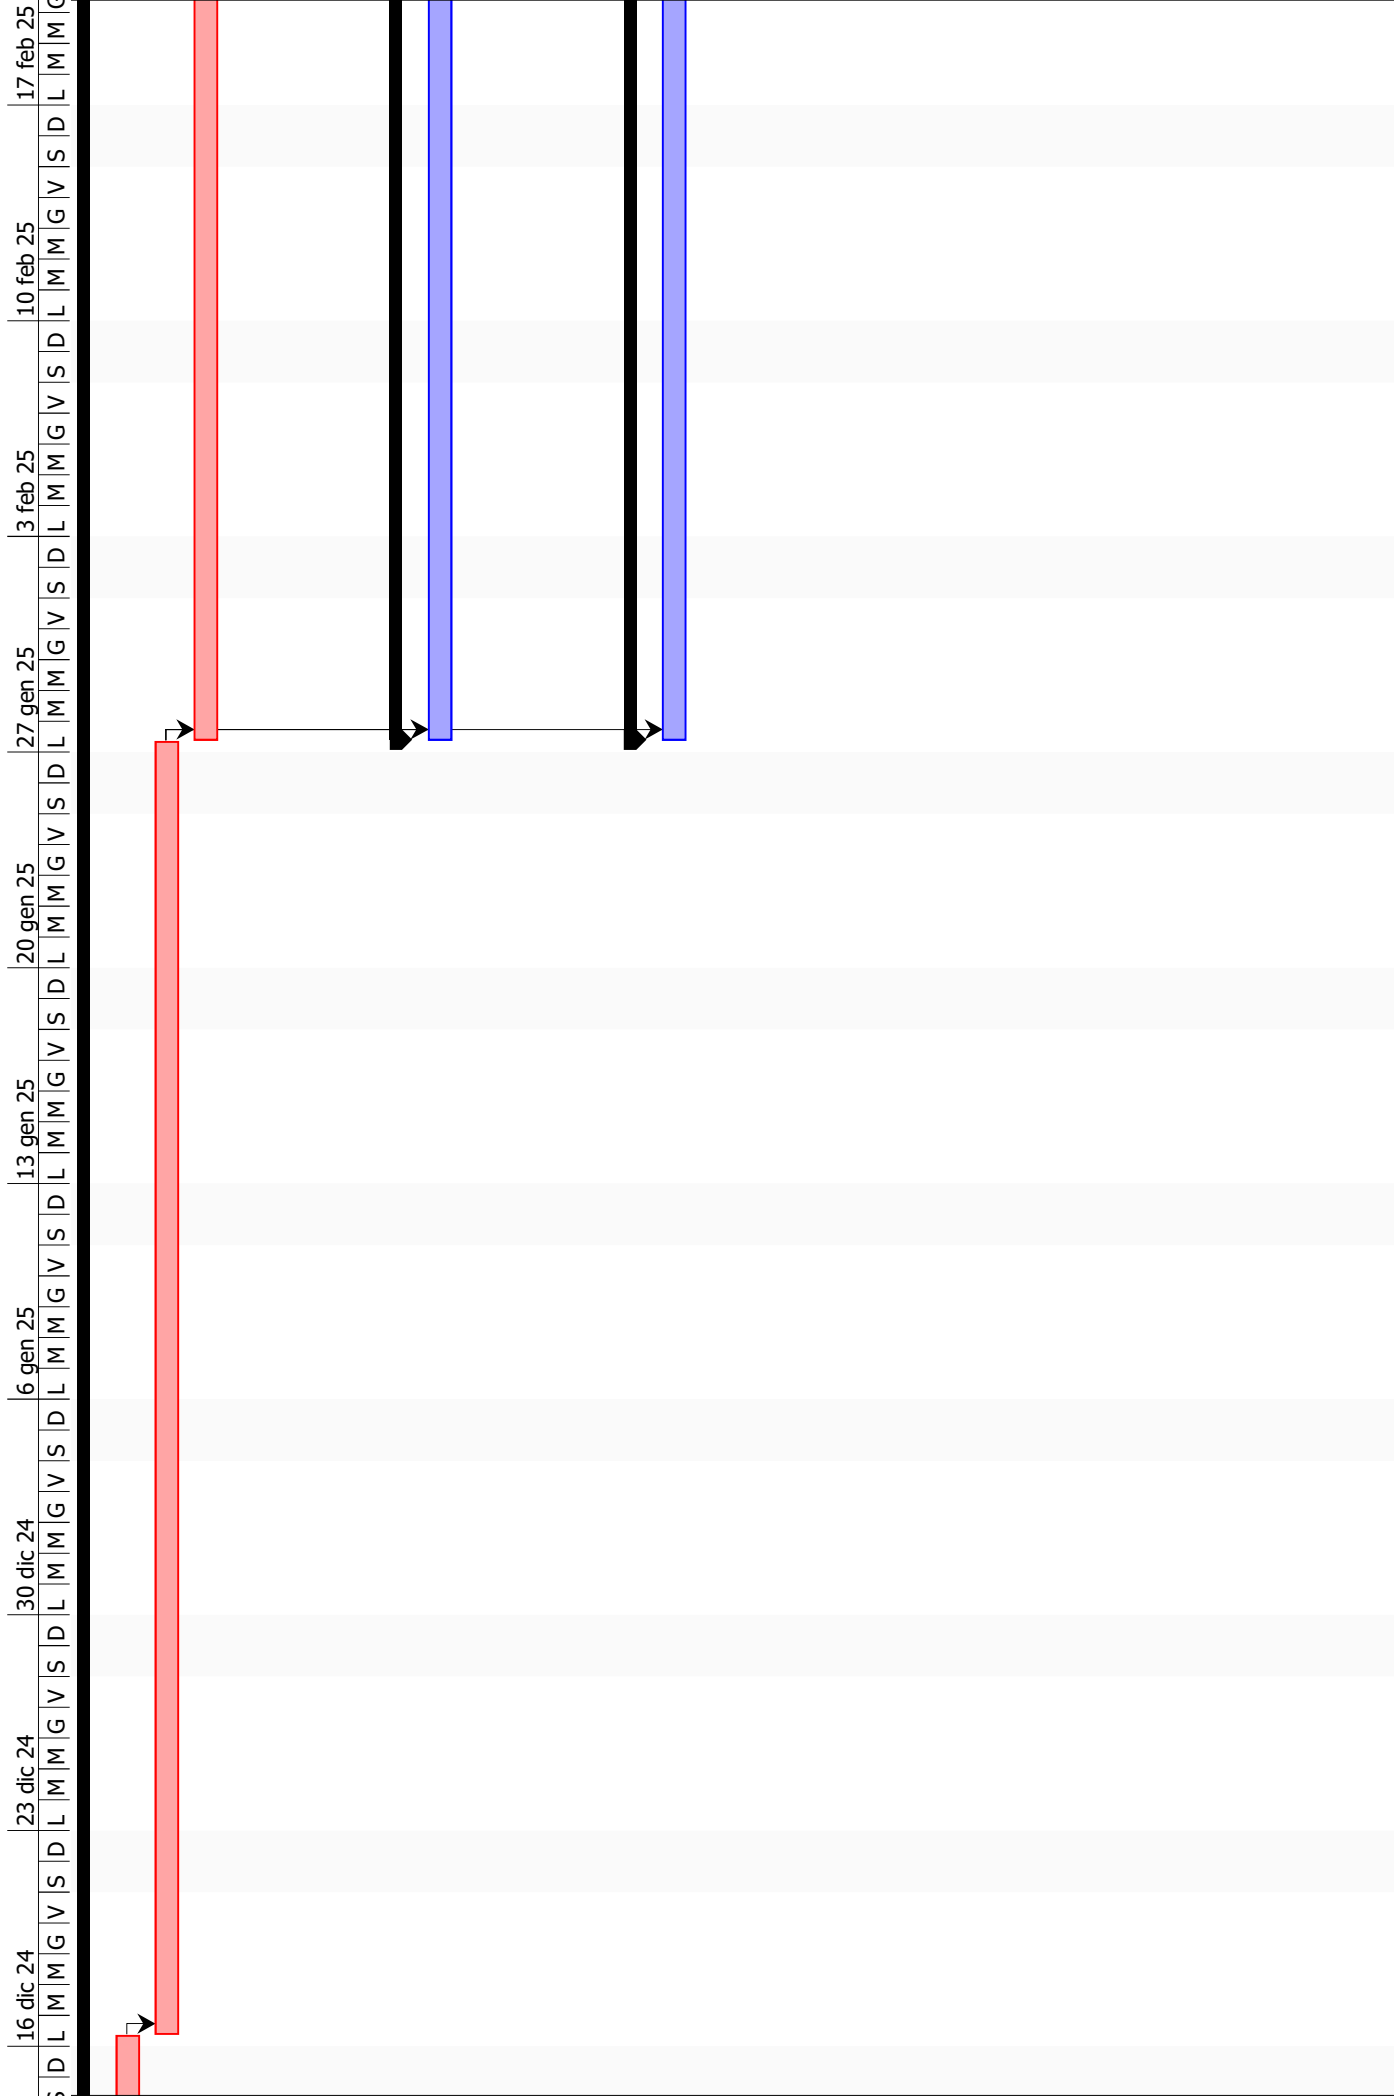


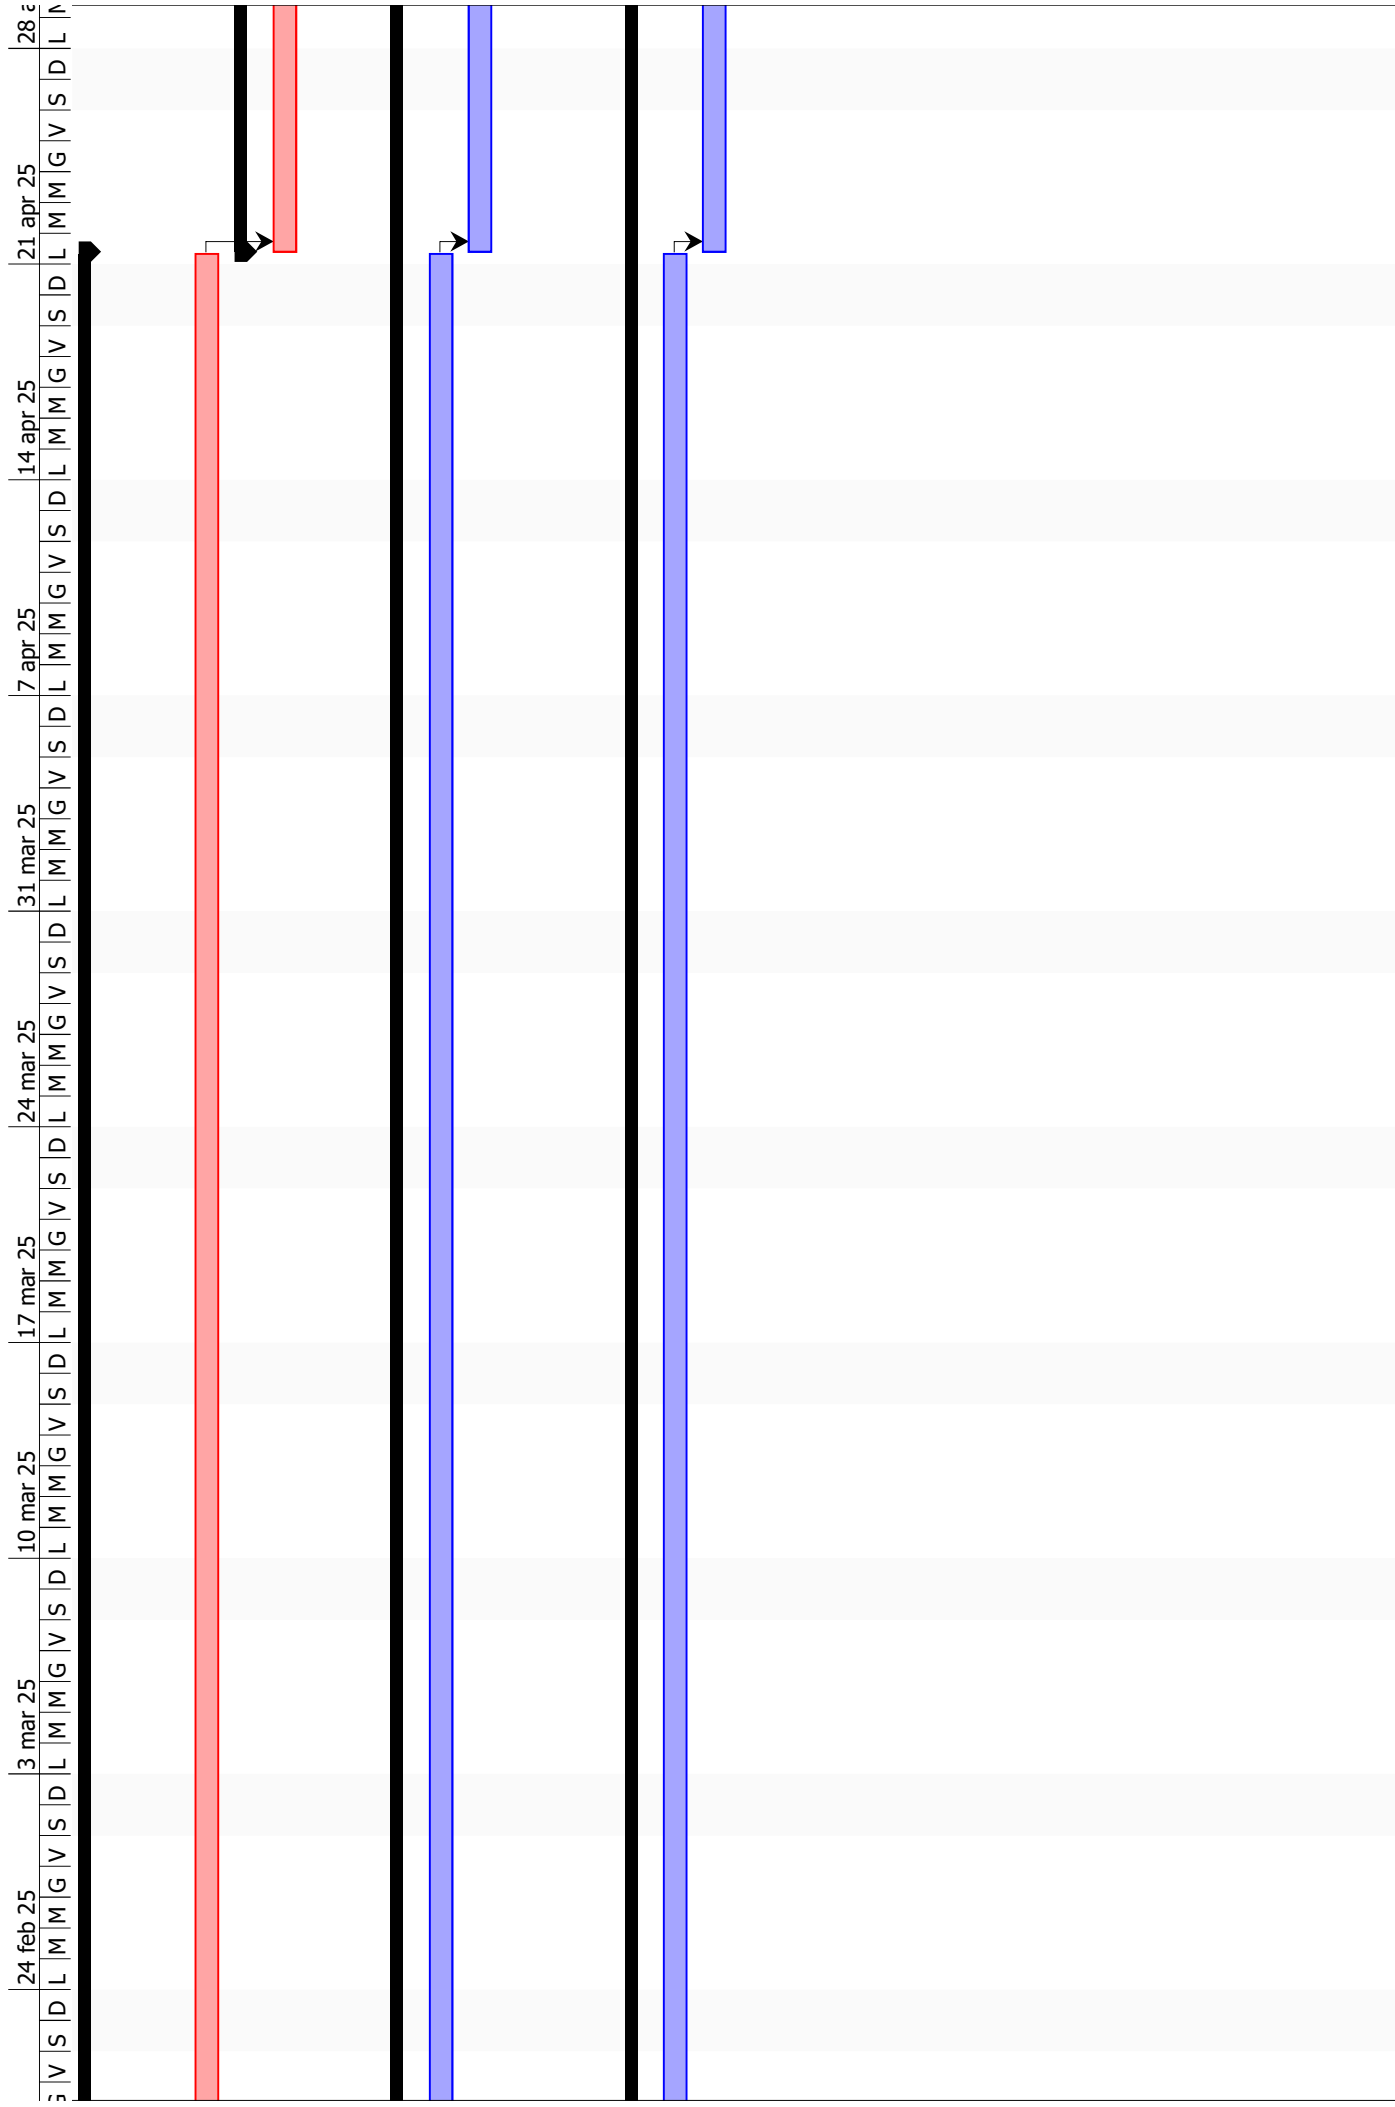

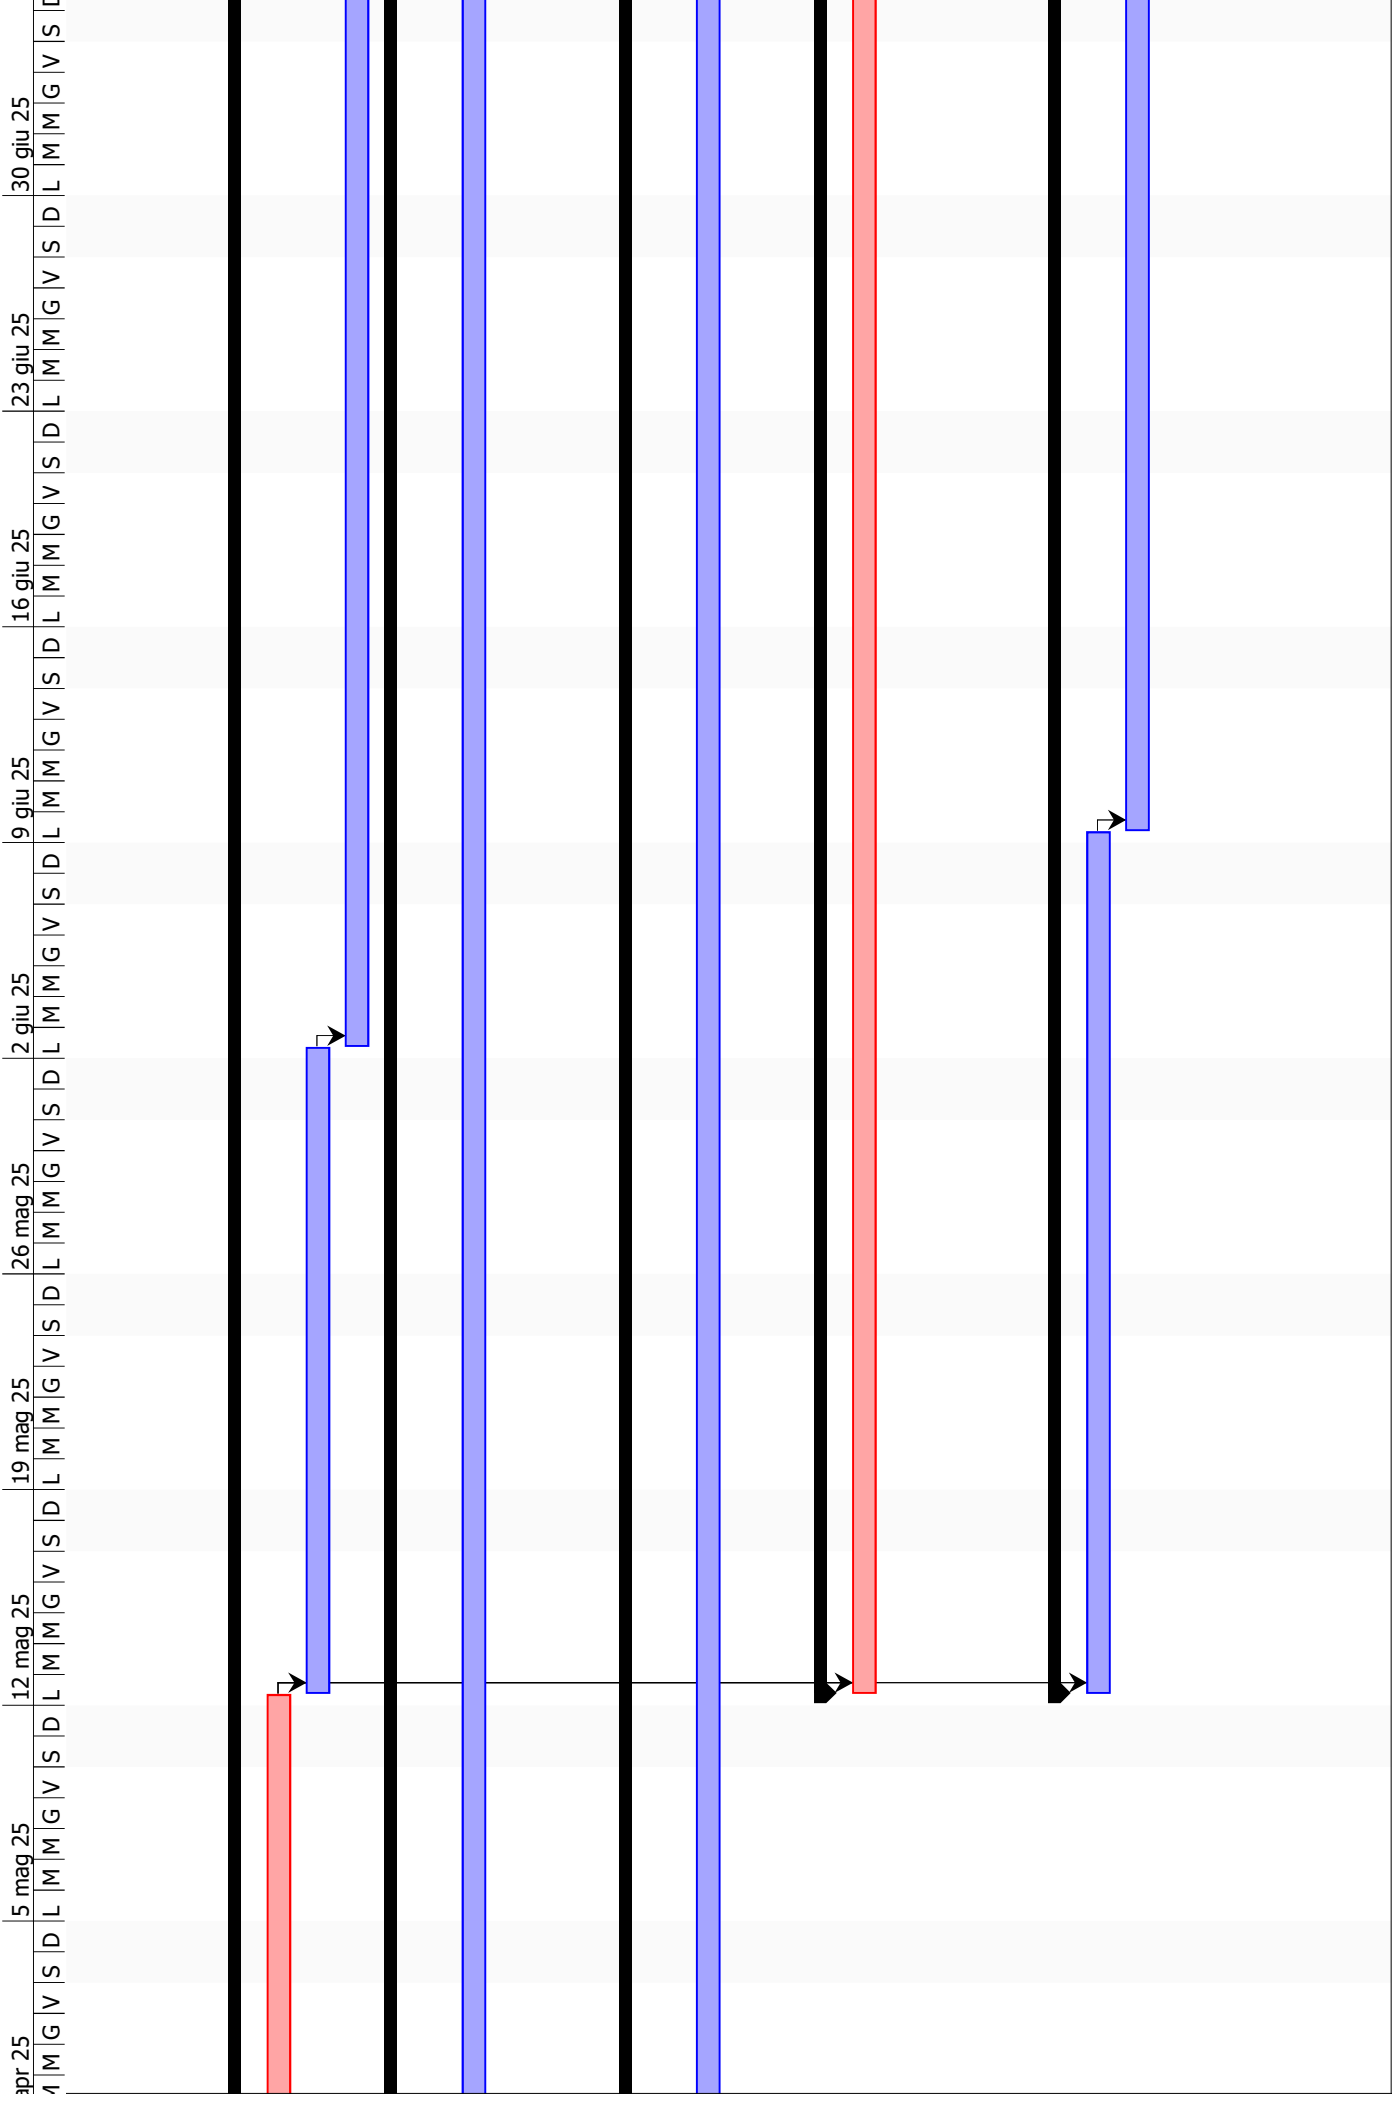

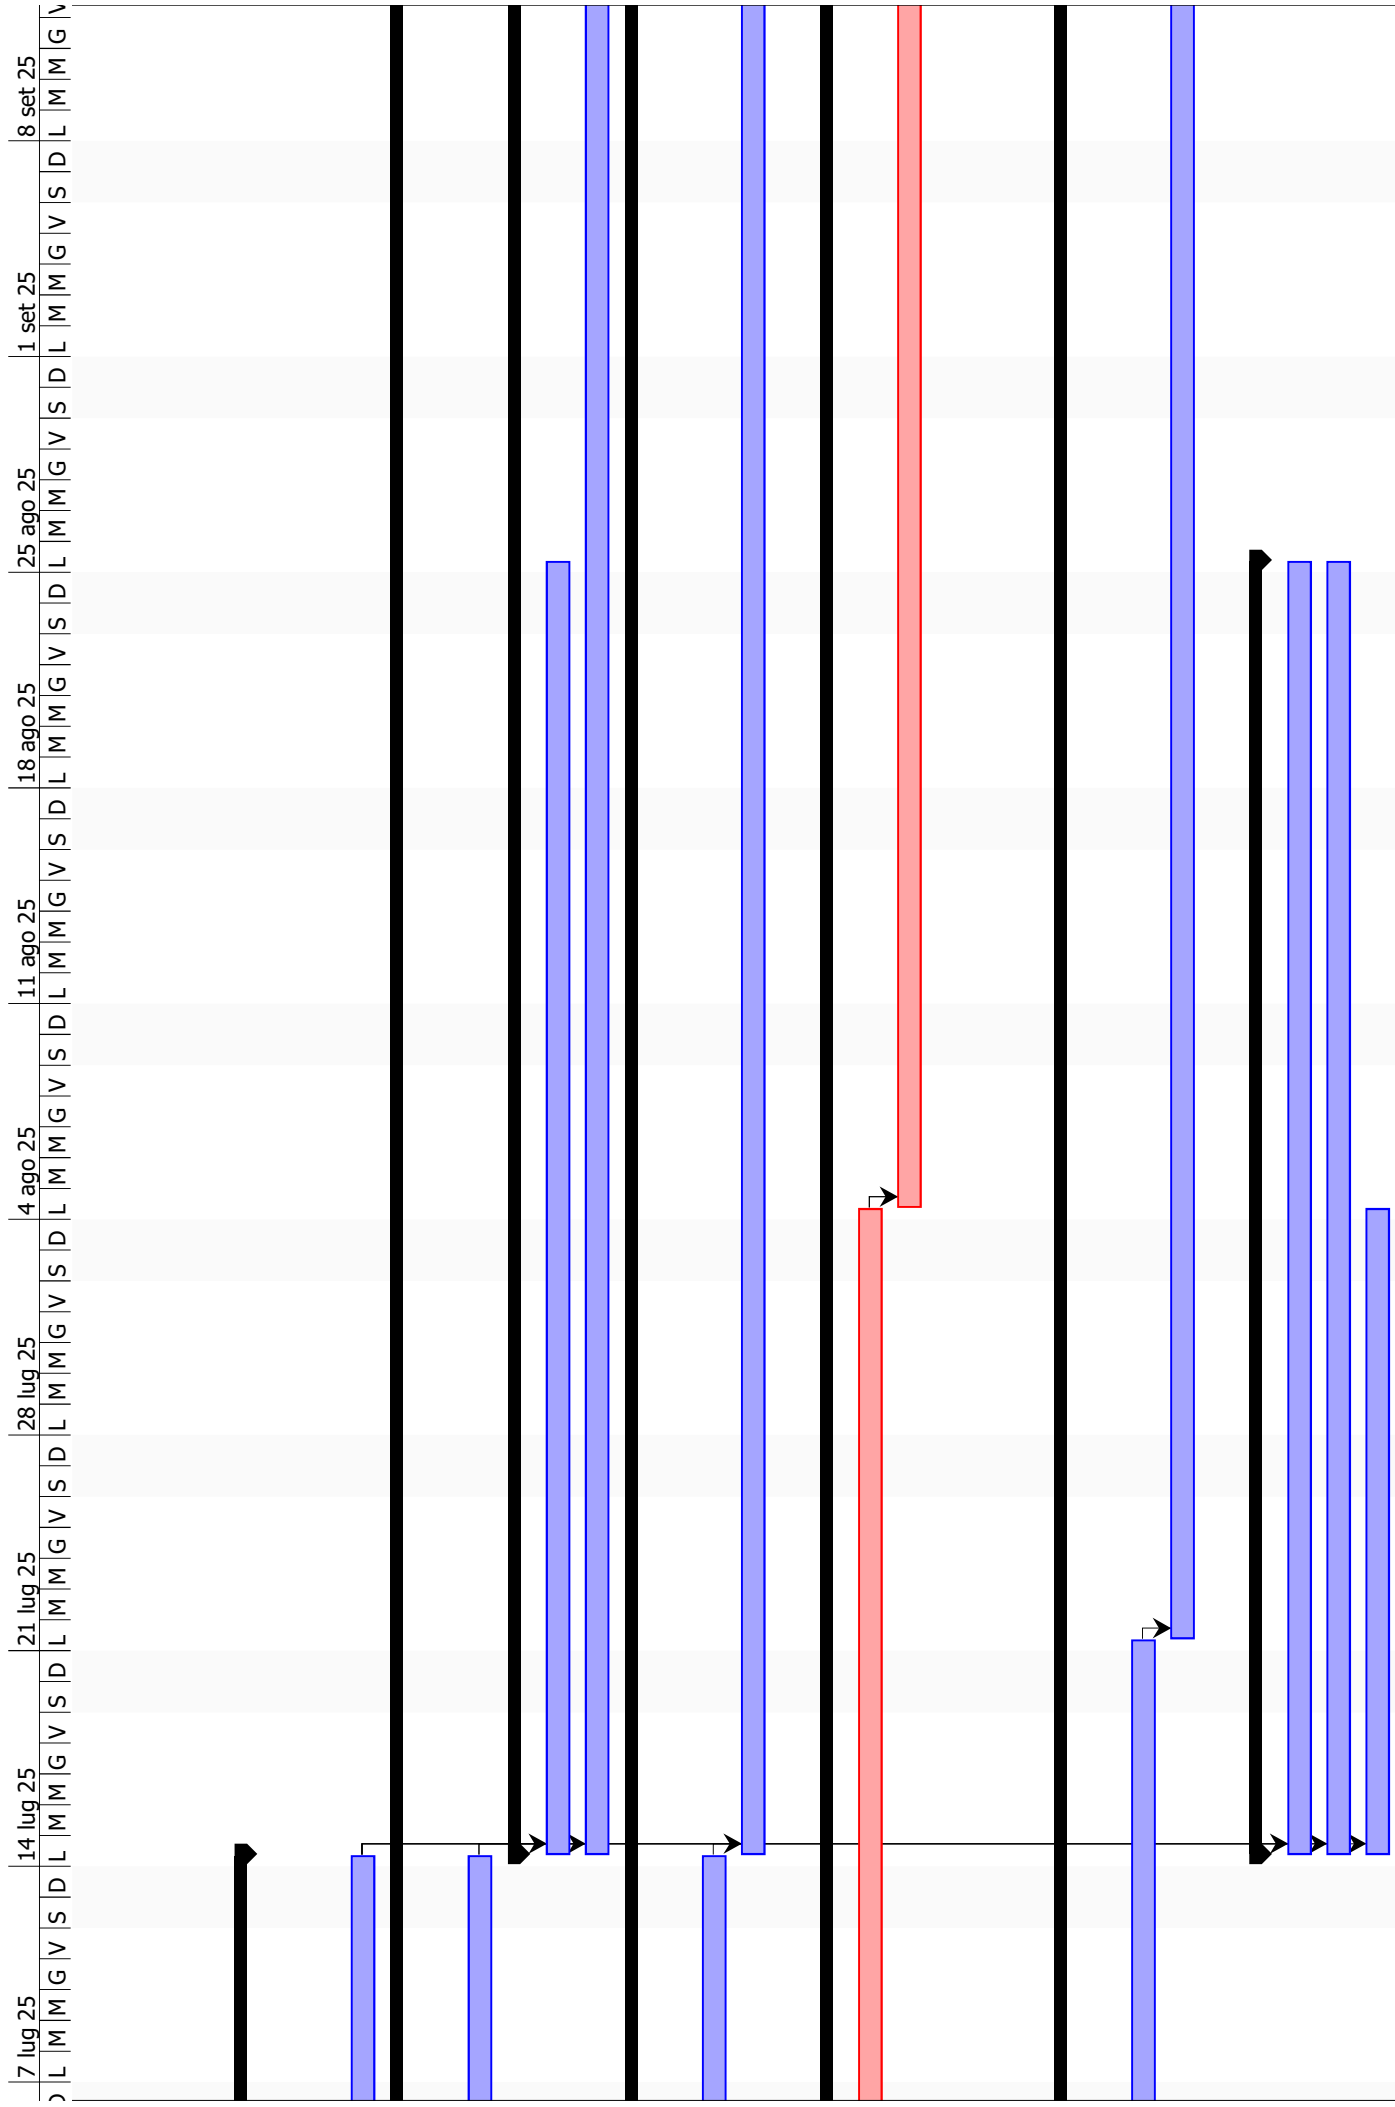

25	24 nov 25	1 dic 25	8 dic 25	15 dic 25	22 dic 25	29 dic 25	5 gen 26	12 gen 26	19 gen 26	2	
1 G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L	1 G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L	1 G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L	1 G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L	1 G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L	1 G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L	1 G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L	1 G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L	1 G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L	1 G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L	1 G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L	1 G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L

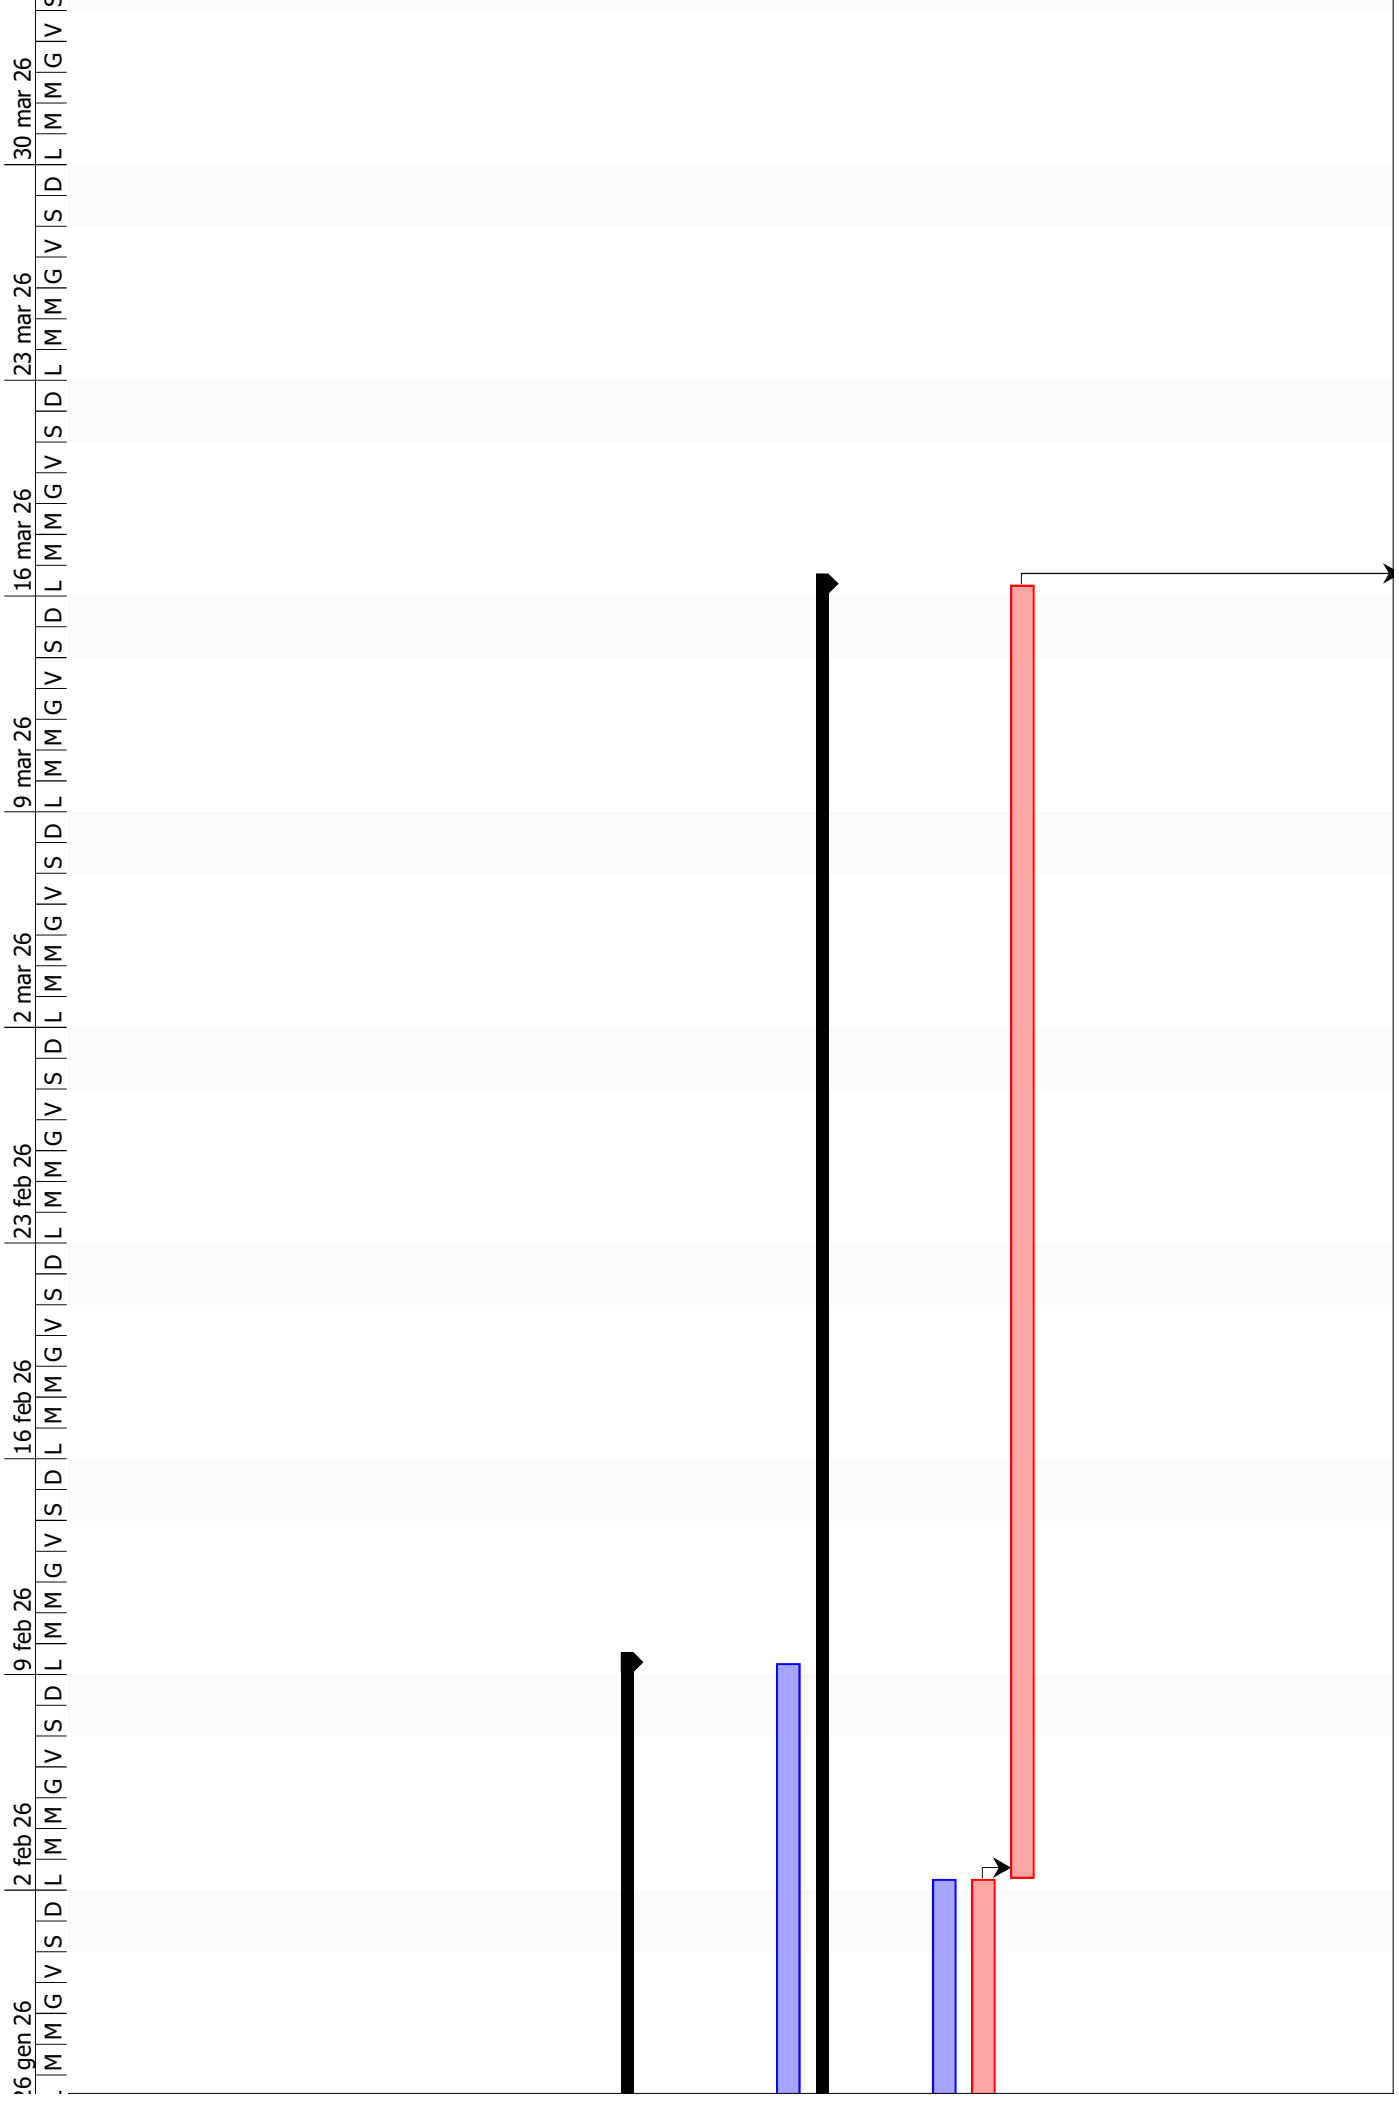

6 apr 26 | 13 apr 26
D | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V



Nome

Fine Lavori

Durata

2 giorni | 16/03/26 9.00

Avvio

18/03/26 9.00

Termine

25 nov 24							2 dic 24							9 dic 24													
M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L

7 lug 25	14 lug 25	21 lug 25	28 lug 25	4 ago 25	11 ago 25	18 ago 25	25 ago 25	1 set 25	8 set 25																		
L	M	G	V	S	D	L	M	G	V	S	D	L	M	G	V	S	D	L	M	G	V	S	D	L	M	G	V

25	1	24 nov 25	1	dic 25	8	dic 25	15	dic 25	22	dic 25	29	dic 25	5	gen 26	12	gen 26	19	gen 26	2							
1	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L
4	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L

06 gen 26	2 feb 26	9 feb 26	16 feb 26	23 feb 26	2 mar 26	9 mar 26	16 mar 26	23 mar 26	30 mar 26
M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S	L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S	L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S	L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S	L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S	L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S	L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S	L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S	L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S	L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S
							18/03		

6 apr 26	13 apr 26
D L M M G V S D L M M G V	
