

Integrale ricostruzione dell'impianto eolico VRG-040

Progetto definitivo

Oggetto:

040-14 – Cronoprogramma

Proponente:

VRG wind 040

VRG Wind 040 S.r.l.
Via Algardi 4
Milano (MI)

Progettista:

 **Stantec**

Stantec S.p.A.
Centro Direzionale Milano 2, Palazzo Canova
Segrate (Milano)

Rev. N.	Data	Descrizione modifiche	Redatto da	Rivisto da	Approvato da
01	13/01/2023	Integrati Commenti	A. Bellisai	M. Carnevale	P. Polinelli

Fase progetto: Definitivo	Formato elaborato: A4
----------------------------------	------------------------------

Nome File: **040-14.01 - Cronoprogramma.docx**

1 PREMESSA


Il cronoprogramma prevede l'integrale ricostruzione dell'impianto eolico VRG040 in circa 23 mesi.

Nella fase iniziale si prevede la dismissione dell'impianto eolico esistente, per poi proseguire con la realizzazione del nuovo impianto tramite la realizzazione dei vari tratti di viabilità interna all'impianto e delle piazzole, operazione finalizzata in parallelo alla costruzione delle fondazioni e alla stesura dei cavidotti MT. Il tutto è effettuato secondo un'opportuna sequenza determinata da esigenze tecniche e con il fine di ottimizzare i lavori di costruzione e le relative tempistiche.

Si considera l'inizio dei lavori di adeguamento della sottostazione elettrica utente dal quattordicesimo mese dall'apertura del cantiere, per includere i tempi standard di consegna della componentistica elettrica. Analogamente, si prevede l'inizio dell'installazione degli aerogeneratori dal diciassettesimo mese dall'apertura del cantiere, tenendo in considerazione sia i tempi di consegna degli aerogeneratori sia i tempi di costruzione delle opere civili ed elettriche.

La fase finale di realizzazione include il commissioning e l'avviamento degli aerogeneratori.

Per poter rispettare la durata del cantiere di 23 mesi, è necessario che l'emissione degli ordini di acquisto delle principali forniture ed apparecchiature debba avvenire con tempi coerenti con le date di consegna previste nel cronoprogramma.

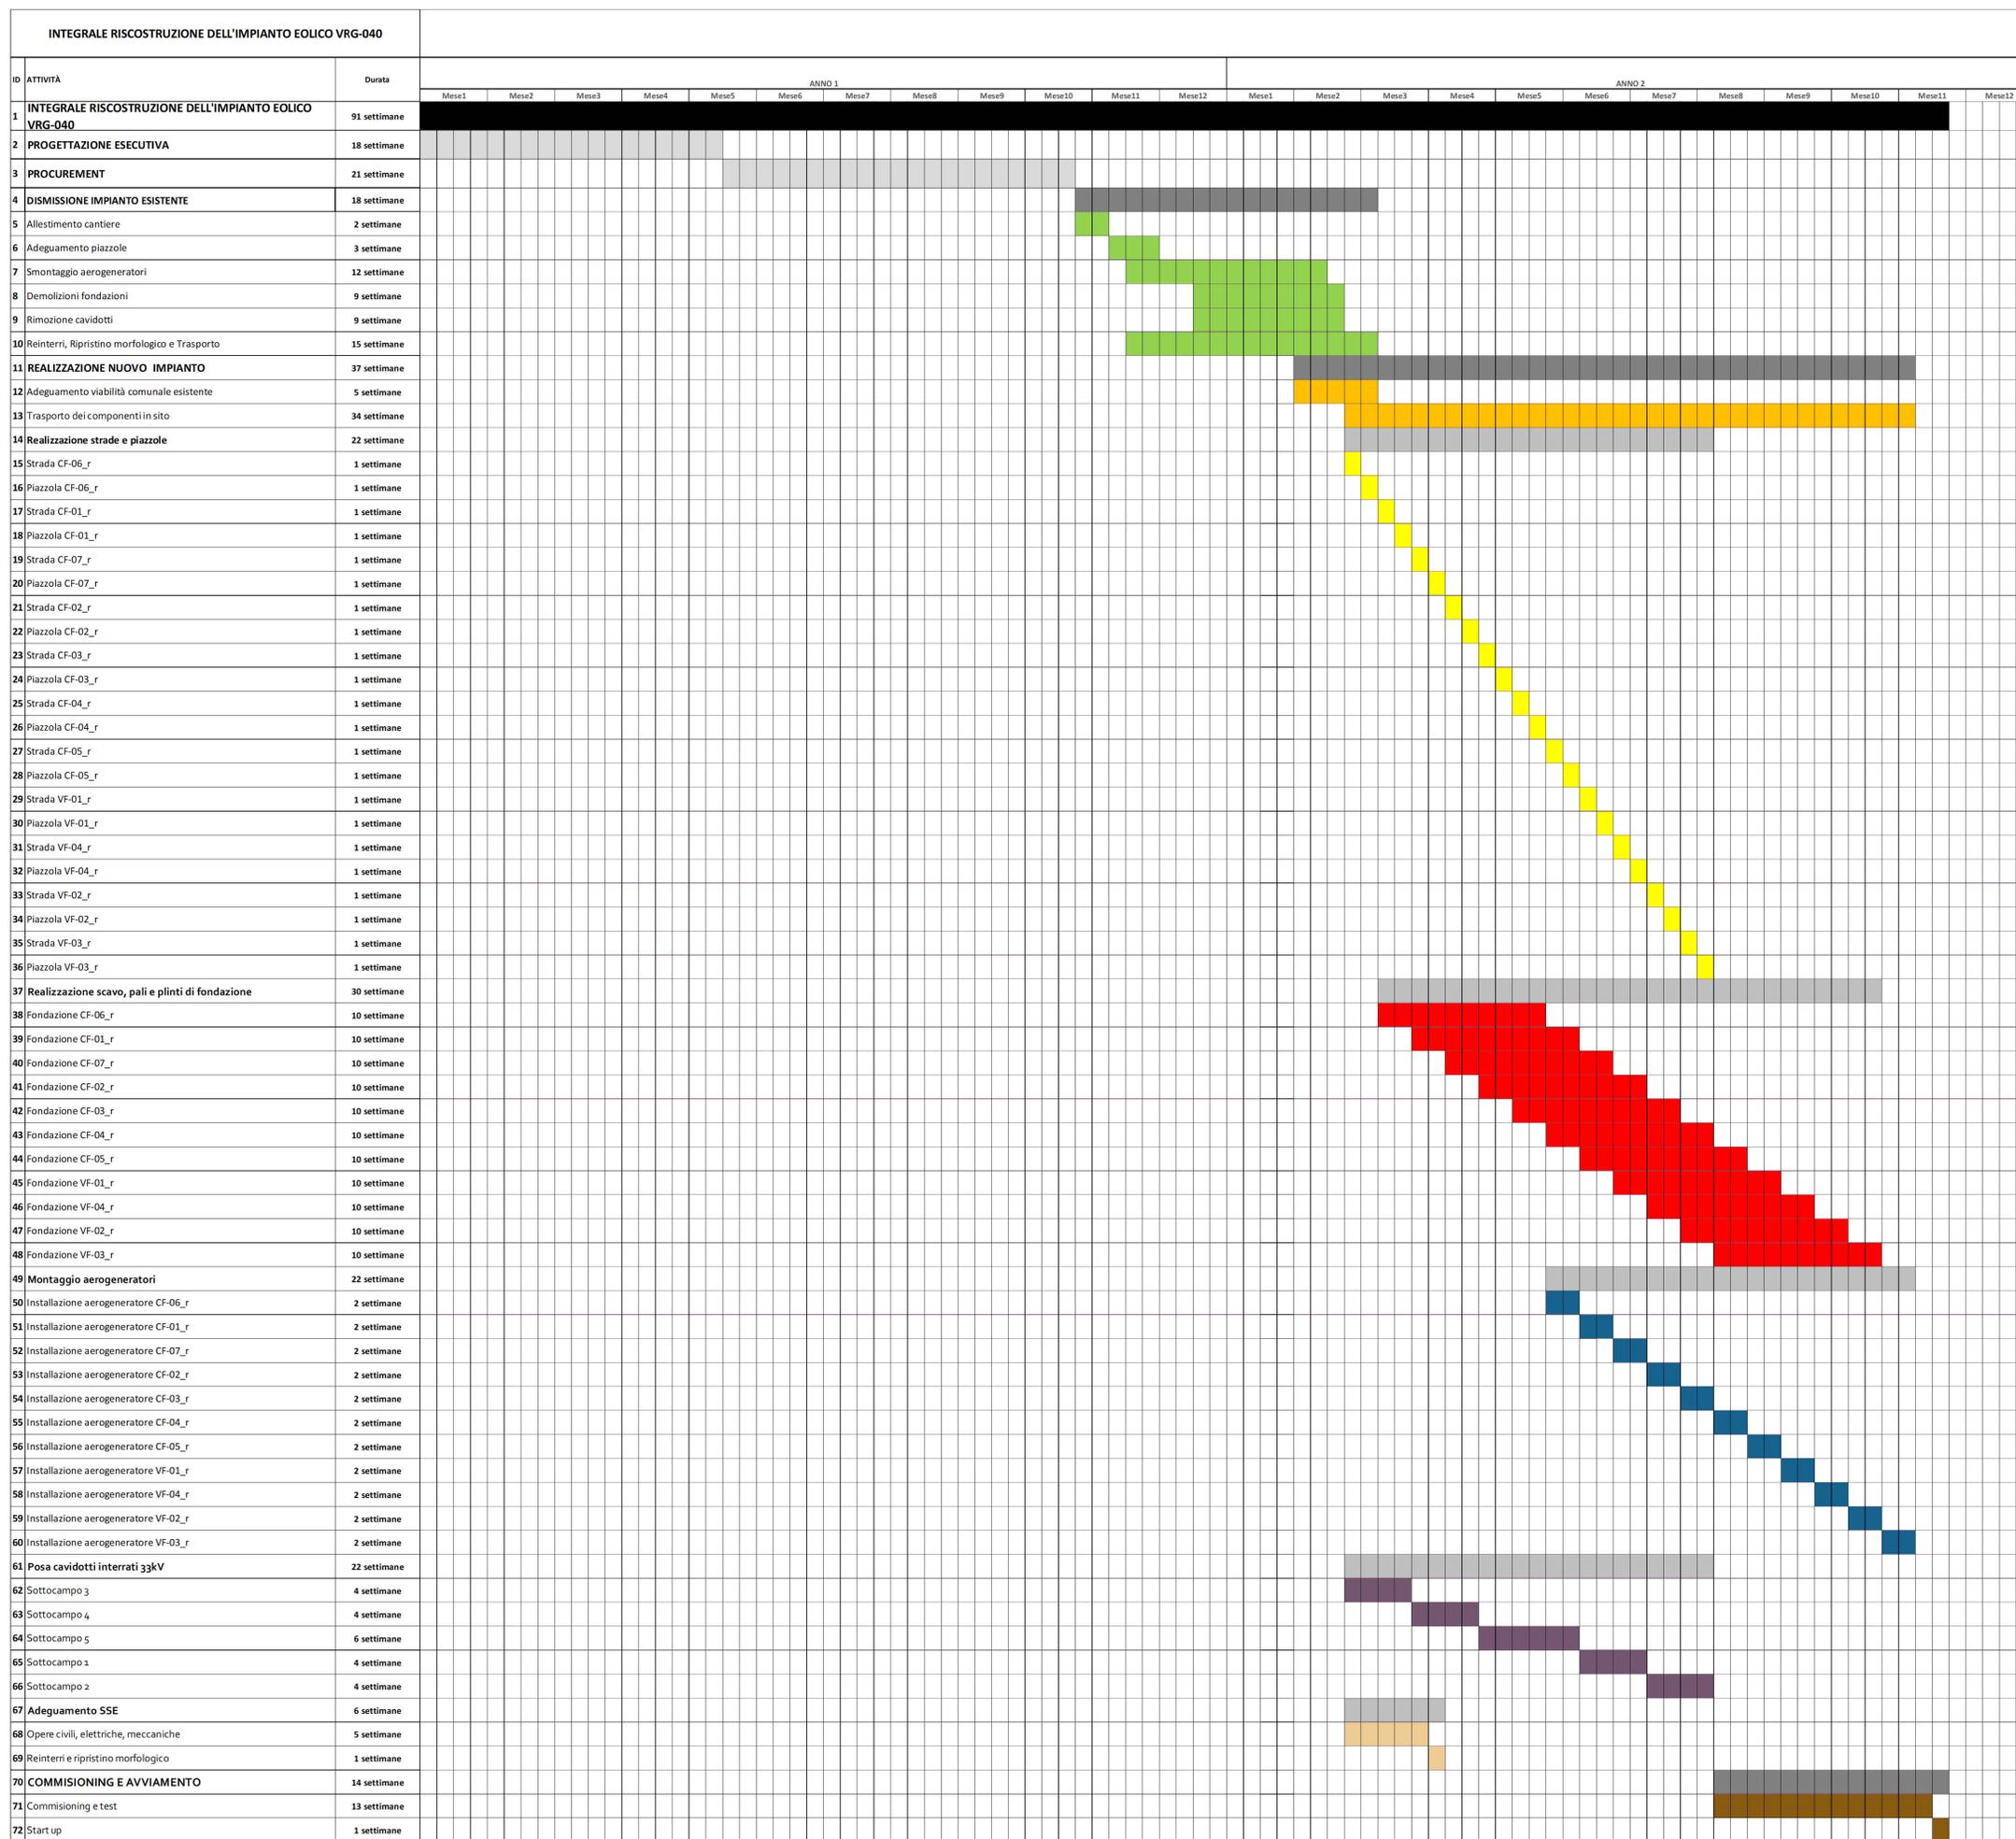

INTEGRALE RISCOSTRUZIONE DELL' IMPIANTO EOLICO VRG-040

Oggetto: 040-14 - Cronoprogramma

<p>Proponente:</p>  <p>VRG Wind 040 S.r.l. Via Algardi n.4, Milano (MI)</p>	<p>Progettista:</p>  <p>Stantec S.p.A. Centro Direzionale Milano 2 Palazzo Canova -20090 Segrate (Milano) Tel: +39 02 94757240 www.stantec.com</p>
---	--

01	INTEGRATI COMMENTI	A. BELLISAI	M. CARNEVALE	P. POLINELLI	13/01/2023
Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato	Data
	Fase di progetto: Definitivo	Pagina: 1/1	Formato Elaborato: A0	Scala: VARIE	
