

ISTANZA VIA
Presentata al
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
e al Ministero della Cultura
(Art. 23 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii
Art. 12 del D. Lgs. 387/03 e ss. mm. ii.)

PROGETTO

IMPIANTO AGRIVOLTAICO

POTENZA NOMINALE (DC) 44 MWp

Comune di Chiamonti (SS)

PIANO DI DISMISSIONE

22-00048-IT-CHM_CV-R04

PROPONENTE:

TEP RENEWABLES (CHIARAMONTI PV) SRL
Piazzale Giulio Douhet, 25 – 00143 – Roma (RM)
P. IVA e C.F. 16882211002 – REA RM – 1681813

PROGETTISTI:

ING. MATTEO BERTONERI
Iscritto all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 669 sez. A

Data	Rev.	Tipo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
21/07/2023	0	Prima Emissione	A.Sirigu	G.Giombini	G.De Gennaro

	IMPIANTO AGRIVOLTAICO POTENZA NOMINALE (DC) 44 MWp Comune di Chiaramonti (SS)	Rev.	0
	22-00048-IT-CHM_CV-R04 PIANO DI DISMISSIONE	Pag.	2 di 12

INDICE

1	PREMESSA	3
1.1	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	3
2	DESCRIZIONE GENERALE IMPIANTO IN DISMISSIONE	6
2.1	STRUTTURA DI SUPPORTO E DI SOSTEGNO	6
2.1.1	<i>Tracker.....</i>	6
3	DISMISSIONE CAMPO FOTOVOLTAICO.....	8
3.1	DISMISSIONE STRUTTURE TECNOLOGICHE	8
3.1.1	<i>Rimozione dei cablaggi fra le stringhe, smontaggio e smaltimento dei moduli fotovoltaici.....</i>	8
3.1.2	<i>Rimozione e smaltimento strutture di sostegno e dei pali</i>	9
3.1.3	<i>Rimozione e smaltimento cabine e locali tecnici.....</i>	9
3.1.4	<i>Smantellamento e demolizione opere civili</i>	9
3.1.5	<i>Rimozione e smantellamento cavi , canalette e tubazioni passacavi</i>	9
3.1.6	<i>Rimozione e smantellamento recinzioni ed ausiliari.....</i>	10
3.1.7	<i>Sistemazione delle mitigazioni e del terreno per messa a coltura del terreno.....</i>	10
3.1.8	<i>Classificazione dei rifiuti.....</i>	10
4	COMPUTO COSTI DI DISMISSIONE	11
5	CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI DISMISSIONE	12

	IMPIANTO AGRIVOLTAICO POTENZA NOMINALE (DC) 44 MWp Comune di Chiamonti (SS)	Rev.	0
	22-00048-IT-CHM_CV-R04 PIANO DI DISMISSIONE	Pag.	3 di 12

1 PREMESSA

Il progetto in questione prevede la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico di potenza nominale pari a 44.00 MWp da realizzare in regime agrivoltaico nel territorio comunale di Chiamonti (SS), per l'installazione del campo fotovoltaico e dell'interconnessione alla RTN, su un'area pari a 105.89 ha, di cui circa 47.58 ha recintati utili per l'installazione del campo fotovoltaico. Il progetto nel suo complesso ha contenuti economico-sociali importanti e tutti i potenziali impatti sono stati sottoposti a mitigazione.

Nel caso di studio, le strutture sono posizionate in modo tale da consentire lo sfruttamento agricolo ottimale del terreno. I pali di sostegno sono distanziati tra loro in modo da permettere il mantenimento e il miglioramento dell'attuale destinazione agricola prevalentemente di tipo zootecnico, opportunamente integrata con la coltivazione di specie foraggere da pascolo. Di fatto, il posizionamento dei moduli fotovoltaici e la giusta alternanza tra strutture, nel rispetto della geomorfologia dei luoghi coinvolti, garantisce la giusta illuminazione al terreno, mentre i pannelli sono distribuiti in maniera da limitare al massimo l'ombreggiamento, così da assicurare una perdita pressoché nulla del rendimento annuo in termini di produttività dell'impianto in oggetto e la massimizzazione dell'uso agronomico del suolo coinvolto.

L'impianto fotovoltaico sarà tecnicamente connesso alla Nuova SE di trasformazione della RTN 150/36 kV, mediante cavo interrato AT che si estenderà per un percorso di circa 11.94 km, massimamente lungo la viabilità pubblica.

Al termine della sua vita utile, prevista di 30 anni dall'entrata in esercizio, l'impianto sarà interamente smantellato e l'area sarà restituita come si presenta allo stato di fatto attuale.

A conclusione della fase di esercizio dell'impianto, seguirà quindi la fase di "decommissioning", dove le varie parti dell'impianto verranno separate in base alla caratteristica del rifiuto/materia prima, in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi.

I restanti rifiuti che non potranno essere né riciclati né riutilizzati, stimati in un quantitativo dell'ordine dell'1%, verranno inviati alle discariche autorizzate.

Per dismissione e ripristino si intendono tutte le azioni volte alla rimozione e demolizione delle strutture tecnologiche a fine produzione, il recupero e lo smaltimento dei materiali di risulta e le operazioni necessarie a ricostituire la superficie alle medesime condizioni esistenti prima dell'intervento di installazione dell'impianto.

In particolare, le operazioni di rimozione e demolizione delle strutture, nonché recupero e smaltimento dei materiali di risulta, verranno eseguite applicando le migliori e più evolute metodiche di lavoro e tecnologie a disposizione, in osservazione delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti.

1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'area di intervento comprensiva di tutte le opere di progetto è ubicata nel territorio comunale di Chiamonti (SS). L'area di impianto fotovoltaico, come anche una parte del cavidotto AT, è ubicata all'interno del comune di Chiamonti, a circa 1.2 km a Sud dal centro abitato e a circa 22 km dal mare. L'altra parte del cavidotto AT ricade all'interno del comune di Ploaghe, all'interno del ricade la Nuova SE RTN 150/36 kV.

	IMPIANTO AGRIVOLTAICO POTENZA NOMINALE (DC) 44 MWp Comune di Chiamonti (SS)	Rev.	0
	22-00048-IT-CHM_CV-R04 PIANO DI DISMISSIONE	Pag.	4 di 12

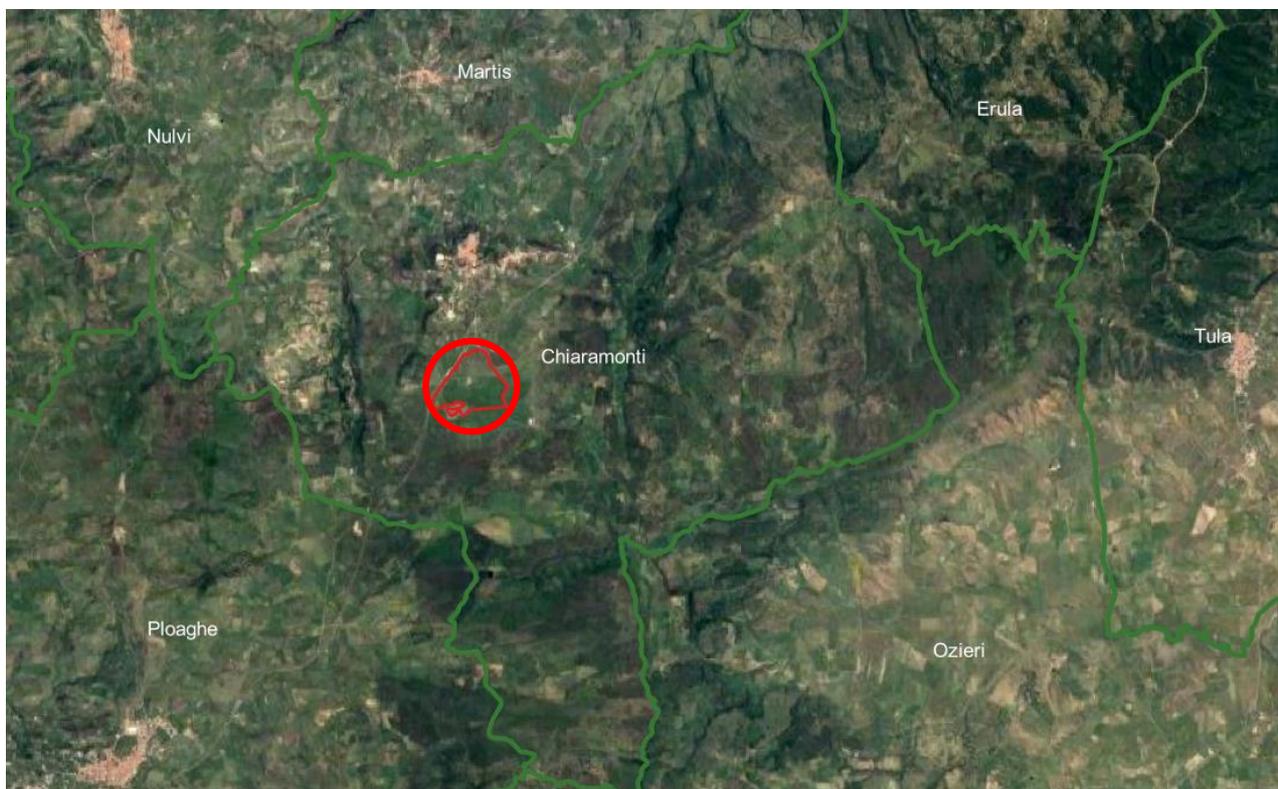


Figura 1-1: Localizzazione dell'area di intervento

L'area sede dell'impianto fotovoltaico, di potenza nominale 44.00 MWp, risulta essere pari a 105.89 ha di cui circa 47.58 ha dell'area recintata, utili per l'installazione del campo fotovoltaico.

L'impianto fotovoltaico sarà tecnicamente connesso alla Nuova SE mediante cavo interrato AT che si estenderà per un percorso di circa 11.94 km, massimamente lungo la viabilità pubblica.

L'allaccio alla Stazione Elettrica avverrà in antenna a 36 kV, con un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione 380/220/150 kV della RTN di "Codrongianos".

Per il dettaglio si rimanda all'elaborato d'Inquadramento catastale impianto "22-00048-IT-CHM_PG-T07_0", di cui viene riportato un estratto nella figura seguente:

	IMPIANTO AGRIVOLTAICO POTENZA NOMINALE (DC) 44 MWp Comune di Chiamonti (SS)	Rev.	0
	22-00048-IT-CHM_CV-R04 PIANO DI DISMISSIONE	Pag.	5 di 12

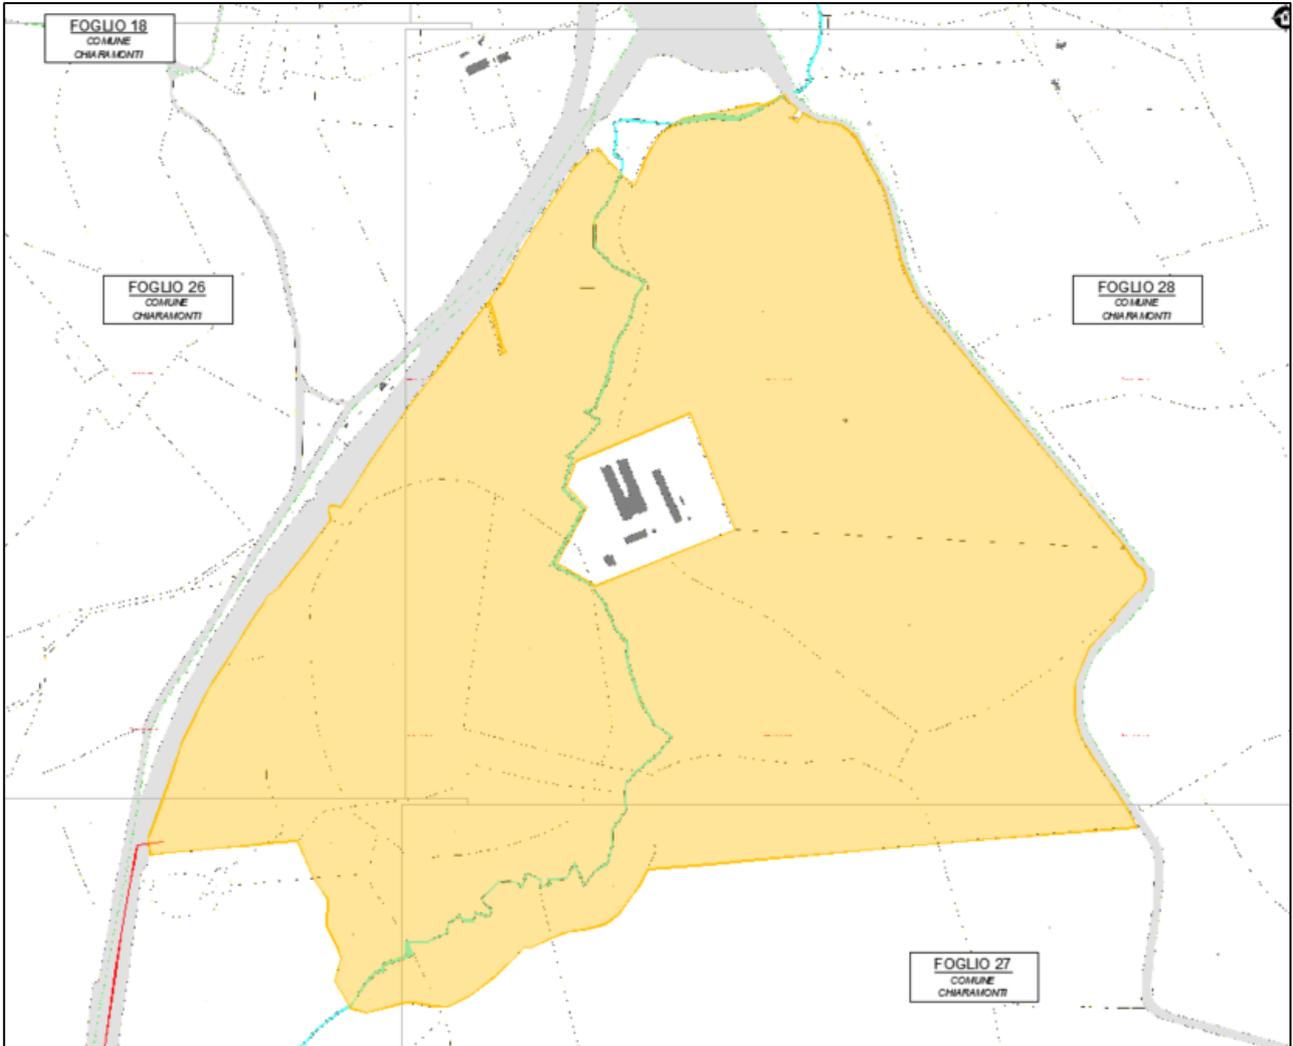


Figura 1-2: Inquadramento catastale area di impianto

	IMPIANTO AGRIVOLTAICO POTENZA NOMINALE (DC) 44 MWp Comune di Chiaramonti (SS)	Rev.	0
	22-00048-IT-CHM_CV-R04 PIANO DI DISMISSIONE	Pag.	6 di 12

2 DESCRIZIONE GENERALE IMPIANTO IN DISMISSIONE

L'impianto è di tipo grid-connected ed è collegato alla rete elettrica nazionale con una connessione trifase in alta tensione.

Ha una potenza pari a 44.00 MWp, derivante da 70392 moduli su un'area pari a 105.89 ha, di cui circa 47.58 ha recintati per l'installazione del campo fotovoltaico. All'interno dell'area di impianto sono presenti un totale di n. 14 cabine destinate a power station, n.1 cabina di consegna, n.7 cabina uffici e n.5 cabina magazzino.

Tabella 2-1 Dati generali dell'impianto

ITEM	DESCRIZIONE
Richiedente	TEP RENEWABLES (CHIARAMONTI PV) SRL
Luogo di installazione:	Comune di Chiaramonti – Provincia di Sassari
Denominazione impianto:	CHIARAMONTI PV
Dati catastali area impianto in progetto:	Foglio 27 (particelle 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 79)
Potenza di picco (MWp):	44,00 MWp
Informazioni generali del sito:	Sito ben raggiungibile, caratterizzato da strade esistenti, idonee alle esigenze legate alla realizzazione dell'impianto e di facile accesso
Connessione:	Interfacciamento alla rete mediante soggetto privato nel rispetto delle norme CEI
Tipo strutture di sostegno:	Strutture metalliche in acciaio zincato tipo Trackers monoassiali
Inclinazione piano dei moduli:	-55° +55° tipo Trackers
Azimuth di installazione:	0°
Caratterizzazione urbanistico vincolistica:	Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Chiaramonti colloca le opere di progetto in Zona Agricola E.
Cabine PS:	n.14 distribuite nell'area del campo fotovoltaico
Posizione cabina elettrica di interfaccia:	n.1 nell'area del campo fotovoltaico
Storage	N/A
Rete di collegamento:	Alta Tensione – 36 kV da campo fotovoltaico a nuova SE 150/36 kV
Coordinate:	40° 43' 33.41" N 8° 49' 18.45" E Altitudine media circa 370 m. s.l.m.

Il parco fotovoltaico è realizzato tramite strutture metalliche munite di tracker monoassiali. I tracker sono caratterizzati da un sostegno fondato su pali infissi nel terreno e sono disposti in direzione Nord-Sud, allo scopo di massimizzare la radiazione captata, con angolo di inclinazione del piano dei moduli a +/- 55°.

I moduli dei pannelli fotovoltaici saranno bifacciali indicativamente della potenza di 625 Wp e gli inverter saranno di centralizzati.

2.1 STRUTTURA DI SUPPORTO E DI SOSTEGNO

2.1.1 Tracker

Il progetto prevede l'impiego di una struttura metallica di tipo tracker con fondazione su pali infissi nel terreno disposti in direzione Nord-Sud, allo scopo di massimizzare la radiazione captata, con angolo di inclinazione del piano dei moduli a +/- 55°:

	IMPIANTO AGRIVOLTAICO POTENZA NOMINALE (DC) 44 MWp Comune di Chiamonti (SS)	Rev.	0
	22-00048-IT-CHM_CV-R04 PIANO DI DISMISSIONE	Pag.	7 di 12

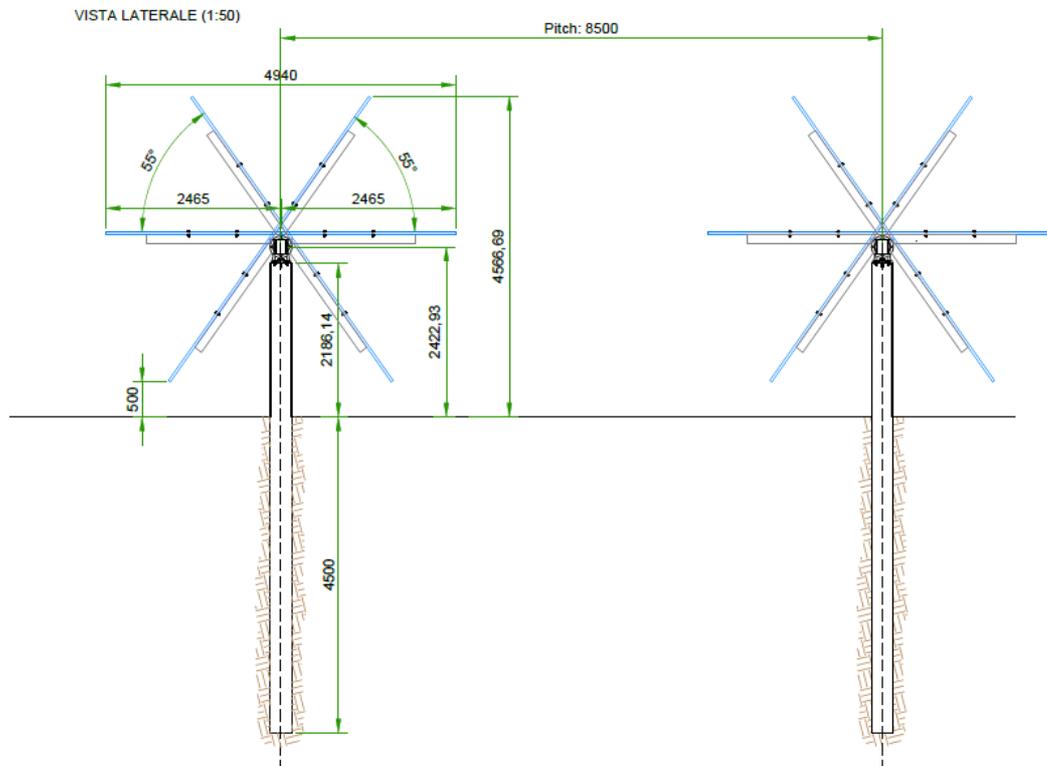


Figura 2-2: struttura di sostegno

Il portale tipo è costituito dalla stringa di 48 moduli (in alcune posizioni 24) montati con una disposizione di 2 file di moduli in posizione verticale. Elettricamente le strutture sono collegate alla terra di impianto per assicurare la protezione contro le sovratensioni indotte da fenomeni atmosferici. Le strutture utilizzate per il sostegno delle due file di moduli sono mostrate nella seguente foto esemplificativa.



Figura 2-3: Particolare strutture di sostegno moduli

	IMPIANTO AGRIVOLTAICO POTENZA NOMINALE (DC) 44 MWp Comune di Chiamonti (SS)	Rev.	0
	22-00048-IT-CHM_CV-R04 PIANO DI DISMISSIONE	Pag.	8 di 12

3 DISMISSIONE CAMPO FOTOVOLTAICO

Nel presente paragrafo vengono descritte le attività che si intendono attuare dopo il previsto fine ciclo produttivo dell'impianto fotovoltaico.

In considerazione della tipologia di strutture da smantellare, il piano di dismissione procederà per fasi sequenziali ognuna delle quali prevederà opere di smantellamento, raccolta e smaltimento dei vari materiali.

Verranno smantellate tutte le strutture del campo fotovoltaico in modo che ogni volta che si attuerà la dismissione di un componente, si possano creare le condizioni idonee per la fase di dismissione successiva.

La rimozione sequenziale delle strutture sarà concordata in fase operativa con la ditta esecutrice dei lavori; non si prevede comunque all'interno dell'area d'impianto lo stoccaggio delle strutture dismesse, esse infatti verranno inviate direttamente dopo lo smontaggio ad idoneo smaltimento e/o recupero in impianti autorizzati.

Durante tutte le fasi operative sarà cura degli addetti e responsabilità della direzione lavori adottare tutte le misure atte a salvaguardare lo stato delle aree e ad evitare fenomeni di contaminazione indotti dalle operazioni di smontaggio degli impianti.

Per la realizzazione della dismissione completa sono previste diverse fasi di lavoro per un totale di circa 8 mesi di lavoro.

Le fasi previste sono:

1. rimozione dei cablaggi fra le stringhe, smontaggio e smaltimento dei moduli fotovoltaici;
2. rimozione e smaltimento delle strutture di sostegno e pali;
3. rimozione e smaltimento dei locali tecnici;
4. demolizione e smaltimento delle opere civili;
5. rimozione e smaltimento di cavi, di canalette porta servizi in C.A.V e tubazioni passacavi;
6. rimozione e smaltimento della recinzione;
7. sistemazione delle mitigazioni e del terreno per messa a coltura.

3.1 DISMISSIONE STRUTTURE TECNOLOGICHE

3.1.1 Rimozione dei cablaggi fra le stringhe, smontaggio e smaltimento dei moduli fotovoltaici

Dopo aver interrotto il collegamento di cessione alla rete elettrica ed aver isolato le stringhe, i moduli fotovoltaici verranno dapprima disconnessi dai cablaggi, poi saranno smontati dai sostegni, infine saranno accatastati lungo la viabilità affinché ne sia agevole la movimentazione con l'ausilio di forche idrauliche ai fini dell'invio a idoneo smaltimento e/o recupero delle materie seconde.

Dovranno essere smantellati 70392 moduli per un peso complessivo di 3850.4 t circa delle quali circa l'80% costituito da vetro, alluminio e polimeri e circa il 20% da materiale elettrico e celle fotovoltaiche. In ogni caso, a prescindere dalla consistenza dei vari materiali smantellati, i moduli di cui è prevista l'utilizzazione e di cui si riportano le schede tecniche in allegato saranno inviati a smaltimento/recupero specializzato senza effettuare ulteriori opere di smontaggio in loco. Infatti per la tipologia di pannello fotovoltaico utilizzato la gestione del ciclo di vita dei moduli prevede un programma prefinanziato che garantisce al proprietario il ritiro ed il riciclaggio gratuito dei moduli al termine della loro durata di vita (30 anni). In tal senso l'azienda proponente si riserva di presentare tutte le garanzie rilasciate dal produttore all'acquisto del prodotto.

I cablaggi fra i pannelli, invece, essendo costituiti da normali cavi conduttori di rame rivestito con resina isolante, una volta rimossi dalle apposite sedi sui sostegni, verranno inviati a recupero in appositi impianti autorizzati. Trattandosi attualmente di metallo prezioso, e considerando che il

	IMPIANTO AGRIVOLTAICO POTENZA NOMINALE (DC) 44 MWp Comune di Chiamonti (SS)	Rev.	0
	22-00048-IT-CHM_CV-R04 PIANO DI DISMISSIONE	Pag.	9 di 12

mercato delle materie prime è costantemente in crescita, pur non essendo prevedibile la quotazione di mercato, che attualmente si attesta sui 5.000-6.000 Euro/ton anche tra 30 anni è da prevedersi un ingente ricavo dal recupero dello stesso.

3.1.2 Rimozione e smaltimento strutture di sostegno e dei pali

Le strutture di sostegno verranno dapprima smontate e separate dai pali fissi di fondazione che verranno estratti in una fase successiva.

I telai in alluminio saranno smantellati e ridotti in porzioni di profilato idonee alla movimentazione con forche o bracci idraulici e inviati verso lo smaltimento così come il resto dei profilati. In ogni caso tutti i materiali di smantellamento saranno inviati a un impianto autorizzato al recupero metalli. Anche in questo caso si può facilmente ritenere che il mercato dei rottami metallici, che negli ultimi 10 anni ha subito una variabilità compresa tra 200 e 600 Euro/ton, possa avere una quotazione di mercato in crescita tra 30 anni.

Successivamente si smonteranno le parti elettriche motrici dei tracker, che verranno separate e gestite contestualmente alle altre lavorazioni di smontaggio elettrico di tutto l'impianto.

3.1.3 Rimozione e smaltimento cabine e locali tecnici

Si procederà in un primo momento alla rimozione di tutti gli apparati elettronici (trasformatori, inverter, quadri elettrici, quadro comandi, quadro ausiliari e strutture di sicurezza) e dei cavidotti riutilizzabili, con loro allontanamento per smaltimento come rifiuti elettrici (RAEE). Particolare cautela verrà dedicata allo smontaggio degli inverter, in quanto elemento ricco di materiali riciclabili.

Successivamente i prefabbricati delle Power Station (14), della cabina elettrica generale AT (1), degli uffici (7), e dei magazzini (5), saranno rimossi dalla loro sede, con l'ausilio di pale meccaniche e bracci idraulici, ed inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero. In tal senso si prevede cautelativamente che questa possa essere una voce di costo a corpo stimata decisamente per eccesso in quanto vi sarà presenza di materiali attualmente non facilmente recuperabili quali ad esempio parti di cemento, plastica di tubazioni, parti in resina (porta quadri, scatole elettriche, ecc.). Queste operazioni avverranno tramite operai specializzati, e verranno avviate a seguito del preventivo distacco di tutto l'impianto dalla linea elettrica di riferimento. Tutte le lavorazioni saranno sviluppate nel rispetto delle normative al momento vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori.

3.1.4 Smantellamento e demolizione opere civili

Le opere in C.A. verranno smantellate con l'ausilio di idonei escavatori dotati di benne/pinze demolitrici e il materiale di risulta sarà inviato allo smaltimento come materiale inerte.

Nella fattispecie verranno rimossi:

- N. 27 platee di fondazione;
- Elementi di fondazione delle strutture mobili: pali infissi;
- Platee di rinforzo passaggio cavi e altri manufatti in c.a.

3.1.5 Rimozione e smantellamento cavi, canalette e tubazioni passacavi

Saranno rimossi cavi (per i quali si prevede il recupero) e gli eventuali pozzetti e/o canaline in calcestruzzo.

Tutti i materiali risultanti saranno divisi per tipologia (cavi elettrici, plastica e inerti) e saranno inviati a idoneo smaltimento e/o recupero come precedentemente descritto, ovvero con un recupero economico per la vendita del rame e smaltimento come materiale inerte per le canalette.

	IMPIANTO AGRIVOLTAICO POTENZA NOMINALE (DC) 44 MWp Comune di Chiamonti (SS)	Rev.	0
	22-00048-IT-CHM_CV-R04 PIANO DI DISMISSIONE	Pag.	10 di 12

3.1.6 Rimozione e smantellamento recinzioni ed ausiliari

In base alle esigenze finali della proprietà, la recinzione e gli elementi ausiliari verranno smantellati con l'ausilio di adeguata attrezzatura meccanica in modo che vengano suddivisi i vari materiali di risulta per tipologia. Saranno divise le reti elettrosaldate dai montanti ed i pilastri degli ausiliari dai dispositivi di illuminazione e controllo. Infine, verranno smaltiti i materiali secondo le più idonee destinazioni.

3.1.7 Sistemazione delle mitigazioni e del terreno per messa a coltura del terreno

Le opere di mitigazione a verde verranno mantenute, salvo che pregiudichino le colture future.

Nelle primissime fasi dell'avvio della dismissione dell'impianto saranno avviate indagini circa le colture locali, anche con confronto diretto con gli agricoltori della zona, al fine di studiare le coltivazioni da impiantare.

Al termine della dismissione dell'impianto sarà quindi assicurato il totale ripristino del suolo agrario originario, previa pulizia e smaltimento di eventuali materiali residui, quali spezzoni o frammenti metallici, frammenti di cemento, etc.

3.1.8 Classificazione dei rifiuti

Di seguito si riporta il codice CER relativo ai materiali provenienti dalle fasi di "decommissioning":

MATERIALE	CODICE CER
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (inverter, quadri elettrici, trasformatori, moduli fotovoltaici)	20.01.36
Cemento (derivante dalla demolizione dei fabbricati che alloggiavano le apparecchiature elettriche)	17.01.01
Plastica (derivante dalla demolizione delle tubazioni per il passaggio dei cavi elettrici)	17.02.03
Ferro, Acciaio (derivante dalla demolizione delle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici)	17.04.05
Cavi	17.04.11
Pietrisco (derivante dalla rimozione della ghiaia gettata per realizzare la viabilità e le piazzole)	17.05.08

Tabella 3-1: Tabella rifiuti e CER relativo

Saranno effettuate le analisi per ammissibilità in discarica secondo quanto previsto dal D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i..

	IMPIANTO AGRIVOLTAICO POTENZA NOMINALE (DC) 44 MWp Comune di Chiamonti (SS)	Rev.	0
	22-00048-IT-CHM_CV-R04 PIANO DI DISMISSIONE	Pag.	11 di 12

4 COMPUTO COSTI DI DISMISSIONE

Le attività di dismissione sono computate sulla base del prospetto costi di seguito riportato. Il costo totale per la rimozione dell'impianto e il ripristino dell'area è pari a **5 247 204,36 €**.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO CHIARAMONTI					
ATTIVITA' DI DISMISSIONE					
	VOCE	UNITA'	TOT.	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
1	DISMISSIONE MODULI FOTOVOLTAICI				
1.1	Rimozione moduli fotovoltaici e cablaggi fra le stringhe, compreso trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali	a corpo	1	351 960,00 €	351 960,00 €
2	DISMISSIONE STRUTTURA DI SOSTEGNO DEI MODULI E FISSAGGIO AL SUOLO				
2.1	Rimozione e demolizioni strutture di sostegno moduli e dei pali di fondazione, compreso il trasporto e il conferimento a discarica autorizzata	a corpo	1	891 257,45 €	891 257,45 €
3	DISMISSIONE LOCALI PREFABBRICATI E CABINE ELETTRICHE				
3.1	Demolizione locali prefabbricati e cabine elettriche e rispettive fondazioni. Compreso il trasporto e il conferimento a discarica autorizzata. Compreso rinterri degli scavi.	a corpo	1	886 740,09 €	886 740,09 €
4	RIMOZIONE E SMANTELLAMENTO RECINZIONI E AUSILIARI				
4.1	Rimozione recinzione e accessi all'area di impianto, compreso il trasporto e il conferimento a discarica autorizzata. Compreso rinterro degli scavi.	a corpo	1	59 908,66 €	59 908,66 €
5	DISMISSIONE LINEE ELETTRICHE INTERNE ALL'IMPIANTO				
5.1	Rimozione canalette, materiale elettrico, cavi, pozzetti prefabbricati in PVC e pozzetti in resina per impianto di messa a terra, compreso trasporto e conferimento a discarica autorizzata	a corpo	1	2 984 799,51 €	2 984 799,51 €
6	MITIGAZIONE				
6.1	Sistemazione delle mitigazioni e del terreno per messa a coltura del terreno	a corpo	1	224,15 €	224,15 €
	TOTALE CAPITOLO				5 174 889,86 €
7	SICUREZZA DISMISSIONE IMPIANTO				
7.1	Costi per la sicurezza dismissione impianto	a corpo	1	72 314,50 €	72 314,50 €
	TOTALE CAPITOLO				72 314,50 €
TOTALE DISMISSIONE					5 247 204,36 €

Tabella 4-1: Costi dismissione

	IMPIANTO AGRIVOLTAICO POTENZA NOMINALE (DC) 44 MWp Comune di Chiamonti (SS)	Rev.	0
	22-00048-IT-CHM_CV-R04 PIANO DI DISMISSIONE	Pag.	12 di 12

5 CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI DISMISSIONE

La attività di dismissione e ripristino dell'impianto dureranno circa 8 mesi secondo quanto riportato nel crono programma riportato in allegato.

	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8
Rimozione impianto								
Approntamento cantiere	■							
Preparazione area stoccaggio rifiuti differenziati	■	■						
Rimozione dei cablaggi e smontaggio moduli FV		■	■	■	■			
Smaltimento pannelli FV			■	■	■			
Rimozione delle strutture di sostegno e pali			■	■	■			
Smaltimento delle strutture di sostegno e pali			■	■	■	■		
Rimozione cabine e locali tecnici		■	■					
Smaltimento cabine e locali tecnici			■	■				
Rimozione di cavi, canalette, tubazione e pozzetti			■	■	■	■		
Smaltimento di cavi, canalette, tubazione e pozzetti				■	■	■		
Demolizione fondazioni cabine			■	■	■			
Smaltimenti fondazioni cabine				■	■			
Rimozione e smaltimento recinzione					■	■	■	
Sistemazione mitigazioni e terreno per messa a coltura						■	■	■

Figura 5-1: Cronoprogramma dismissione
