

Delta Solar S.r.l.		CODE ROC.ENG.REL.013.00
		PAGE 1 di/of 2

TITLE: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

AVAILABLE LANGUAGE: IT

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Progetto di un Impianto Agrivoltaico della potenza complessiva di 63.232,40 kWp e relative opere di connessione alla RTN. Da realizzarsi nei comuni di Roccapalumba (PA) e Vicari (PA)

"ROCCAPALUMBA"



File: ROC.ENG.REL.013.00_Cronoprogramma dei lavori.doc

00	11/08/2023	Emissione	R. De Santis	L. Spaccino	V. Bretti
				A. Fata	
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED

CLIENT VALIDATION

<i>Name</i>	<i>Discipline</i>	<i>PE</i>
COLLABORATORS	VERIFIED BY	VALIDATE BY

CLIENT CODE


IMP.		GROUP.				TYPE			PROGR.			REV	
R	O	C	E	N	G	R	E	L	0	1	3	0	0

CLASSIFICATION For Information or For Validation

UTILIZATION SCOPE Basic Design

This document is property of Delta Solar S.r.l. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Delta Solar S.r.l.

ID	Task Name	Durata (giorni)	Inizio	Fine
1	Progettazione esecutiva	45	1	45
2	Opere civili	120	45	165
3	Montaggio strutture tracker	100	60	160
4	Montaggio moduli fotovoltaici	120	80	200
5	Realizzazione/Adeguamento cabine MT/BT	56	160	216
6	Installazione inverter-trasformatori e componenti elettrici	20	226	246
7	Realizzazione/Adeguamento cabina di raccolta	90	246	336
8	Realizzazione Opere di mitigazione	90	240	330
9	Opere di connessione	35	336	371
10	Installazione contatori	5	336	341
11	Connessione alla rete	90	341	431
12	Collaudo	10	431	441
13	Fine lavori	1	441	442

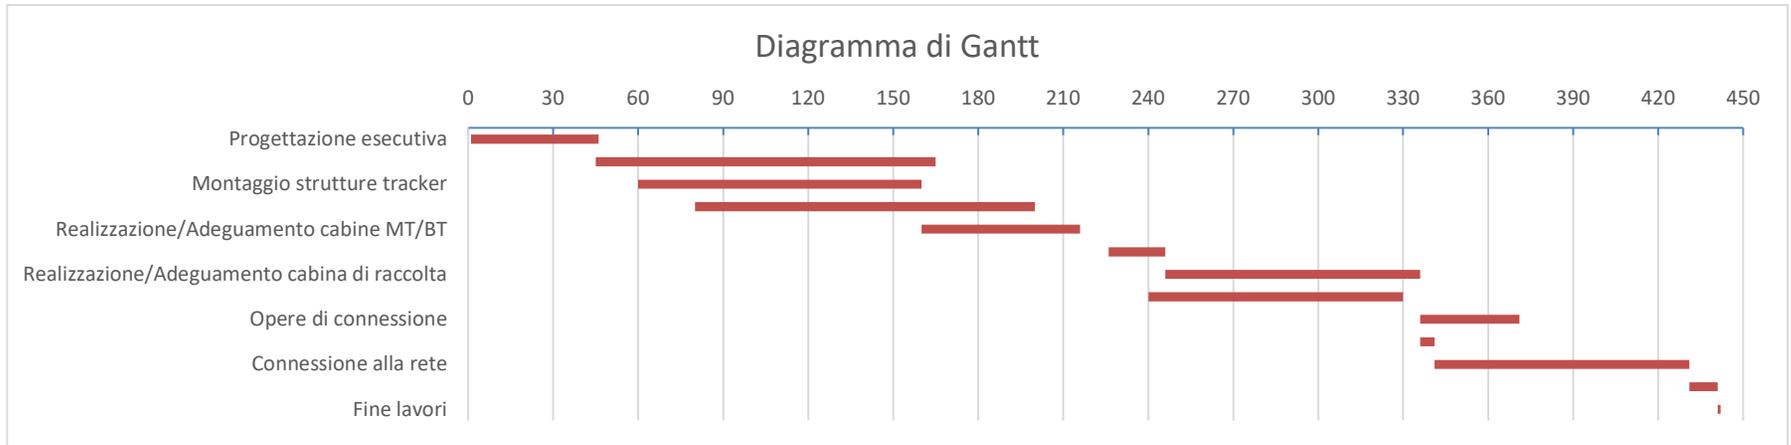

Il Progettista
 Ing. Vito Bretti
