


IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE FOTVOLTAICA POTENZA NOMINALE 85 MW

REGIONE SICILIA



PROVINCIA di CATANIA



COMUNE di RAMACCA

Località " Contrada Balconere"



COMUNE di CASTEL DI IUDICA

Località "Contrada Comunelli"



Scala:

Formato Stampa:

-

A4

PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE

A. 10

CRONOPROGRAMMA

Progettazione:



R.S.V. Design Studio S.r.l.
 Ingegneria | Architettura | Topografia
 Piazza Carmine, 5 | 84077 Torre Orsaia (SA)
 P.IVA 05885970656
 Tel./fax:+39 0974 985490 | e-mail: info@rsv-ds.it

Committenza:



ITS Medora S.r.l.
 Via Sebastiano Catania, n.317
 95123 Catania (CT)
 P.IVA 05767670879

Responsabili Progetto:

Ing. Vassalli Quirino



Ing. Speranza Carmine Antonio



Catalogazione Elaborato

ITS_CQG_A10_CRONOPROGRAMMA.pdf
 ITS_CQG_A10_CRONOPROGRAMMA.doc

Data	Motivo della revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
Marzo 2023	Prima emissione	RV	QV/IAS	RSV

SOMMARIO


PREMESSA	1
A CRONOPROGRAMMA ACCELERATO	2
B CRONOPROGRAMMA STANDARD	4
C DESCRIZIONE DELLE FASI INDIVIDUATE DAL CRONOPROGRAMMA	6
I. Allestimento Cantiere	6
II. Scotico e Livellamento Terreno	6
III. Picchettamento del Terreno.....	7
IV. Realizzazione Viabilità e Piazzole	7
V. Realizzazione Recinzione.....	7
VI. Sbancamenti e Realizzazione Piano di Posa Cabine	8
VII. Installazione Cabine	8
VIII. Infissioni Pali/Viti Montaggio Strutture di Supporto	8
IX. Cavidotti Interrati.....	9
X. Montaggio dei Quadri di Parallelo	9
XI. Stringatura, cablaggi ecc.....	9
XII. Cablaggio Cabine	10
XIII. Cablaggio MT.....	10
XIV. Montaggio Moduli Fotovoltaici	10
XV. Smantellamento Opere di cantiere e Pulizia.....	11

PREMESSA

Nella presente relazione è riportata una stima dei tempi necessari alla costruzione del parco fotovoltaico “Cinquegrana” e relative opere di connessione.

Il progetto prevede la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico fisso a terra di taglia pari a 85 MWp.

Il presente cronoprogramma non considera le tempistiche necessarie per l’approvvigionamento dei materiali, sarà quindi nella responsabilità della committenza, dei fornitori e delle imprese

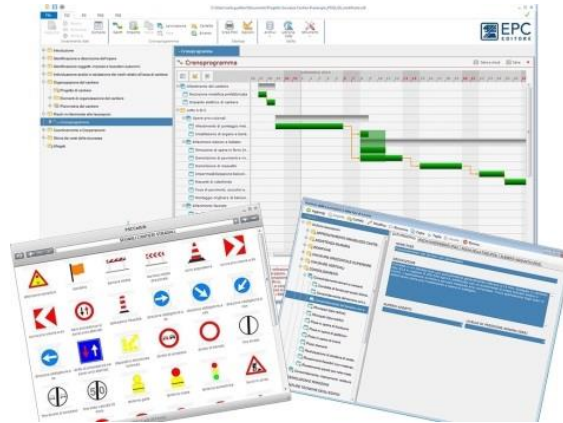

installatrici la pianificazione delle forniture in maniera tale da assicurare la presenza in cantiere dei materiali prima dell’avvio di ciascuna fase.

Il cronoprogramma ipotizza due scenari: il primo scenario detto “accelerato” è rappresentativo della pianificazione ottimale, che consente di realizzare il maggior numero possibile di attività in maniera da comprimere i tempi di realizzazione. Detto scenario sarà quello a cui le imprese realizzatrici ed i fornitori dovranno far riferimento nella pianificazione del cantiere al fine di poter portare a compimento l’opera nella maniera più rapida, efficiente ed economica.

In virtù delle peculiarità specifiche di ciascun cantiere e di sopravvenute esigenze realizzative non note a priori, l’esperienza insegna che è improbabile che vengano rispettate alla lettera le scadenze imposte dal cronoprogramma accelerato.

Per questo motivo sulla base di consolidate esperienze di cantiere si è provveduto ad ipotizzare un secondo scenario, detto “standard” che si ritiene essere quello più probabilmente aderente all’andamento reale dei lavori.

In base alle risultanze dei due scenari è possibile prevedere una durata minima del cantiere pari a 172 giorni lavorativi ed una durata attesa di 213 giorni lavorativi.

Per durata di cantiere si intende l’esecuzione di tutte le attività di cantiere fino allo smantellamento delle attrezzature di cantiere e pulizia delle aree temporanee.

□ . . . □ . . . _____ . . . □ . . . □

|A| CRONOPROGRAMMA ACCELERATO

CRONOPROGRAMMA ACCELERATO

Data di inizio:	02/11/2024
Data di fine:	17/11/2025
Totale durata lavori (gg)	381

Posizione	Data di inizio	Data di fine	Attività cardine/Attività	Durata compito
1	02/11/2024	25/11/2024	Allestimento, messa in sicurezza ed eventuale pulizia del cantiere	24
2	25/11/2024	19/12/2024	Scotico terreno	25
3	19/12/2024	18/01/2025	Picchettamento terreno	31
4	18/01/2025	09/03/2025	Realizzazione viabilità e piazzole	51
5	18/01/2025	02/02/2025	Realizzazione recinzione	16
6	18/01/2025	02/02/2025	Sbancamenti e sistemazione piano di posa per cabine	16
7	02/02/2025	22/07/2025	Posizionamento cabine e realizzazione impianto di terra cabina	171
8	28/02/2025	09/04/2025	Infissione pali/viti e montaggio delle strutture di supporto	41
9	28/02/2025	04/04/2025	Realizzazione impianto di illuminazione	36
10	04/04/2025	14/05/2025	Realizzazione impianto antifurto	41
11	04/04/2025	24/04/2025	Realizzazione cavidotti, posa corrugati e pozzetti, reinterro	21
12	08/04/2025	26/04/2025	Installazione quadri di campo e parallelo cc	19
13	08/05/2025	17/07/2025	Stringatura e cablaggi cc	71
14	29/04/2025	10/06/2025	Montaggio dei moduli fotovoltaici	43
15	05/04/2025	25/04/2025	Connessione cabine inverter e di trasformazione preallestite	21
16	25/04/2025	10/05/2025	Allestimento cabina di consegna	16
17	10/05/2025	25/05/2025	Cablaggi MT	16
18	25/05/2025	12/10/2025	Realizzazione opere di rete	141
19	12/10/2025	30/10/2025	Test collaudi e messa in esercizio	19
20	30/10/2025	17/11/2025	Smantellamento opere provvisorie di cantiere, rimozione rifiuti e pulizia aree	19

CRONOPROGRAMMA ACCELERATO- DIAGRAMMA DI GANTT



| B | CRONOPROGRAMMA STANDARD


CRONOPROGRAMMA STANDARD

Data di inizio: 02/11/2024

Data di fine: 13/07/2026

Totale durata lavori (gg) 619

Posizione	Data di inizio	Data di fine	Attività cardine/Attività	Durata compito
1	02/11/2024	25/11/2024	Allestimento, messa in sicurezza ed eventuale pulizia del cantiere	24
2	25/11/2024	19/12/2024	Scotico terreno	25
3	19/12/2024	18/01/2025	Picchettamento terreno	31
4	18/01/2025	09/03/2025	Realizzazione viabilità e piazzole	51
5	09/03/2025	24/03/2025	Realizzazione recinzione	16
6	09/03/2025	24/03/2025	Sbancamenti e sistemazione piano di posa per cabine	16
7	09/03/2025	26/08/2025	Infissione pali/viti e montaggio delle strutture di supporto	171
8	29/03/2025	08/05/2025	Realizzazione impianto di illuminazione	41
9	30/03/2025	04/05/2025	Posizionamento cabine e realizzazione impianto di terra cabina	36
10	09/05/2025	18/06/2025	Realizzazione impianto antifurto	41
11	31/08/2025	20/09/2025	Realizzazione cavidotti, posa corrugati e pozzetti, reinterro	21
12	21/09/2025	09/10/2025	Installazione quadri di campo e parallelo cc	19
13	10/10/2025	19/12/2025	Stringatura e cablaggi cc	71
14	18/10/2025	29/11/2025	Montaggio dei moduli fotovoltaici	43
15	30/11/2025	20/12/2025	Connessione cabine inverter e di trasformazione preallestite	21
16	21/12/2025	05/01/2026	Allestimento cabina di consegna	16
17	06/01/2026	21/01/2026	Cablaggi MT	16
18	16/01/2026	05/06/2026	Realizzazione opere di rete	141
19	06/06/2026	24/06/2026	Test collaudi e messa in esercizio	19
20	25/06/2026	13/07/2026	Smantellamento opere provvisionali di cantiere, rimozione rifiuti e pulizia aree	19

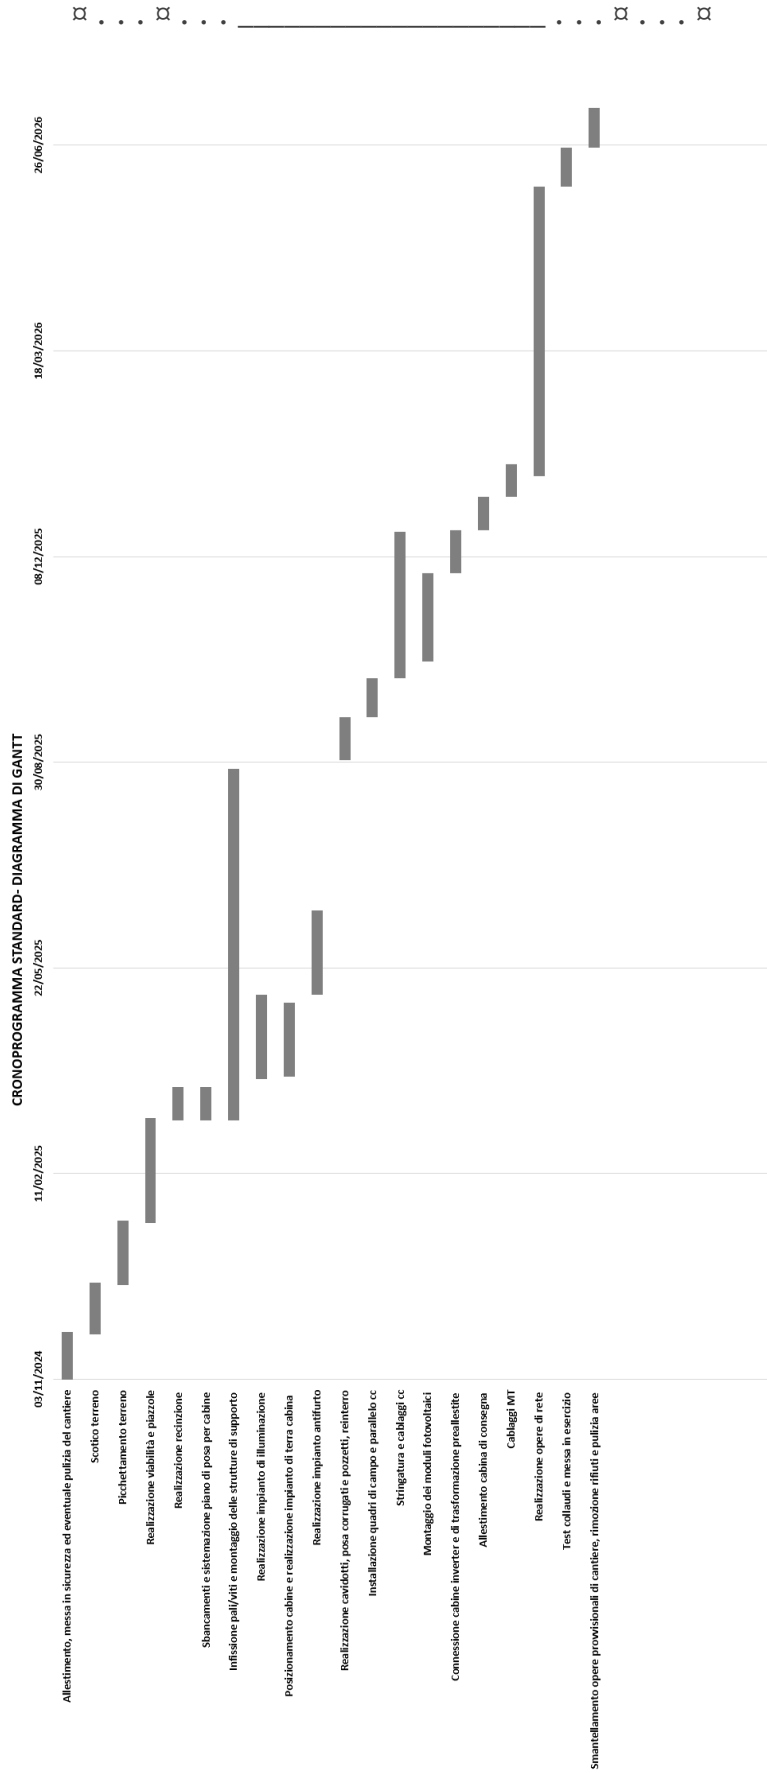

| C | DESCRIZIONE DELLE FASI INDIVIDUATE DAL CRONOPROGRAMMA

I. Allestimento Cantiere

Il lavoro consiste nel montaggio delle segnalazioni, delimitazioni, degli accessi e della cartellonistica, la realizzazione infrastrutture civili-impiantistiche cantiere quali la predisposizione delle aree di stoccaggio dei materiali, la realizzazione impianto elettrico di cantiere anche mediante l'allestimento di gruppi elettrogeni se non sono disponibili forniture BT ed alimentazione, impianto di terra, eventuali dispositivi contro le scariche atmosferiche, la predisposizione di bagni e spogliatoi (se non messi a disposizione dalla committenza) il montaggio delle attrezzature di sollevamento e ponteggio se necessarie e di tutte le recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi necessari ai fini della sicurezza, nonché l'adozione di tutte le misure necessarie ad impedire la caduta accidentale di oggetti e materiali.



Ove bagni e spogliatoi non siano messi a disposizione dalla committenza, una volta predisposta l'area del cantiere verrà installato un container adibito ad ufficio di cantiere. Il container sarà trasportato nel sito mediante camion e posizionato sul cantiere mediante gru idraulica. Una volta sul cantiere il container viene ancorato e predisposto al collegamento degli impianti energetici.

II. Scotico e Livellamento Terreno

Il lavoro consiste nella pulizia e nel livellamento del terreno con mezzo meccanico cingolato.



III. Picchettamento del Terreno

Il lavoro consiste nel rilievo del terreno, la delimitazione esatta ed il picchettamento di tutte le aree interessate all'esecuzione delle opere ed in particolar modo la definizione di tutte le aree di viabilità, l'esatto posizionamento di eventuali recinzioni permanenti e cabine, la definizione di tutte le aree interessate all'installazione delle strutture di supporto per il successivo montaggio dei moduli fotovoltaici.



IV. Realizzazione Viabilità e Piazzole

Il lavoro consiste nella realizzazione delle vie di accesso al sito precedentemente individuate e tracciate, rendendole adeguate al passaggio dei mezzi di cantiere.



V. Realizzazione Recinzione

Il lavoro consiste nella predisposizione della recinzione e dunque dalla messa in ripristino dei supporti (piantane) fissati al terreno con tecnologia a battipalo o con piccola fondazione in cemento e il montaggio della rete metallica. La fase finale dell'installazione della recinzione consiste nella messa in opera della rete metallica e dei cancelli o aperture presenti.



VI. Sbancamenti e Realizzazione Piano di Posa Cabine

Il lavoro consiste nella costruzione del piano di posa (sabbione livellato) su cui verranno alloggiare le cabine prefabbricate. La prima fase è quella di compiere le operazioni di scavo dopo gli opportuni tracciamenti. La fase successiva è quella di versare e livellare la sabbia che sarà trasportata appositamente in loco dai mezzi d'opera.



VII. Installazione Cabine

Le operazioni da eseguire sono l'assemblaggio delle diverse parti che costituiscono la cabina avendo cura di predisporre tutti i passaggi per i cavi. Vengono anche completate tutte le operazioni di impermeabilizzazione della copertura del tetto della cabina e delle parti a contatto con il terreno.



Vengono inoltre eseguite le operazioni di stesura e formazione della rete di terra e dei relativi dispersori e la posa in opera dei pozzetti nelle immediate vicinanze delle cabine elettriche.

VIII. Infissioni Pali/Viti Montaggio Strutture di Supporto

Il lavoro consiste nell'infissione pali con macchina battipalo per l'ancoraggio a terra della struttura portante il generatore fotovoltaico (la struttura portante verrà successivamente montata su palo).



IX. Cavidotti Interrati


Il lavoro consiste nel compiere gli scavi per poter posizionare tutti i cavidotti attraverso i quali saranno stesi i diversi cavi necessari al funzionamento dell'impianto.

La prima fase è quella di compiere mediante pala meccanica le operazioni di scavo dopo gli opportuni tracciamenti. Successivamente vengono posizionati i cavidotti attraverso i quali saranno poi stesi i diversi cavi necessari. I cavidotti saranno poi ricoperti con terreno e nastro di indicazione come previsto in fase di progetto. Il reinterro è previsto con il materiale proveniente dagli scavi.



X. Montaggio dei Quadri di Parallelo

I quadri di campo in continua sono i quadri elettrici di campo necessari per poter compiere il parallelo delle stringhe. Ad essi sono convogliati i cavi provenienti dalle diverse porzioni di generatore fotovoltaico e da essi partono i cavi verso gli inverter.

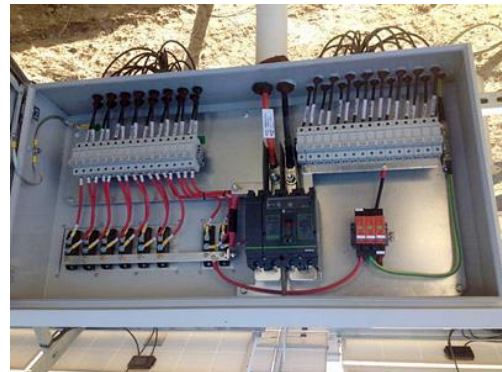

Le operazioni da eseguire sono in questo caso la posa in opera delle staffe ed il fissaggio ad esse del quadro di campo in continua, vengono poi completate alcune iniziali operazioni di cablaggio.

XI. Stringatura, cablaggi ecc.

Il lavoro consiste nello stendere i cavi DC all'interno dei cavidotti interrati e delle passerelle. Viene completato il collegamento di tutti i dispositivi lato DC. In questa

□ . . . □ . . . _____ . . . □ . . . □

fase vengono completati anche i collegamenti della rete dati e di gestione, controllo e supervisione dell'impianto fotovoltaico.

Tutti i cavi vengono intestati con apposite targhette identificative resistenti ai raggi UV al fine di una rapida individuazione, ad esempio, in caso di manutenzione.

XII. Cablaggio Cabine

Il lavoro consiste nella connessione di tutti i quadri/trasformatori/inverters all'interno delle cabine. Viene completato il collegamento di tutti i dispositivi lato AC. In questa fase vengono completati anche i collegamenti della rete dati e di gestione, controllo e supervisione dell'impianto fotovoltaico e degli ausiliari. Viene eseguita la messa a terra delle diverse masse e l'interconnessione tra di esse al fine di garantire l'equipotenzialità.



XIII. Cablaggio MT

Il lavoro consiste nello stendere i cavi MT all'interno dei cavidotti. Viene completato il collegamento di tutti i dispositivi in corrispondenza degli arrivi lato MT. Vengono posati gli eventuali nastri di segnalazione e pericolo.

XIV. Montaggio Moduli Fotovoltaici

Il lavoro consiste nella posa in opera dei moduli fotovoltaici sulle strutture di supporto già predisposte. Viene completato il collegamento in serie dei moduli fotovoltaici.



XV. Smantellamento Opere di cantiere e Pulizia

Il lavoro consiste nello smontaggio delle segnalazioni temporanee, delle delimitazioni, degli accessi e della cartellonistica, la pulizia delle aree di stoccaggio dei materiali, lo smontaggio delle attrezzature di sollevamento e ponteggio se installate e di tutte le recinzioni provvisorie, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi necessari ai



fini della sicurezza, nonché la dismissione di tutte le misure necessarie ad impedire la caduta accidentale di oggetti e materiali, nonché lo smantellamento dell'eventuale container adibito ad ufficio di cantiere.
