


Regione
BASILICATA



Provincia
Potenza



**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
DELL'AMPLIAMENTO DELLA STAZIONE RTN
380/150kV "GENZANO"**



Comune di **Genzano di Lucania**
Località "Serra Giannina"

**A. PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE
INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI**

ELABORATI GRAFICI

Codice:	SPZ02	Benestare Terna Ampliamento Stazione 380/150kV		
N° elaborato:	PTO_17-02	Cronoprogramma delle attività dei Raccordi		
N° Foglio	Tot. Fogli	Formato	Scala	Tipo di documento
1	4	A4	/	Progetto Definitivo Benestare Terna

Progettazione



Proponente



ITW
Spinazzola2

Via del Gallitello 89 I 85100 Potenza (PZ)
P.IVA 02054890765

Gestore Rete Elettrica

Progettisti

Ing. Vassalli Quirino



Ing. Speranza Carmine Antonio



Ing. Terlizzi Antonio



Ing. Gramegna Saverio



Revisori	Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
	00	03/12/2020	Emissione	TERLIZZI	AT/SG/QV/AS	Qair

ITW_SPZ02_Ampliamento Staz380kV_GENZANO_TESTATA.dwg

ITW_SPZ02_Ampliamento Staz380kV_GENZANO_TESTATA .pdf

Realizzazione Raccordi 150kV_RTN Genzano

23-dic-2020

Responsabile di progetto

Date di inizio e fine progetto

20-ott-2022 - 3-dic-2022

Completamento

0%

Attività

21

Risorse

0

CRONOPROGRAMMA Raccordi RTN_Genzano

Attività

2

Nome	Data d'inizio	Data di fine
Procedimento tecnico amministrativo finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni	20/10/22	02/12/22
Scavi	20/10/22	21/10/22
n.2 Trivellazioni -TOC	24/10/22	25/10/22
Primo raccordo AT 150 kV	26/10/22	27/10/22
Posa bauletto cls-nei tratti attraversamento strada asfaltata pubblica	26/10/22	27/10/22
Posa cavi+f.o.+rame nudo	26/10/22	27/10/22
Reinterri di sabbia	26/10/22	27/10/22
Tegole di protezione	26/10/22	27/10/22
Reinterro parziale	26/10/22	27/10/22
Posa nastro monitore	26/10/22	27/10/22
Completamento reinterro	26/10/22	27/10/22
Secondo raccordo AT 150 kv	28/10/22	31/10/22
Posa bauletto cls-nei tratti attraversamento strada asfaltata pubblica	28/10/22	31/10/22
Posa cavi+f.o.+rame nudo	28/10/22	31/10/22
Reinterri di sabbia	28/10/22	31/10/22
Tegole di protezione	28/10/22	31/10/22
Reinterro parziale	28/10/22	31/10/22
Posa nastro monitore	28/10/22	31/10/22
Completamento reinterro	28/10/22	31/10/22
Struttura metasillica montaggio terminali cavi	01/11/22	04/11/22
Terminali	07/11/22	02/12/22

Diagramma di Gantt

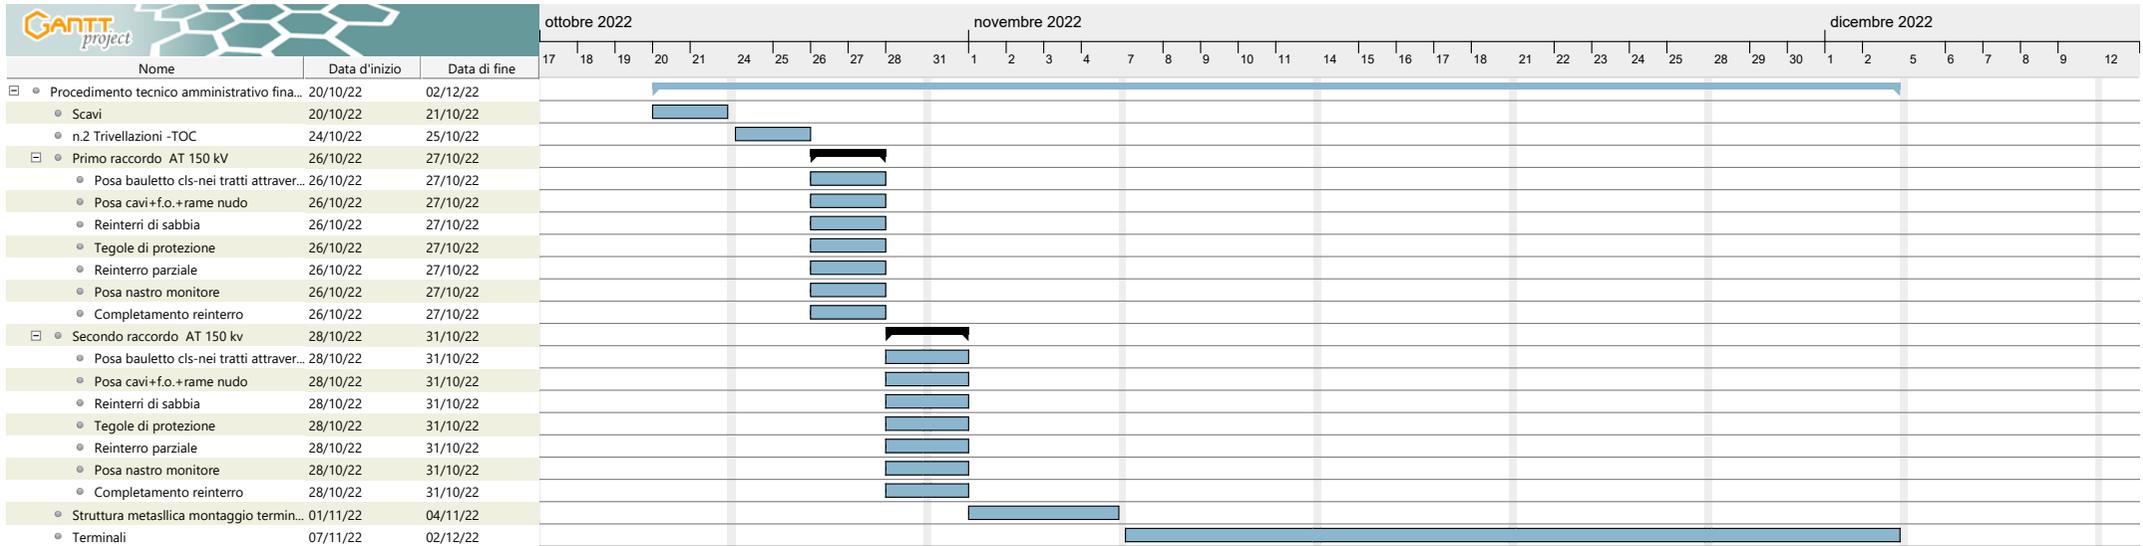


Diagramma Risorse

