

Regione BASILICATA
Provincia di Matera
COMUNE di IRSINA



IMPIANTO EOLICO
"Sant'Eufemia"

PROGETTO DEFINITIVO

Cod. Prog : IRS 2

Cod. Elab.: A.14

SCALA =
DATA: Agosto 2023

Cronoprogramma

PROPONENTE

WINDERG

Winderg s.r.l.

via Trento, 64
20871 - Vimercate (MB)
P.IVA 04702520968

WINDERG s.r.l.
Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Michele Giambelli

INCARICO



Via Enrico Fermi, 38
85021 Avigliano (PZ)
Tel. 0971.700637
mail: adr_srls@virgilio.it
A.U : Ing. Rocco Sileo

A.D.R. srls
Via Enrico Fermi, 38
85021 AVIGLIANO (PZ)
C.F. e P.IVA 02022800763

PROGETTISTA:

Dott. Ing. Rocco SILEO



Rev	Data	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
00	01/08/2023	I emissione	Romaniello	Sileo	Winderg S.r.l

Indice generale

A.14	Cronoprogramma.....	2
-------------	----------------------------	----------

A.14 Cronoprogramma

Il cronoprogramma delle fasi attuative contiene l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione esecutiva, approvazione, realizzazione, collaudo, messa in funzione ed entrata in esercizio.

È proprio in questo modo che la Società proponente ha elaborato la tabella seguente che riporta le principali fasi che daranno vita al parco eolico "Sant'Eufemia", sito nel Comune di Irsina (MT), composto da 7 turbine Vestas V172 da 7,20 MW ciascuna.

In particolare, una volta ottenuta l'Autorizzazione Unica da parte della Regione Basilicata, si procederà alle seguenti successive attività:

- Permitting: Progettazione esecutiva, richiesta concessioni, acquisizione terreni;
- Negoziazione e sottoscrizione del contratto EPC;
- Cantierizzazione;
- Fondazione: scavo e successiva realizzazione con rinterro del plinto di fondazione;
- Piazzola: realizzazione piazzola di montaggio e relativa viabilità di accesso
- Cavidotti: realizzazione elettrodotto interrato e relativo ripristino
- Montaggio aerogeneratore;
- Montaggio cabine;
- Energizzazione;
- Avvio produzione;
- Ripristino ambientali;
- Smobilizzo cantiere.

Di seguito il cronoprogramma delle attività previste.

ATTIVITA'	DATA INIZIO	DURATA	DATA FINE
PERMITTING	01/07/2024	120	29/10/2024
CONTRATTO EPC	30/10/2024	60	29/12/2024
CANTIERIZZAZIONE	08/01/2025	7	15/01/2025
FONDAZIONE	16/01/2025	40	25/02/2025
VIABILITA'-PIAZZOLA	26/02/2025	60	27/04/2025
CAVIDOTTI	28/04/2025	60	27/06/2025
MONTAGGIO AEROGENERATORE	28/06/2025	30	28/07/2025
MONTAGGIO CABINE	29/07/2025	5	03/08/2025
ENERGIZZAZIONE	04/08/2025	15	19/08/2025
AVVIO PRODUZIONE	20/08/2025	15	04/09/2025
RIPRISTINI	05/09/2025	40	15/10/2025
SMOBILIZZO CANTIERE	16/10/2025	20	05/11/2025

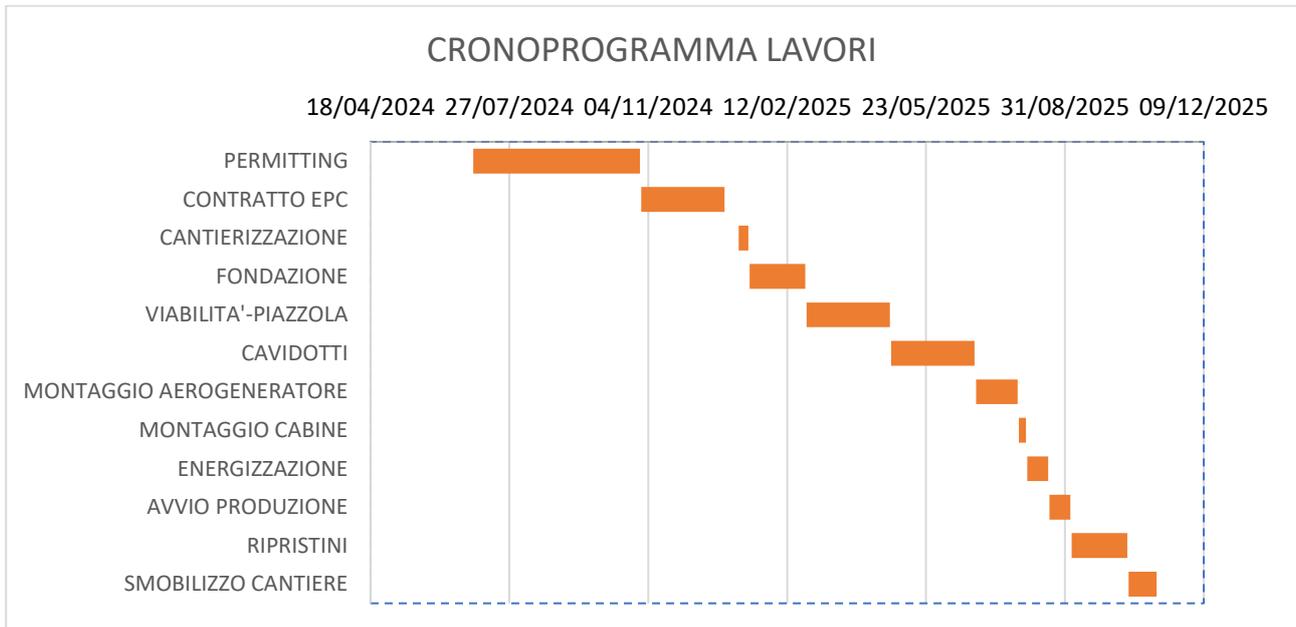


Figura 1-Cronoprogramma

Il Tecnico

Dott. Ing. Rocco Sileo

