




	Nome	Durata	Predecessori
1	<input checked="" type="checkbox"/> <b>REALIZZAZIONE IMPIANTO ORBETELLO</b>	<b>335 giorni</b>	
2	<input checked="" type="checkbox"/> <b>FASE 01: CANTIERE</b>	<b>257 giorni</b>	
3	Inizio lavori cantiere	0 giorni	
4	Allestimento del cantiere e dei servizi	24 giorni 3	
5	Picchettamento	24 giorni 3	
6	Realizzazione recinzione perimetrale	60 giorni 3	
7	Livellamento del terreno	8 giorni 5	
8	Mitigazione	80 giorni	7SS+1 giorno
9	Preparazione basamento cabinati	4 giorni 7	
10	Posa in opera cabinati	4 giorni 9	
11	Realizzazione impianto di terra cabinati	48 giorni 9SS	
12	Opere di scavo perimetrali, cavidotti e pozzetti	72 giorni	8SS+2 giorni
13	Installazione pali 4m	12 giorni 12	
14	Installazione illuminazione perimetrale	48 giorni 13;16FF	
15	Installazione telecamere	48 giorni 13;16FF	
16	Cablaggio delle linee perimetrali	40 giorni 12	
17	Realizzazione viabilità interna	12 giorni 16	
18	Completamento opere edili	0 giorni 10;17	
19	Infissione pali dei tracker	72 giorni 8	
20	Installazione strutture di sostegno moduli	80 giorni	8SS+9 giorni
21	Montaggio pannelli FV	100 giorni	8SS+40 giorni
22	Installazione tracker	0 giorni	8SS+65 giorni
23	Alloggiamento trasformatore e quadri in cabina	28 giorni 10	
24	Installazione inverter	20 giorni 22FF	
25	Linee di campo	8 giorni	19FS+2 giorni
26	Cablaggi in DC	100 giorni	21SS+5 giorni
27	Completamento posa pannelli e stringaggio	3 giorni 26	
28	Cablaggi in AC	20 giorni	24;25;23
29	Collegamento linee MT	20 giorni 23	
30	Linee ausiliari tracker	32 giorni 22	
31	Pre-collaudo stringature	40 giorni 26	
32	Posa fibra pannelli	36 giorni	26FS+3 giorni
33	Cablaggio linea dati antintrusione	36 giorni	12FS+4 giorni
34	Configurazione dei servizi ausiliari	12 giorni	32;33;23



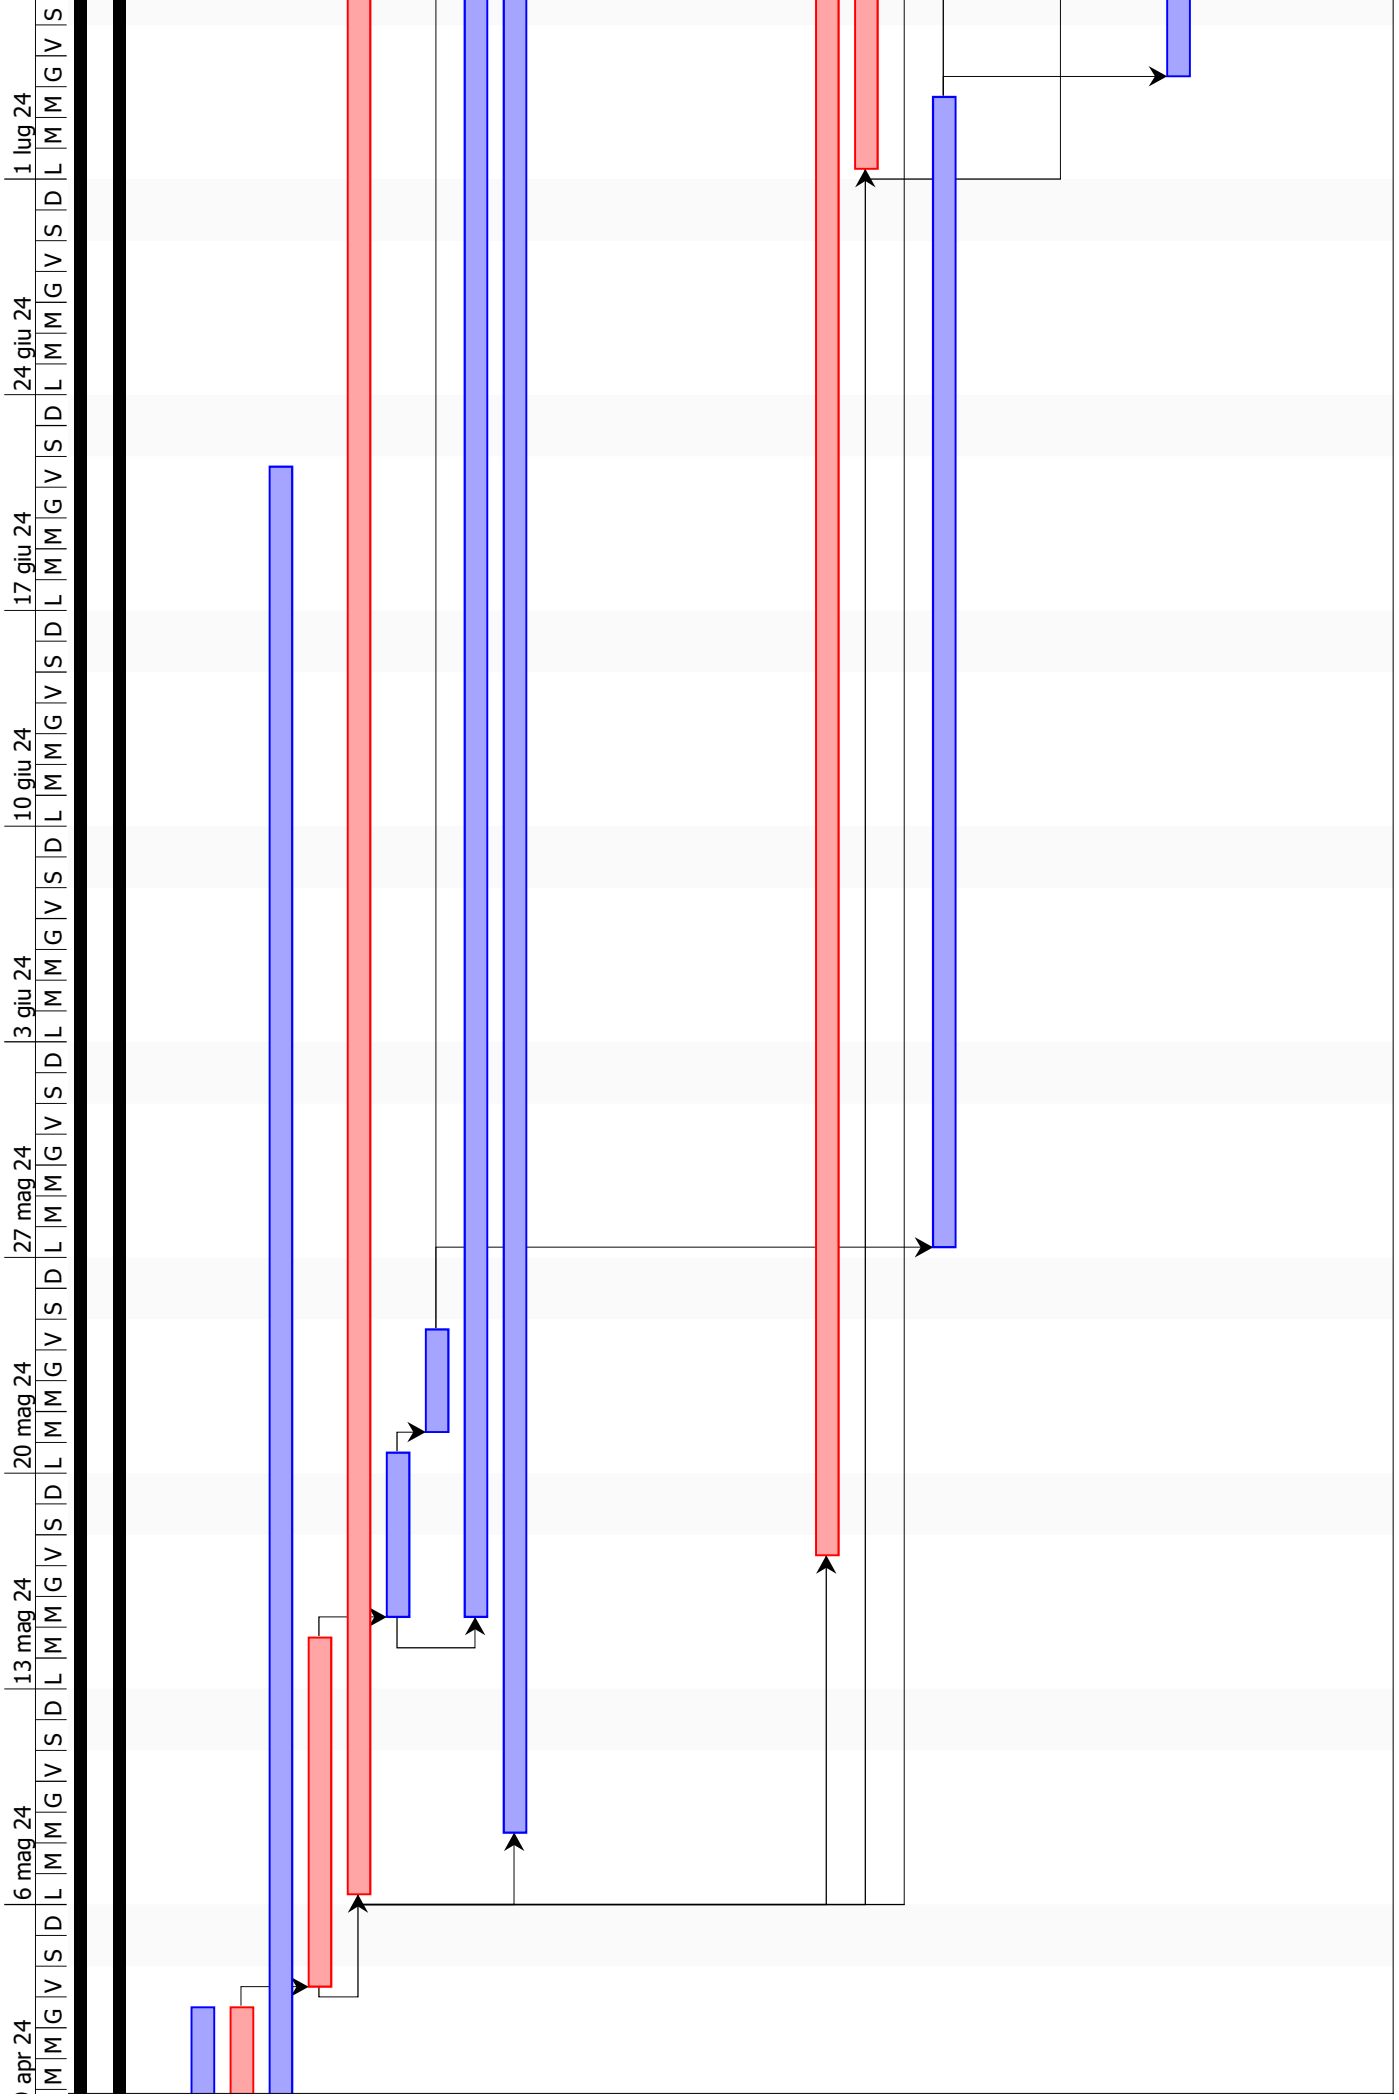

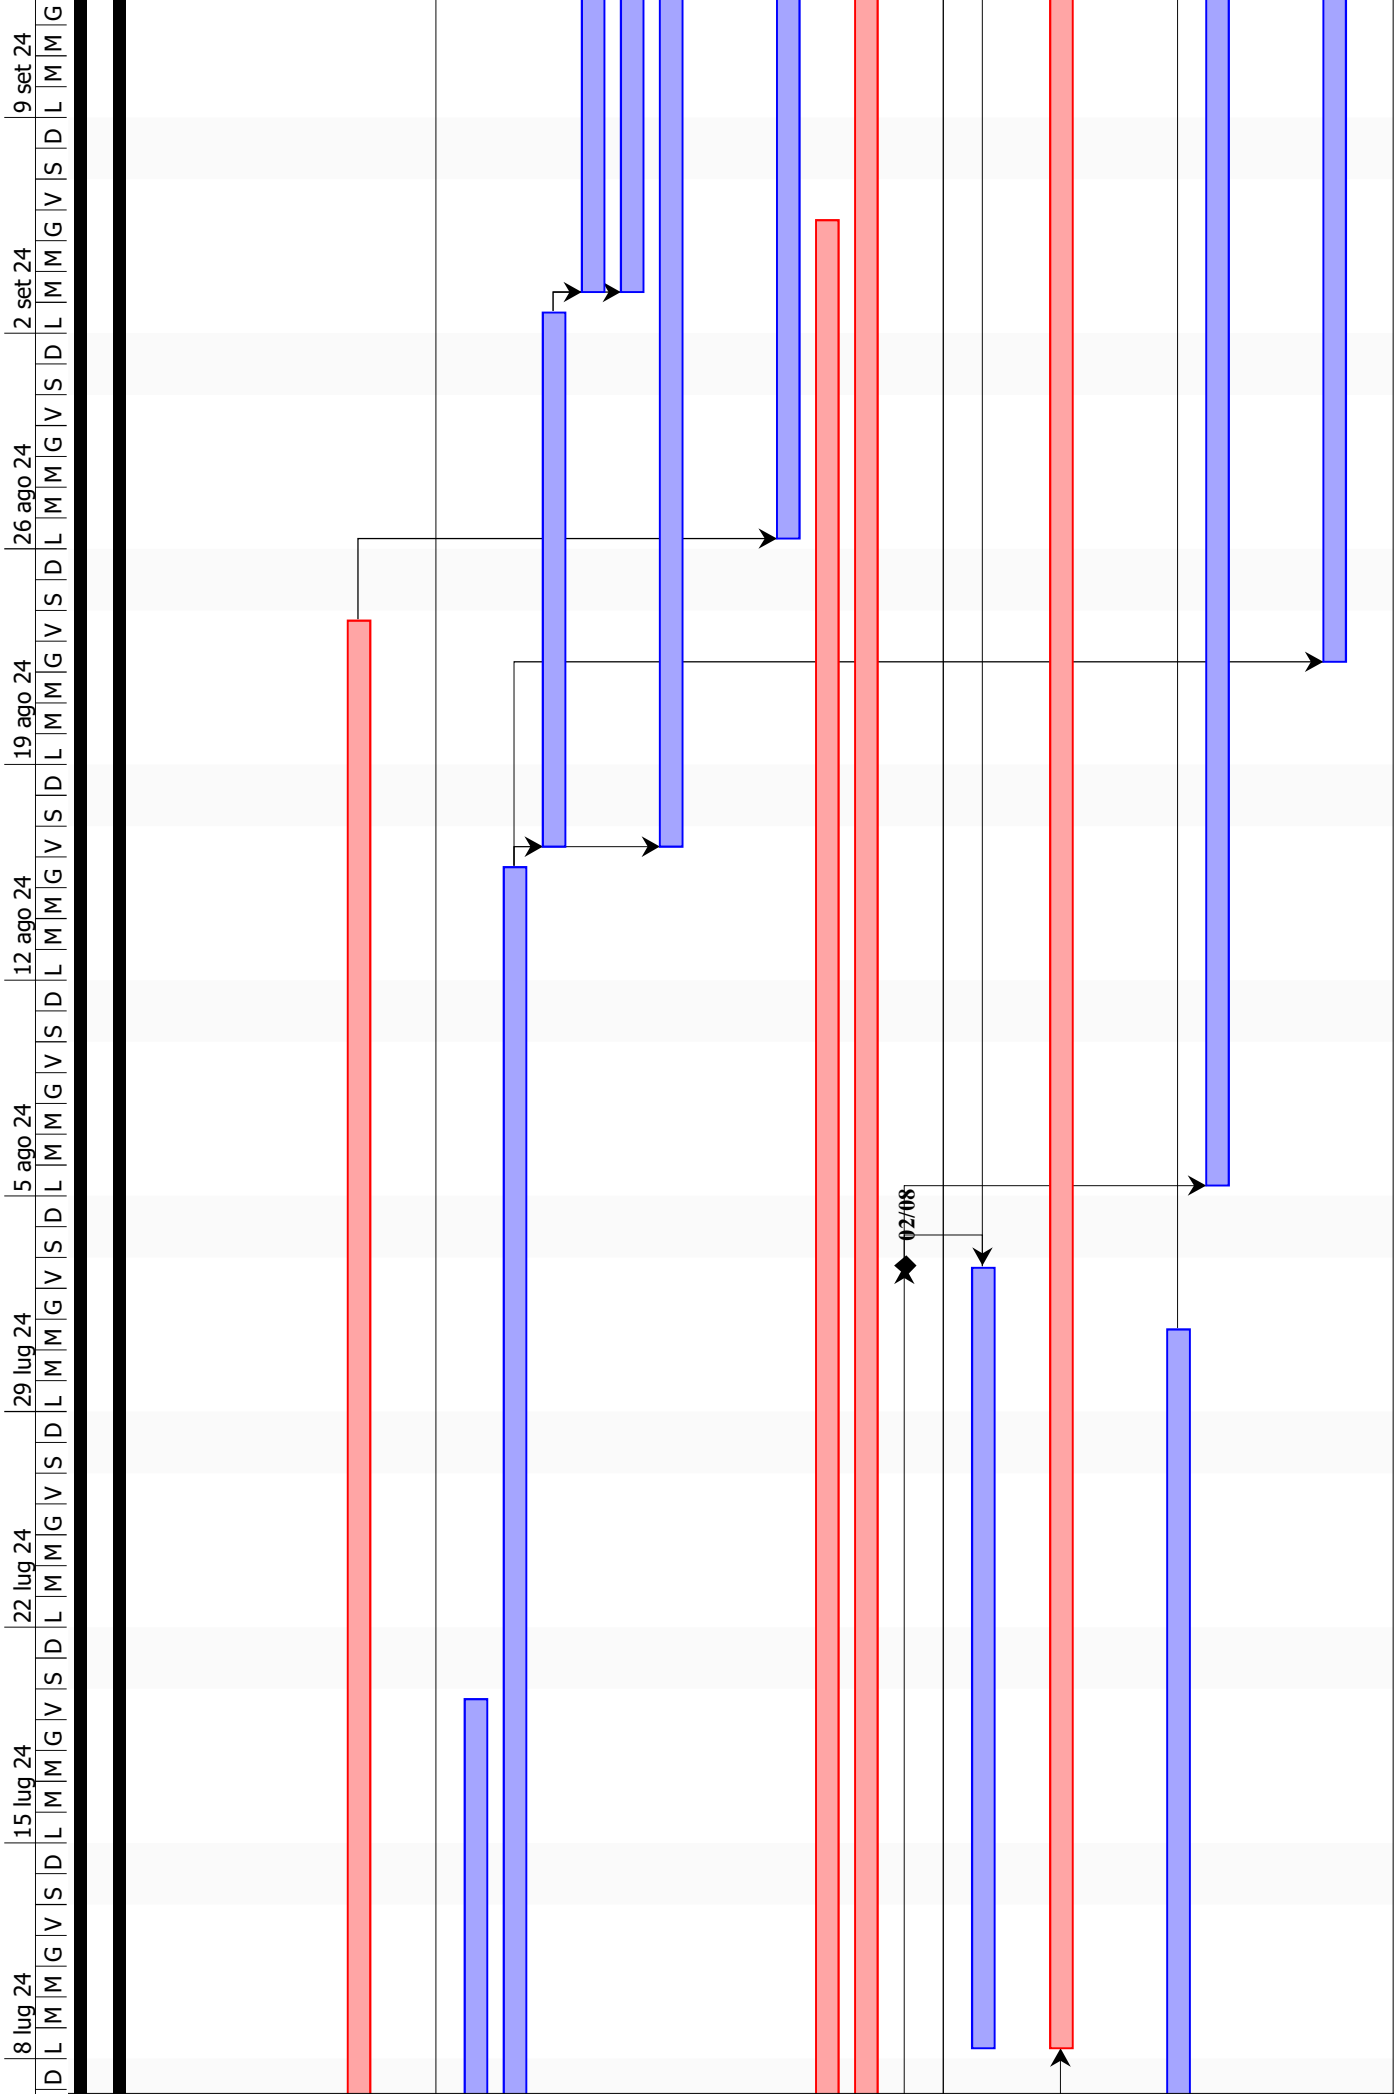

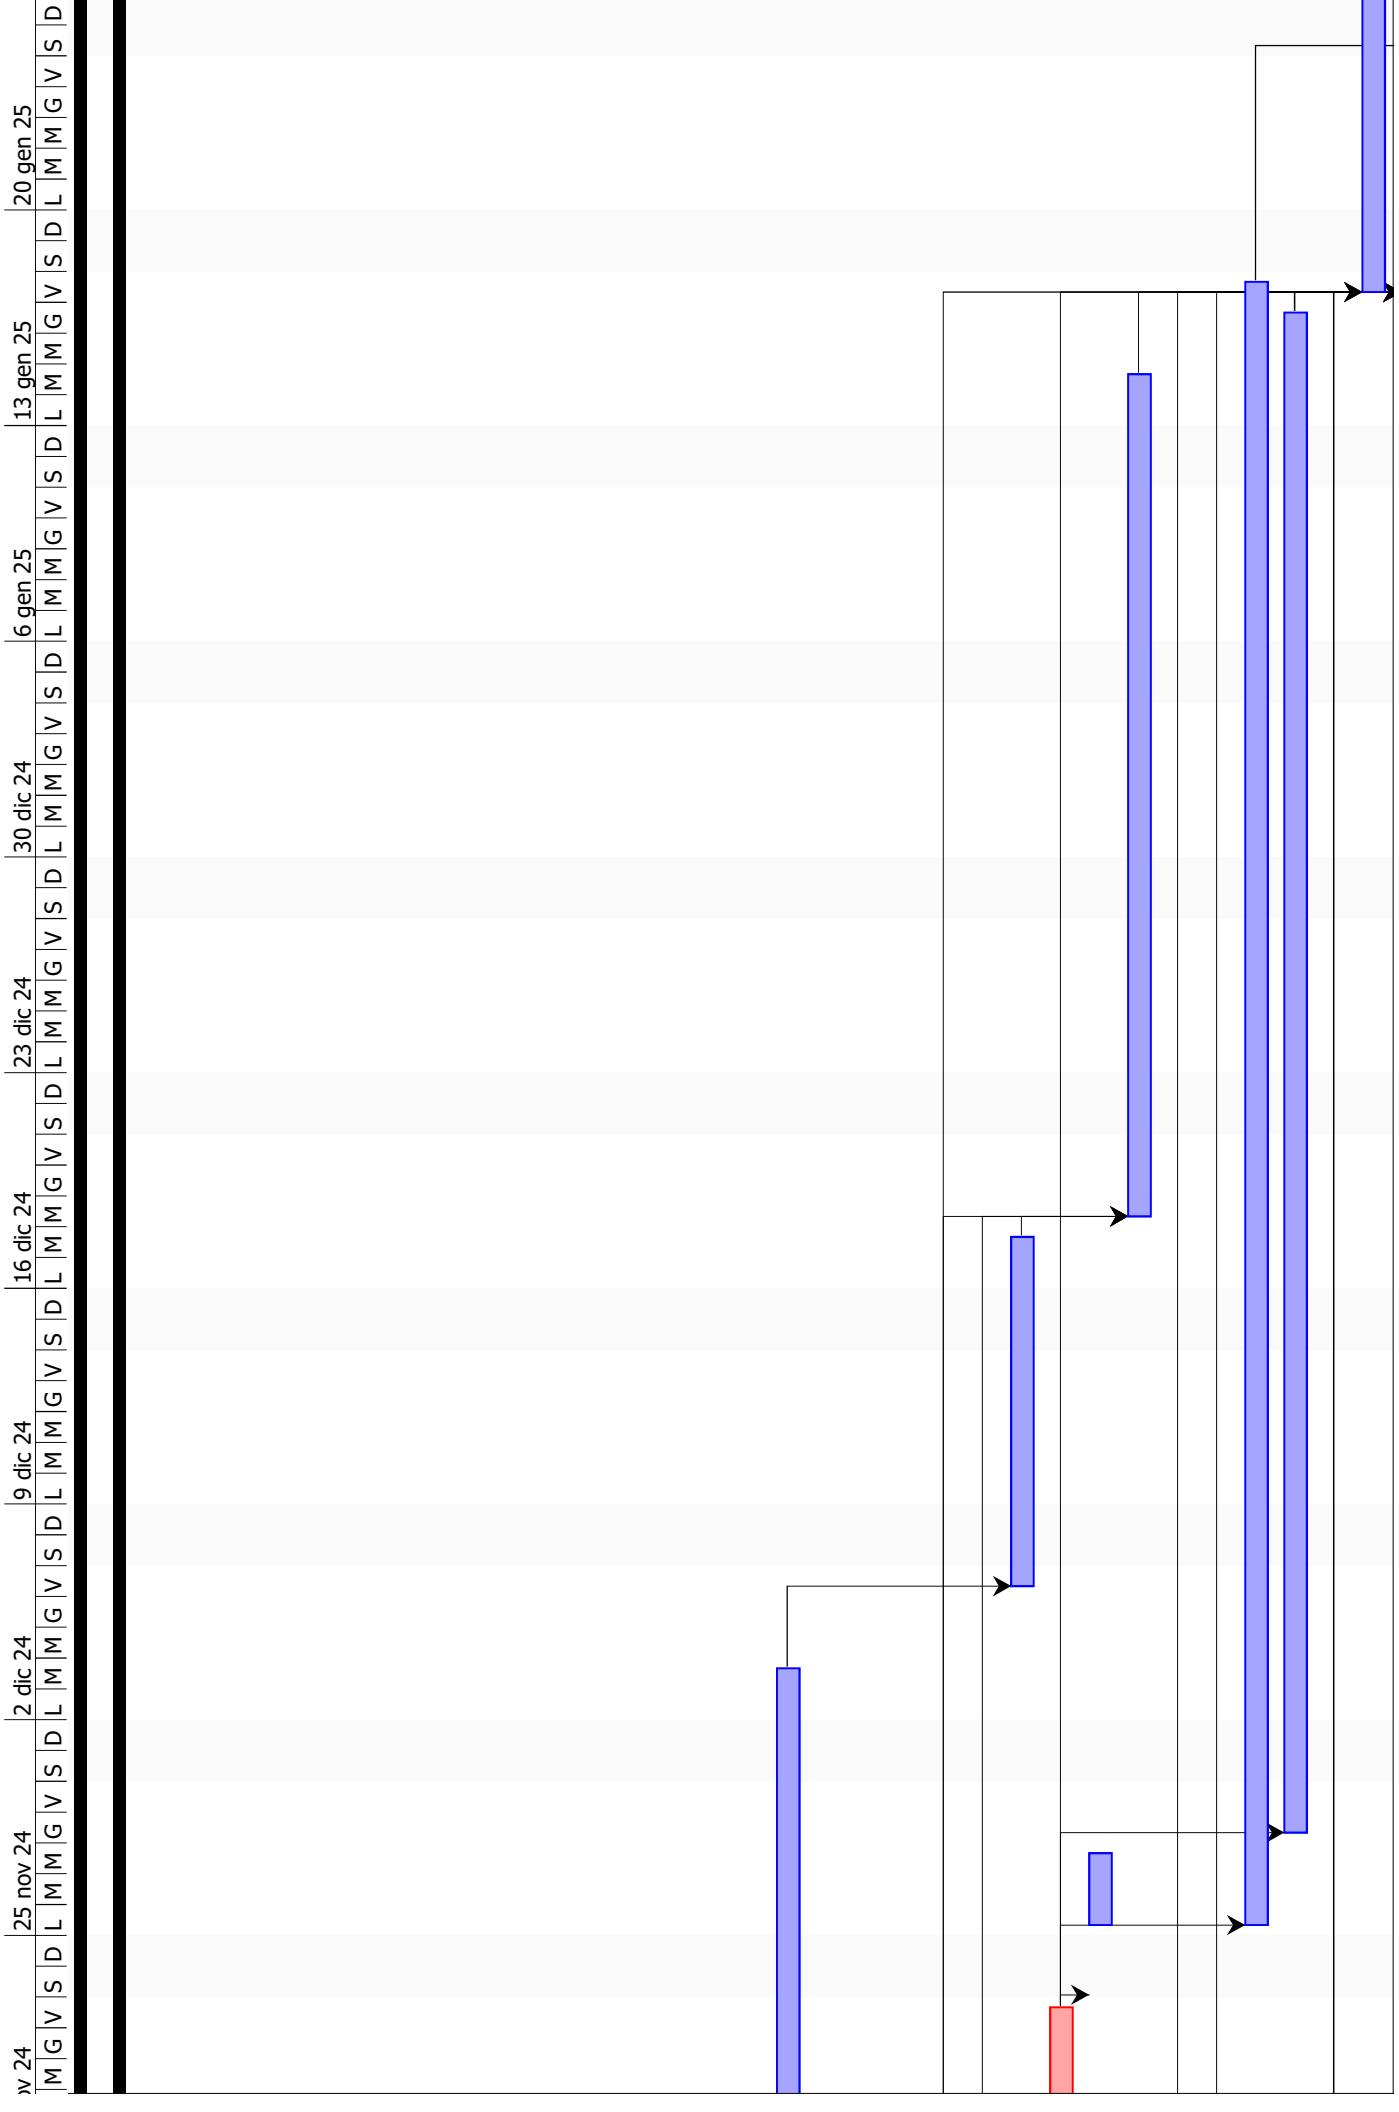

27 gen 25	3 feb 25	10 feb 25	17 feb 25	24 feb 25	3 mar 25	10 mar 25	17 mar 25	24 mar 25	31 mar 25
L M M G V S	D L M M G V S	D L M M G V S	D L M M G V S	D L M M G V S	D L M M G V S	D L M M G V S	D L M M G V S	D L M M G V S	D L M M G V








	Nome	Durata	Predecessori	1 apr 24	8 apr 24	15 apr 24	22 apr 24	29
				V   S   D   L   M   M   G   V   S   D   L   M   M   G   V   S   D   L   M   M   G   V   S   D   L	V   S   D   L   M   M   G   V   S   D   L   M   M   G   V   S   D   L   M   M   G   V   S   D   L	V   S   D   L   M   M   G   V   S   D   L   M   M   G   V   S   D   L   M   M   G   V   S   D   L	V   S   D   L   M   M   G   V   S   D   L   M   M   G   V   S   D   L   M   M   G   V   S   D   L	
35	Raccolta e smaltimento materiali di risulta	20 giorni	26;28;29;32;33;30					
36	Ripristino dei luogni	28 giorni	35					
37	Fine lavori di cantiere	0 giorni	36					
38	<b>FASE02: COLLAUDO</b>	<b>120 giorni</b>						
39	Verifica delle tensioni a vuoto	80 giorni	31FS+5 giorni					
40	Verifica delle correnti di corto circuito	80 giorni	39SS					
41	Verifica del funzionamento degli inverter	40 giorni	40					
42	Verifiche in corrente alternata	40 giorni	41SS					
43	Termine procedure di collaudo	0 giorni	42					
44	Entrata in esercizio dell'impianto	0 giorni	43					



8 lug 24	15 lug 24	22 lug 24	29 lug 24	5 ago 24	12 ago 24	19 ago 24	26 ago 24	2 set 24	9 set 24
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
G	G	G	G	G	G	G	G	G	G

16 set 24		23 set 24		30 set 24		7 ott 24		14 ott 24		21 ott 24		28 ott 24		4 nov 24		11 nov 24		18 nov 24							
V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M

	25 nov 24			2 dic 24			9 dic 24			16 dic 24			23 dic 24			30 dic 24			6 gen 25			13 gen 25			20 gen 25														
	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D						

