

**Fasi esecutive**

Fase 0. STATO ATTUALE

Fase 1. RIMOZIONE ARMAMENTO: rimozione dell'armamento esistente sull'intera galleria




Fase 2. DEMOLIZIONE E SCAVO: demolizione dell'arco rovescio esistente e scavo fino alla profondità di progetto per campioni da 2 m non consecutivi (\*)

Fase 3. GETTO ARCO ROVESCIO: chiusura del campione in scavo col getto del nuovo arco rovescio (\*)



Fase 4. COMPLETAMENTO PIANO DI REGOLAMENTO: al completamento del nuovo arco rovescio sull'intera galleria, getto di completamento del piano di regolamento e realizzazione della canaletta centrale di raccolta acque

Fase 5. NUOVO ARMAMENTO E FINITURE: posa in opera del nuovo armamento e del camminamento di servizio removibile

(\*) L'intervento di demolizione e scavo (FASE 2) e il successivo getto dell'arco rovescio (FASE 3) dovrà essere eseguito per campioni da 2 m non consecutivi, garantendo che il campione in scavo sia preceduto e seguito da almeno 2 campioni di arco rovescio esistente o di nuovo arco rovescio gettato da almeno una settimana (vedi schema planimetrico).

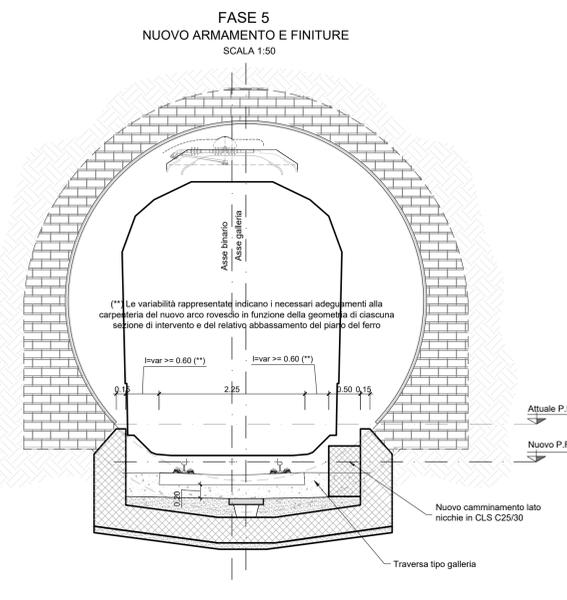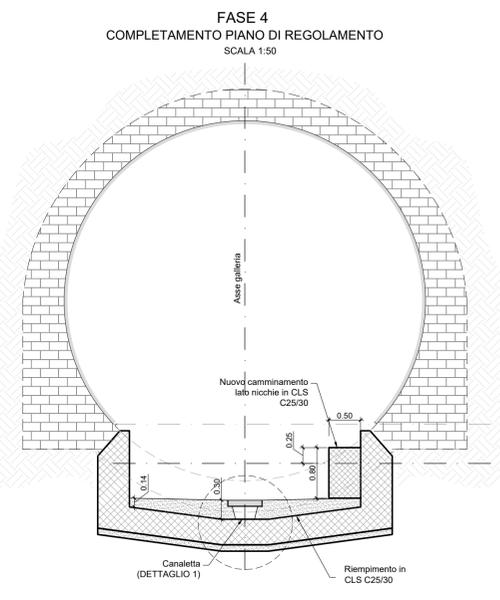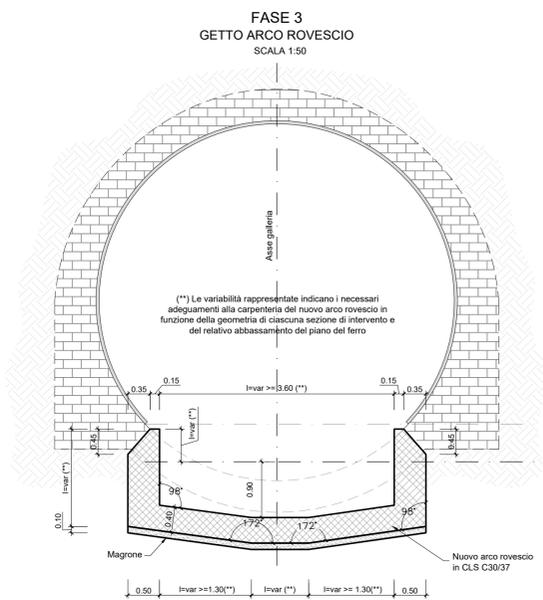

WBS	GALLERIA	L (m)	Nessun intervento	Variante allometrica	Variante planimetrica	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3A	TIPO 3B	TIPO 3L	TIPO 4
GN02	Capraia 1	212		X				6	5		
GN03	Capraia 2	251		X			251	6	3		2
GN04	Artificiale Leonessa	157		X		157					
GN05	Caprannoia	339						5			
GN06	Paradiso	259		X	X						
GN07	Seminello	135						6	3		
GN08	Maria Giovanna	106						3	2	2	2
GN09	Solorzo	559		X				9			
GN10	Paglia	99						2			
GN11	Cardinale	1521						3	29		
GN12	Artificiale di Melit	77	X								
GN13	S. Agata	271	X								
GN14	Foresta 1	262	X								
GN15	Foresta 2	285	X								
GN16	Fontanaalba	875	X								
GN17	Mussone	334						15	2		
GN18	Pantano	207						4		2	8
GN19	Costantinopoli	368	X								
GN20	Pietre fiere	381	X								
GN21	Barile	235						3			
GN22	Artificiale Barile	71		X		71					
GN23	Ripascandola	171		X				1	2		
GN24	Casalichio	135						3			
GN25	Colle delle Spine	170							4		
GN26	Fallosa	225						6			
GN27	Agronante	316						8			
GN28	Pietramartelluzza	214						8			
GN29	Cerasa	206						6			
GN30	Quattrocochi	1827		X		200	3	7			
GN31	Camraro	186						6			
GN32	Gardineria	204	X							1	5
GN33	Appennino	3320						13	4		
GN34	Pietracolpa	1920						2			
GN35	Bianca	227	X								
GN36	Viggiani	181		X			181	2			
GN37	Artificiale Potenza	93						2	2	3	
GN38	Santa Maria	535						6	3	1	
GN39	Camposanto	168		X				2			
TOTALI						228	632	117	74	8	20

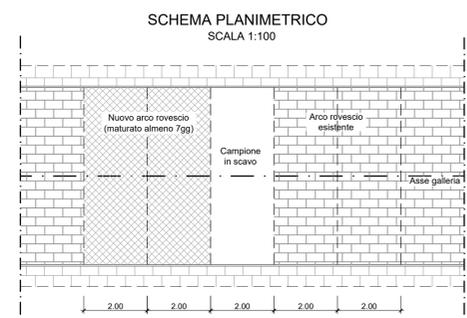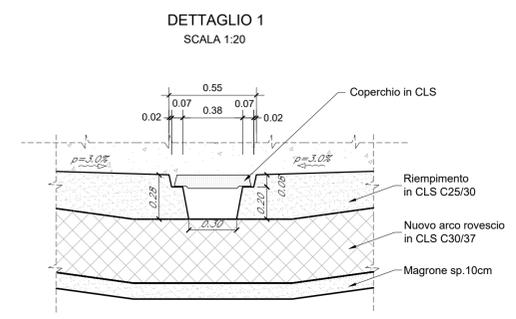

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE:

PROGETTAZIONE:

**PROGETTO ESECUTIVO**

**LINEA FOGGIA - POTENZA**  
**TRATTA ROCCHETTA - POTENZA**

**Elettrificazione a 3 kVcc - LOTTO 1.2**

GALLERIE - DEFINIZIONE INTERVENTI TIPO  
INTERVENTI SULLE GALLERIE - INTERVENTO TIPO 1

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. Carlo IUSTORI  
APPALTATORE: Il Direttore Tecnico Ing. Michele De Leo

SCALA: **VARIE**

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

**I A 7 Q 0 0 E Z Z W Z G N 0 0 0 0 0 0 1 C**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	L. Pierfelice	07/03/2023	F. De Fazio	07/03/2023	P. Lopez	07/03/2023	C. Iustori 09/11/2023
B	Revisione a seguito RDV "IATG-RV-000000008"	L. Pierfelice	20/07/2023	F. De Fazio	20/07/2023	P. Lopez	20/07/2023	
C	Revisione a seguito DCI	L. Pierfelice	09/11/2023	F. De Fazio	09/11/2023	P. Lopez		
