

VENTO SOLARE SRL
 VIA DELLA CHIMICA 103 - 85100
 POTENZA
 P.IVA 01981860768
ventosolaresrl@pec.it



CODE
SCS.DES.R.CIV.ITA.W.6411.008.00


PAGE
 1 di/of 3

AVAILABLE LANGUAGE: IT

IMPIANTO EOLICO SERRACAPRIOLA COMUNE DI SERRACAPRIOLA (FG) CRONOPROGRAMMA

SCS.DES.R.CIV.ITA.W.6411.008.00_Cronoprogramma.docx


00	16/11/2023	EMISSIONE	SCS INGEGNERIA	SCS INGEGNERIA	SCS INGEGNERIA A.Sergi
REV	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
IMPIANTO / Plant IMPIANTO EOLICO SERRACAPRIOLA		CODE			
<small>GROUP</small>	<small>FUNCION</small>	<small>TYPE</small>	<small>DISCIPLINE</small>	<small>COUNTRY</small>	<small>TEC</small>
SCS	DES	R	C I V I T A W	6 4 1 1	0 0 8 0 0
CLASSIFICATION:			UTILIZATION SCOPE : PROGETTO DEFINITIVO		

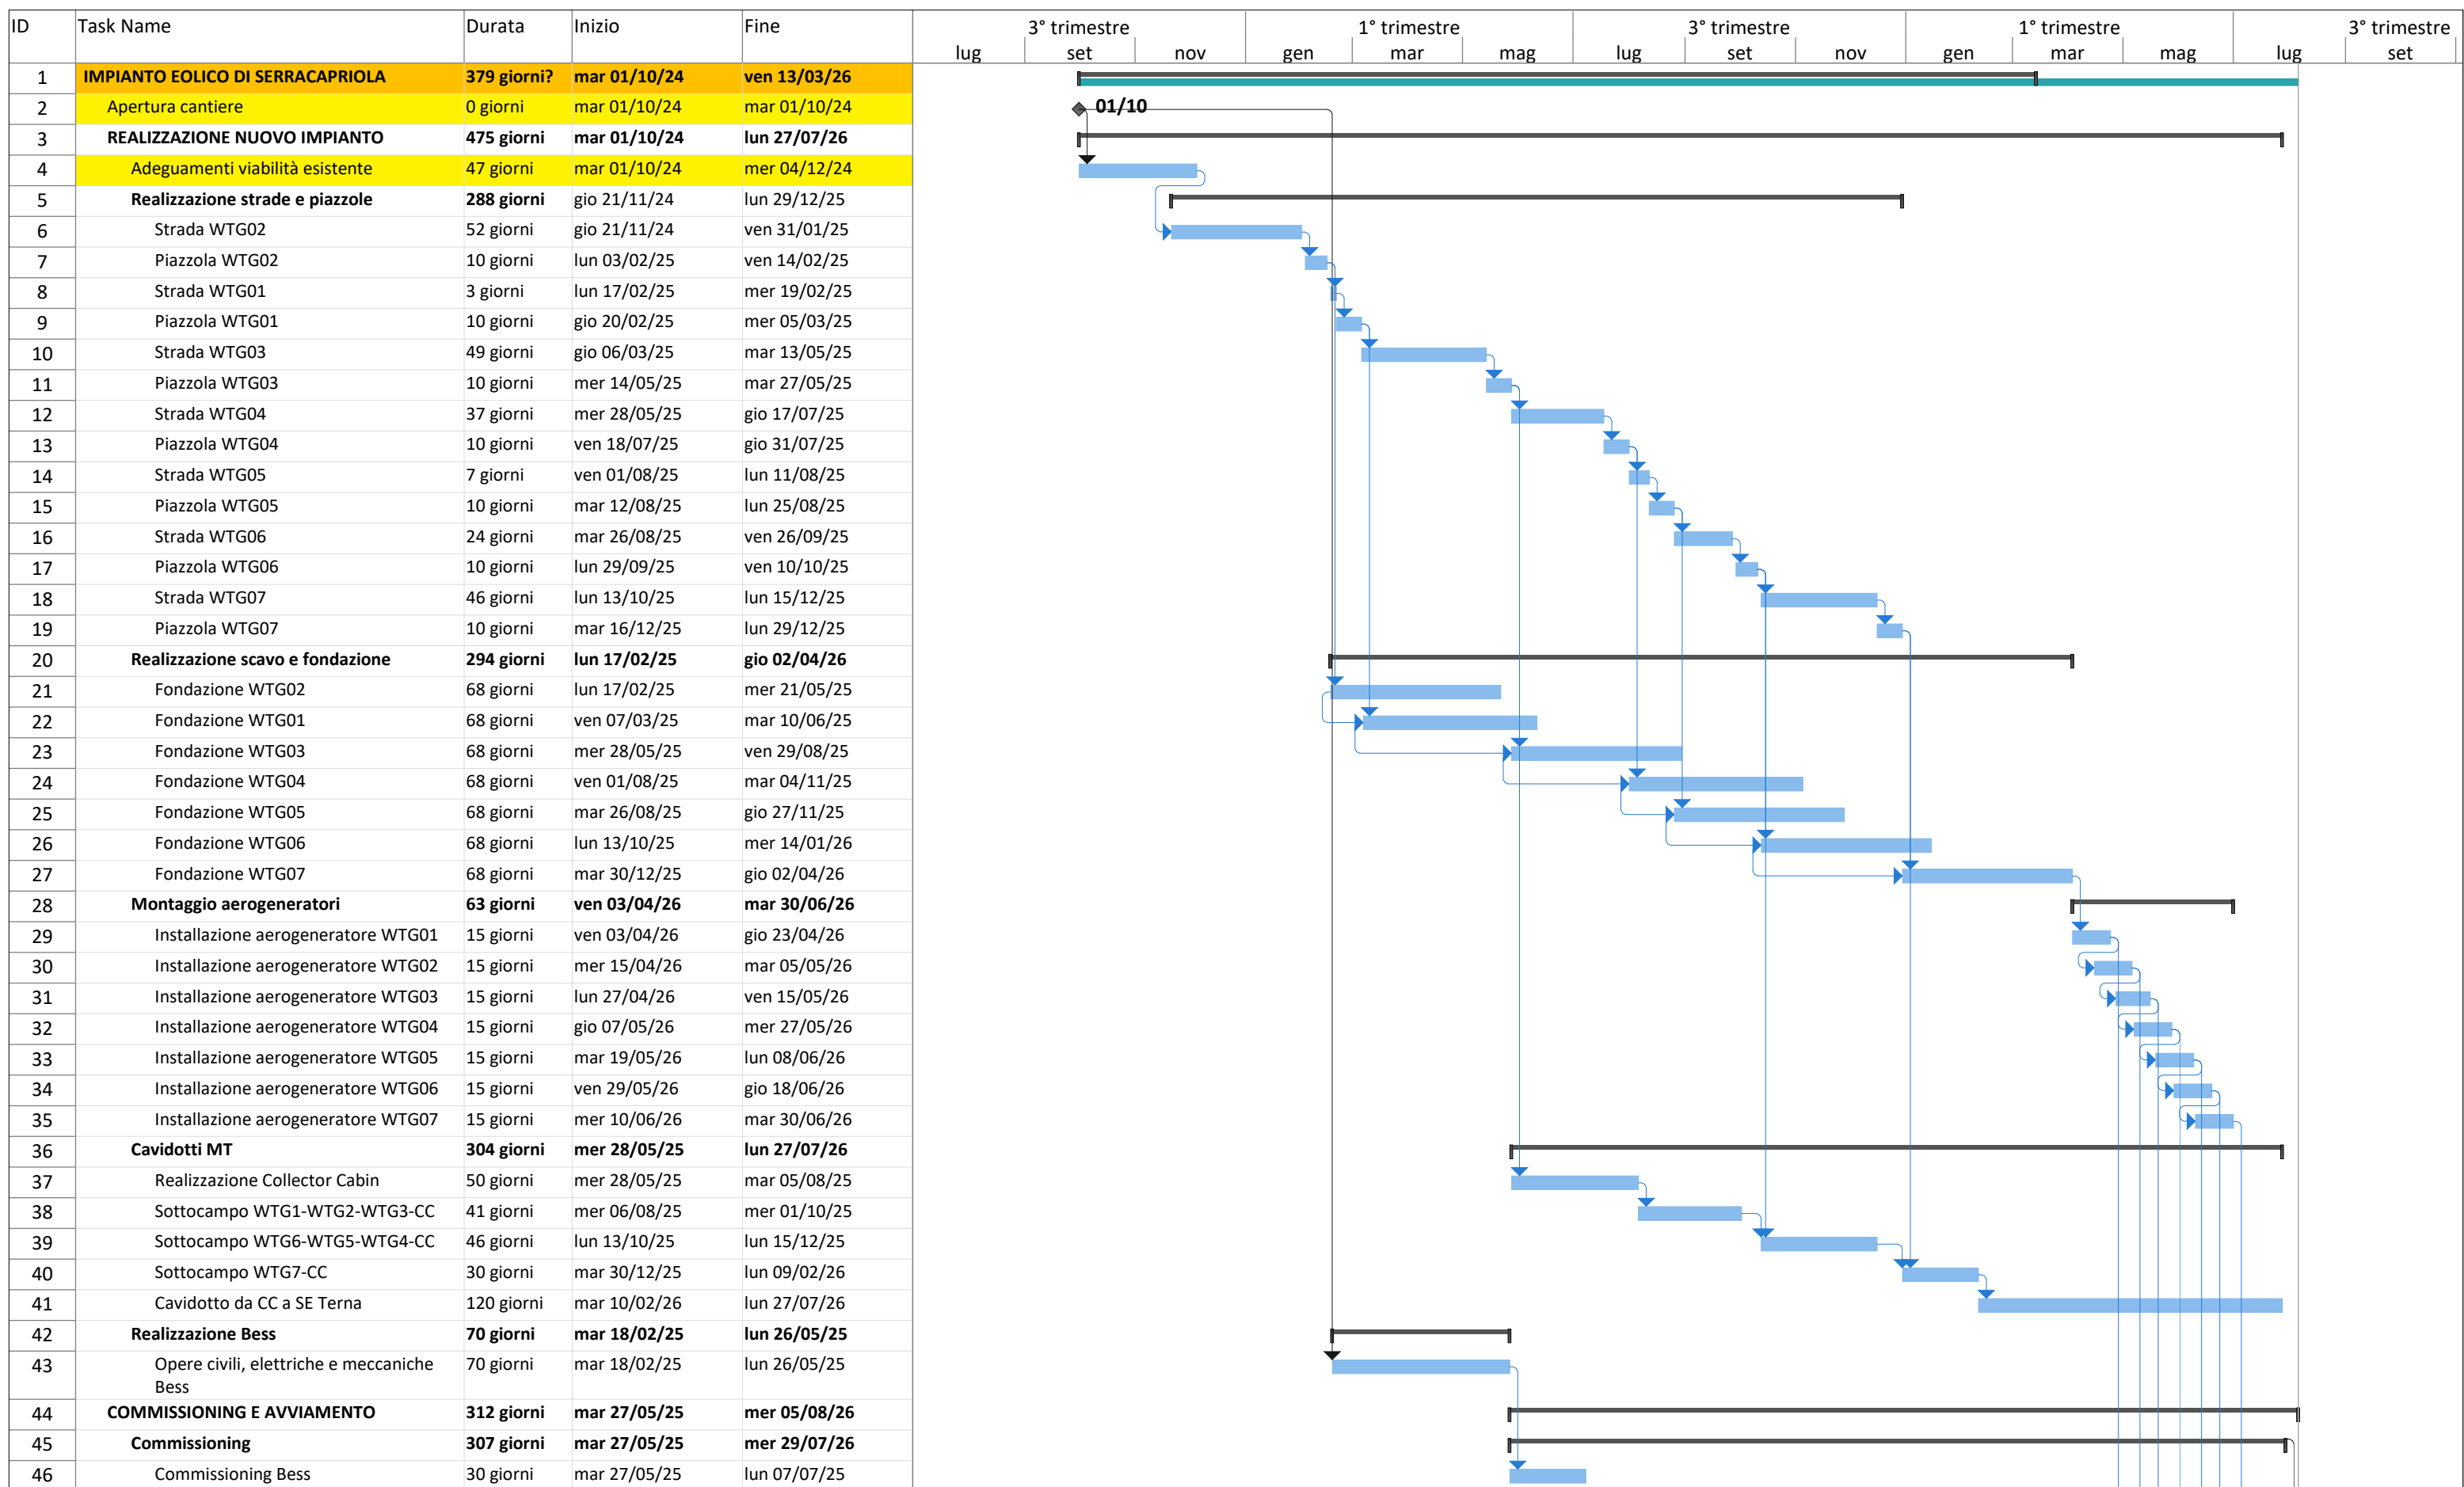

Project: Cronoprogramma Serracapriola
Date: gio 05/10/23

Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Slippage	
Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Avanzamento manuale	

ID	Task Name	Durata	Inizio	Fine	3° trimestre			1° trimestre			3° trimestre			1° trimestre			3° trimestre	
					lug	set	nov	gen	mar	mag	lug	set	nov	gen	mar	mag	lug	set
47	Commissioning WTG01	21 giorni	ven 24/04/26	ven 22/05/26														
48	Commissioning WTG02	21 giorni	mer 06/05/26	mer 03/06/26														
49	Commissioning WTG03	21 giorni	lun 18/05/26	lun 15/06/26														
50	Commissioning WTG04	21 giorni	gio 28/05/26	gio 25/06/26														
51	Commissioning WTG05	21 giorni	mar 09/06/26	mar 07/07/26														
52	Commissioning WTG06	21 giorni	ven 19/06/26	ven 17/07/26														
53	Commissioning WTG07	21 giorni	mer 01/07/26	mer 29/07/26														
54	1° parallelo con rete elettrica	0 giorni	mer 29/07/26	mer 29/07/26														
55	Avviamento	5 giorni	gio 30/07/26	mer 05/08/26														
56	Entrata in esercizio - COD	0 giorni	mer 05/08/26	mer 05/08/26														

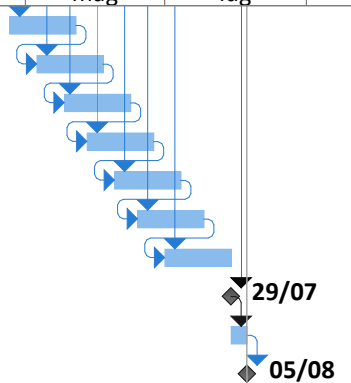

Project: Cronoprogramma
Serracapriola
Date: gio 05/10/23

Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Progress	
Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Slippage	
Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Avanzamento manuale	
