

Comune di Ascoli Satriano

Provincia di Foggia



PROPONENTE:

AME ENERGY S.r.I.

Via Pietro Cossa, 5 20122 Milano (MI) ameenergysrl@legalmail.it P. IVA 12779110969

Progetto di un impianto eolico, denominato "Masserie Leone", costituito da n. 5 aerogeneratori della potenza unitaria di 6,6 MW, per una potenza complessiva di 33 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Ascoli Satriano (FG)

ELABORATO:		OGGETTO DELL'ELABORATO	
R032		Cronoprogran	nma dei lavori
	AZIONE:	PROGETTISTA: Ing. Federica SCARANO Ing. Carlo RUSSO Arch. Giovanni MAGGINO Corso Romuleo n. 245 83044 Bisaccia (AV) tel. 0827.89652 info@sirmes.it sirmes@pec.it	CARLURUSSO PROFESSIONALE PROFESSIONALE COLH 1719 ING. FEDERICA SETTORE INDUSTRIALE SEZIONE A -
EMISSIONE:	DATA:	CODICE PROGETTO:	REDATTO DA:
1a	settembre 2023	ASCOL003E33	Ing. F. Scarano Arch. G. Maggino Ing. Carlo Russo
2a			
3a			
42			



INDICE

1	DATI GENERALI D'IMPIANTO	. 2
2	UBICAZIONE DEL PROGETTO	. 2
3	FASE DI CANTIERE - REALIZZAZIONE	. 4
4	TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI - CRONOPROGRAMMA	. 5



1 DATI GENERALI D'IMPIANTO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione energia rinnovabile da fonte eolica, composto da n° 5 aerogeneratori da 6,6 MW, per una potenza di 33 MW, del relativo Cavidotto MT di collegamento alla Stazione Elettrica di Utenza, da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (Provincia di Foggia).

Nello specifico, il progetto prevede:

- n° 5 aerogeneratori Siemens Gamesa SG170 6,6 MW, tipo tripala diametro 170 m altezza misurata al mozzo 135 m, altezza massima 220 m;
- viabilità di accesso, con carreggiata di larghezza pari a 5,50 m;
- n° 5 piazzole di costruzione, necessarie per accogliere temporaneamente sia i componenti delle macchine che i mezzi necessari al sollevamento dei vari elementi, di dimensioni di circa 62 x 68 m. Tali piazzole, a valle del montaggio dell'aerogeneratore, vengono ridotte ad una superficie di circa 867 mq., in aderenza alla fondazione, necessarie per le operazioni di manutenzione dell'impianto;
- una rete di elettrodotto interrato a 30 kV di collegamento interno fra gli aerogeneratori;
- una rete di elettrodotto interrato costituito da dorsali a 30 kV di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di trasformazione 30/36 kV;
- una sottostazione di trasformazione 30/36 kV completa di relative apparecchiature ausiliarie (quadri, sistemi di controllo e protezione, trasformatore ausiliario);
- impianto di rete per la connessione da definire in funzione della soluzione tecnica di connessione.

2 UBICAZIONE DEL PROGETTO

L'Impianto Eolico, costituito da n° 5 aerogeneratori, ricadenti nel territorio del Comune di Ascoli Satriano (Provincia di Foggia), il Cavidotto MT attraversa lo stesso comune per giungere alla Stazione Elettrica d'Utenza ubicata nello stesso Comune di Ascoli Satriano (FG), quest'ultima connessa in A.T. 36 kV alla Rete Elettrica Nazionale.

Il Cavidotto MT, composto da due linee avrà una lunghezza di circa 13.259 ml. Nello specifico la linea A collegherà gli aerogeneratori AS02-AS01 alla SSU ed avrà una



lunghezza di 4.245 ml., la linea B collegherà gli aerogeneratori AS05-AS04-AS03 alla SSU ed avrà una lunghezza di 9.014 ml, mentre l'Impianto di Utenza per la connessione avrà una lunghezza di circa 204 metri.

Si riporta di seguito stralcio della corografia di inquadramento su IGM:

Legenda

•	Aerogeneratore SG170 - 6,6 MW
O	Piazzola permanente
	Strade nuove permanenti
	Piazzole provvisorie Allargamenti provvisori
	Area stoccaggio pale
W	Area deposito materiale
	Area dl Cantlere
\bigcirc	Attraversamento Autostrada A16 Strada Provinciale 95
	Cavidotto Linea A
	Cavidotto Linea B
	Cavidotto AT
	Vlabilità esistente da adeguare



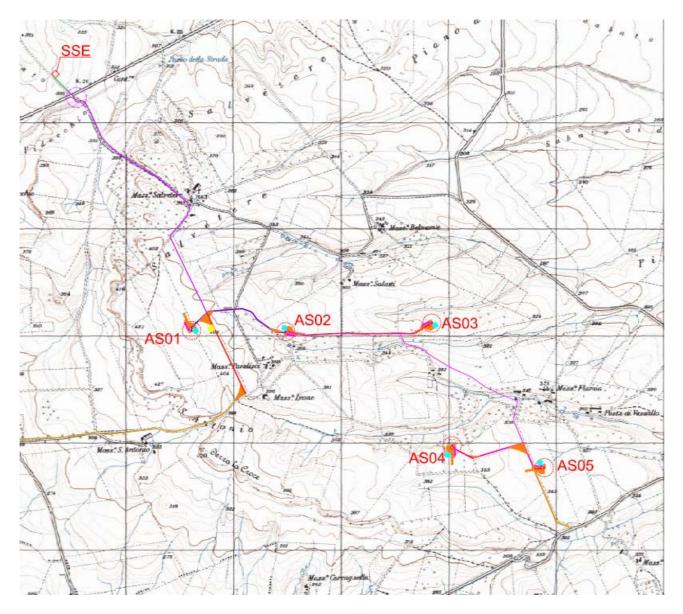


Figura 1 – Corografia di inquadramento

3 FASE DI CANTIERE - REALIZZAZIONE

Nel corso di tale fase, si effettua: l'allestimento cantiere, l'adeguamento delle strade esistenti e la realizzazione di nuove strade, la realizzazione delle piazzole di montaggio degli aerogeneratori, la realizzazione delle fondazioni, il trasporto degli aerogeneratori ed il successivo montaggio, la realizzazione dei cavidotti interrati per la posa dei cavi elettrici, la realizzazione della stazione elettrica d'utenza e l'installazione di diversi manufatti (recinzione e cancello, pali di illuminazione e videosorveglianza).



4 TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI - CRONOPROGRAMMA

DIAGRAMMA DI GANTT																																												
(FA	Δ;	S	ı	Α	Т	Т	U	J Æ	١٦	ΓΙ	V	Έ	: 1	IN	1F	9	Α	N	IT	·C)	E	0	L	.10	20	O))																
ATTIVITA' FASI LAVORATIVE				е	m			е	mese)			mese 5			е				mese						se	r							•				è	m				
		1 1234		1	2 3		4	1 :		1	1 1	_	4	4	1			4 -		6	34	1			4		8	3 4	. 1		9 	4	1		3	4	1 :	2:	<u> </u>	4	_	12		
)				Ŭ									ľ		Ŭ					Ľ										•			Ŭ								
Redazione progetto esecutivo																																												
Deposito opere civili																																												
Picchettamento delle aree																																												
Realizzazione area di cantiere e recinzione provvisionale																																												
Realizzazione della viabilità																																												
Realizzazione fondazioni c.a. aereogeneratori																																												
Posa in opera di cavidotti MT																																												
Trasporto e montaggio aereogeneratori																																												
Costruzione SSE																																												
Opere elettriche e di connessione alla RTN																																												
Regolazione e Collaudo finale									Ī	Ī	Ī																																	
Pulizia e sistemazione finale del sito																																												
