




PIANO DI DISMISSIONE GR 3-4 FUSINA  
C.le A. Palladio  
Enel Produzione

ID	Nome attività	Inizio	Fine	01 gennai 08/01/24	01 marzo 05/03/24	01 maggio 01/05/24	01 luglio 07/07/24	01 settem 09/09/24	01 novem 11/11/24	01 genna 12/01/25	01 marzo 03/03/25	01 maggio 05/05/25	01 luglio 07/07/25	01 settem 09/09/25	01 novem 11/11/25	01 genna 12/01/26	01 marzo 03/03/26	01 maggio 05/05/26	01 luglio 07/07/26
1	<b>PROGRAMMA DI DISMISSIONE FS gr 3-4</b>	<b>19/02/24</b>	<b>20/07/26</b>																
2	Comunicazione inizio attività	19/02/24	01/03/24																
3	<b>Committenza</b>	<b>04/03/24</b>	<b>31/01/25</b>																
4	Contratto per pulzia Sili	04/03/24	08/11/24																
5	Contratto per scarifica carbonile	04/03/24	06/12/24																
6	Contratto per oli e chemical	04/03/24	31/01/25																
7	<b>Impianto Desox</b>	<b>04/03/24</b>	<b>02/01/26</b>																
8	Sezionamento delle principali apparecchiature di impianto: agitatori, pompe ventilatori, soffianti e motori.	04/03/24	05/07/24																
9	Rimozione fluidi di processo con pulizia serbatoi e vasche di drenaggio	04/03/24	16/08/24																
10	Sezionamento e pulizia filtri (gesso) nastro vuoto ed ausiliari	04/03/24	24/09/24																
11	Pulizia e Lavaggio treno nastri gesso e preparazione idrocycloni	04/03/24	14/02/25																
12	Pulizia Serbatoi Pre Scrubber e Main Scrubber	04/03/24	14/02/25																
13	Drenaggio e pulizia serbatoi temporanei	11/11/24	02/01/26																
14	Sezionamento e Pulizia sistema preparazione dosaggio calcare	11/11/24	28/04/25																
15	Svuotamento e Pulizia Sili Gesso	11/11/24	02/01/26																
16	Svuotamento e Pulizia Sili Calcare	11/11/24	02/01/26																
17	<b>Bunker e Mulini</b>	<b>04/03/24</b>	<b>25/04/25</b>																
18	Sezionamento elettrico dei componenti principali e ausiliari	04/03/24	05/07/24																
19	Pulizia mulini e componenti annessi.	04/03/24	27/09/24																
20	Pulizia e bonifica dei bunker e delle condotte	04/03/24	27/09/24																
21	Svuotamento e pulizia sistemi circuito lubrificazione	04/03/24	25/04/25																
22	<b>Sistema Combustibile liquido Gasolio di Avviamento caldaia, gasoli e altri oli</b>	<b>16/06/25</b>	<b>05/09/25</b>																
23	Isolamento elettrico e flangiatura linee di mandata e ricircolo	16/06/25	05/09/25																
24	Svuotamento e bonifica tubazione linee di mandata e ricircolo	16/06/25	05/09/25																

Progetto: Gantt dismissione Data: 28/02/24	Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
	Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
	Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
	Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			



PIANO DI DISMISSIONE GR 3-4 FUSINA  
C.le A. Palladio  
Enel Produzione

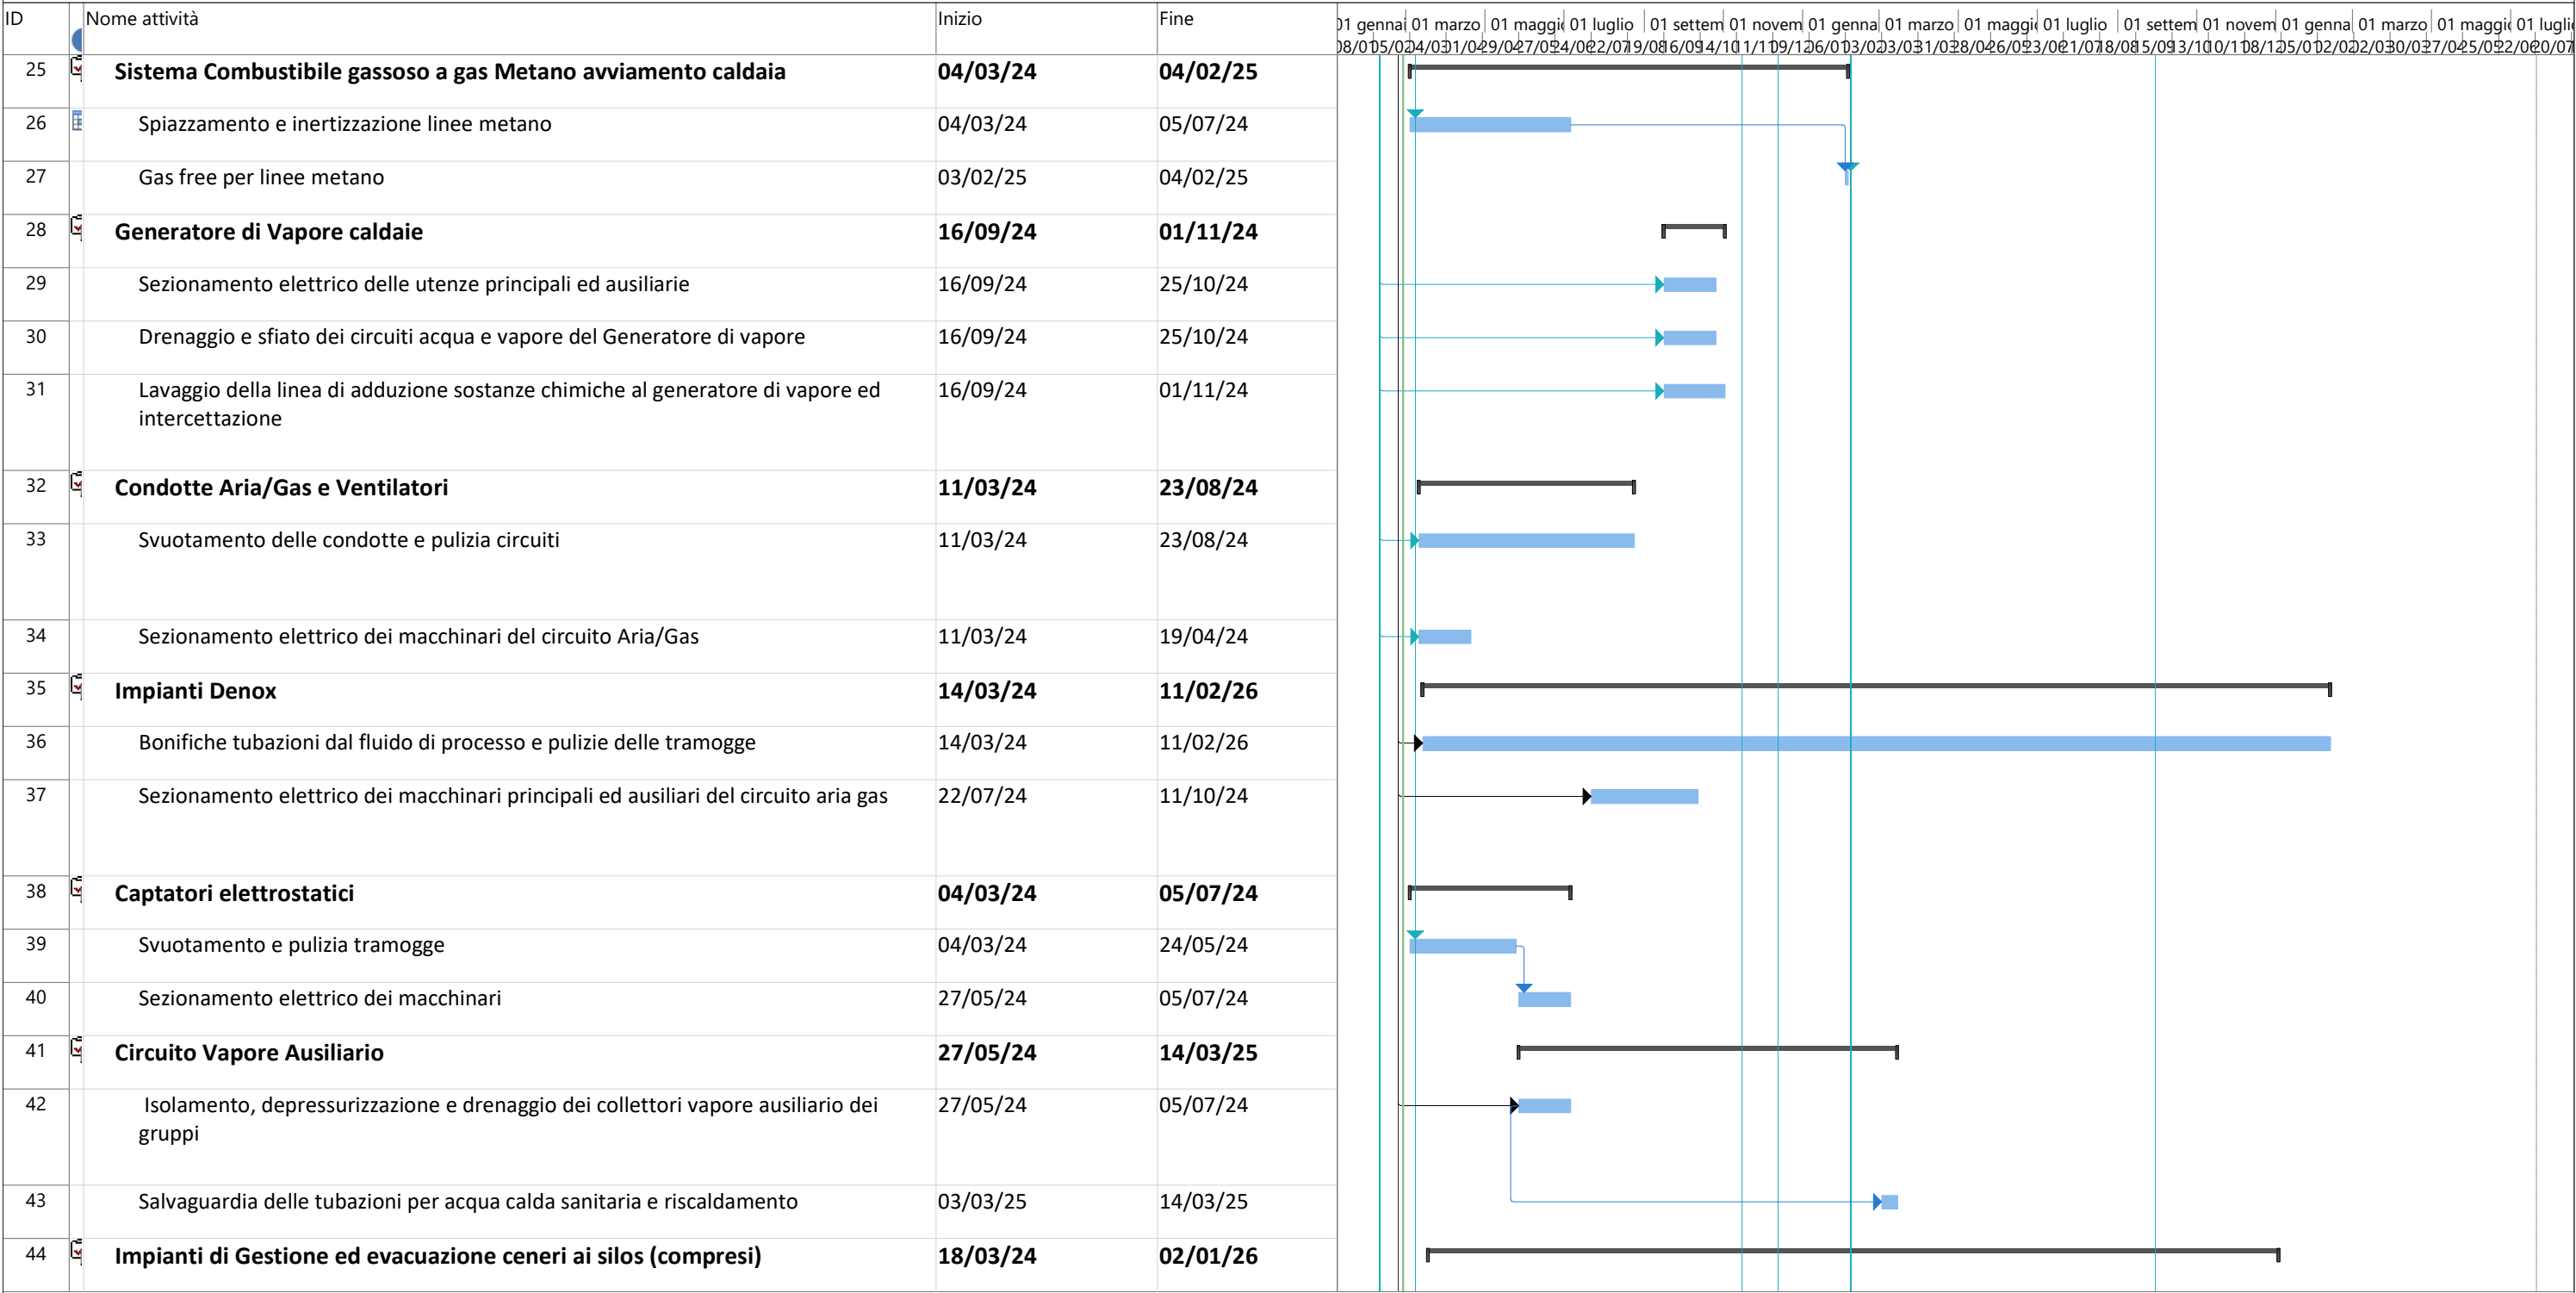

Progetto: Gantt dismissione  
Data: 28/02/24

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale



PIANO DI DISMISSIONE GR 3-4 FUSINA  
C.le A. Palladio  
Enel Produzione

ID	Nome attività	Inizio	Fine	01 gennai 08/01/24	01 marzo 04/03/24	01 maggio 01/05/24	01 luglio 01/07/24	01 settem 01/09/24	01 novem 01/11/24	01 genna 01/01/25	01 marzo 01/03/25	01 maggio 01/05/25	01 luglio 01/07/25	01 settem 01/09/25	01 novem 01/11/25	01 genna 01/01/26	01 marzo 01/03/26	01 maggio 01/05/26	01 luglio 01/07/26
45	Svuotamento e pulizia sili ceneri e sistemi principali ed ausiliari	11/11/24	02/01/26																
46	Sezionamento elettrico dei componenti dell'impianto	18/03/24	26/04/24																
47	Ciclo condensato acqua alimento, spillamenti e drenaggi	04/03/24	18/07/25																
48	Sezionamento elettrico e Drenaggio delle utenze principali ed ausiliarie.	04/03/24	12/04/24																
49	Svuotamento cassoni olio	03/02/25	18/07/25																
50	Svuotamento riscaldatori lato acqua e lato vapore	04/03/24	16/08/24																
51	Intercettazione dei circuiti in oggetto (acqua integrazione/riempimento/riscaldatori)	04/03/24	16/08/24																
52	Svuotamento serbatoi reagenti chimici	03/02/25	18/07/25																
53	ITC - Impianto trattamento condensato	03/02/25	14/03/25																
54	Disalimentazione, bonifica sistema ITC comprensiva dei serbatoi annessi	03/02/25	14/03/25																
55	Turbine vapore AP-MP-BP e relativi alternatori raffreddati ad idrogeno	04/03/24	20/06/25																
56	Sezionamento elettrico delle utenze principali/ausiliarie	02/04/24	13/05/24																
57	Svuotamento e bonifica circuiti olio, cassone olio e bowser	03/02/25	20/06/25																
58	Spiazzamento idrogeno alternatori e messa in aria	04/03/24	12/04/24																
59	Rimozione pacchi idrogeno	15/04/24	24/05/24																
60	Disalimentazione, intercettazione e messa in sicurezza dei sistemi di olio tenute idrogeno e lo svuotamento del sistema olio tenuta	03/02/25	14/03/25																
61	Disalimentazione, intercettazione e messa in sicurezza sistema acqua raffreddamento dell'intero circuito	02/04/24	24/06/24																

Progetto: Gantt dismissione Data: 28/02/24	Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
	Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
	Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
	Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			



PIANO DI DISMISSIONE GR 3-4 FUSINA  
C.le A. Palladio  
Enel Produzione

ID	Nome attività	Inizio	Fine	01 gennai 08/01/24	01 marzo 05/03/24	01 maggio 01/05/24	01 luglio 01/07/24	01 settem 01/09/24	01 novem 01/11/24	01 genna 01/01/25	01 marzo 01/03/25	01 maggio 01/05/25	01 luglio 01/07/25	01 settem 01/09/25	01 novem 01/11/25	01 genna 01/01/26	01 marzo 01/03/26	01 maggio 01/05/26	01 luglio 01/07/26
62	Disalimentazione e messa in sicurezza dei quadri comando e di potenza dei sistemi di eccitazione degli alternatori	02/04/24	24/06/24																
63	Condensatori e sistema acqua di circolazione	04/03/24	20/06/25																
64	Sezionamento elettrico delle utenze principali ed ausiliarie del circuito	04/03/24	12/04/24																
65	Chiusura valvole ingresso/uscita casse condensatore acqua di mare	15/04/24	05/07/24																
66	Messa in sicurezza impianto di produzione ed additivazione biossido di Cloro con svuotamento dei relativi materiali	03/02/25	20/06/25																
67	Carbonile e Sistema trasporto carbone (da carbonile ai bunker)	04/03/24	20/07/26																
68	Nastri carbone	04/03/24	06/06/25																
69	Sezionamento elettrico delle utenze principali ed ausiliarie	02/04/24	13/05/24																
70	Recupero materia prima da nastri e tramogge	04/03/24	12/04/24																
71	Svuotamento olio centraline e macchinari	01/04/24	16/08/24																
72	Messa in sicurezza e pulizia dei Ponti Gru	08/07/24	06/06/25																
73	Parco Carbone	02/04/24	20/07/26																
74	Svuotamento Carbonile area Sud	02/04/24	24/06/24																
75	Scarifica superficiale del carbonile area Sud	09/12/24	29/09/25																
76	Svuotamento Carbonile area centro nord	25/06/24	05/08/24																
77	Scarifica superficiale del carbonile area centro nord	30/09/25	20/07/26																
78	Area Trasformatori MT-AT	02/04/24	19/08/24																
79	Sezionamento elettrico e messa in sicurezza delle macchine	02/04/24	19/08/24																
80	Stazione Elettrica AT	02/04/24	06/01/25																
81	Messa in sicurezza elettrica dei macchinari afferenti a ciascun gruppo (Sezionatore di linea, TA, TV ed interruttori unipolari)	02/04/24	06/01/25																
82	Bonifica apparecchiature in SF6	02/04/24	16/09/24																

Progetto: Gantt dismissione Data: 28/02/24	Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
	Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
	Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
	Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			
