
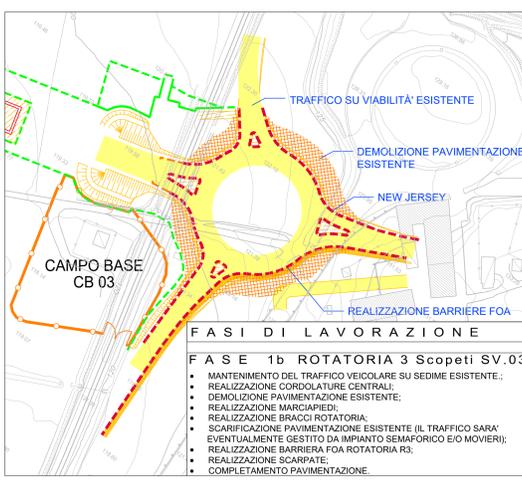
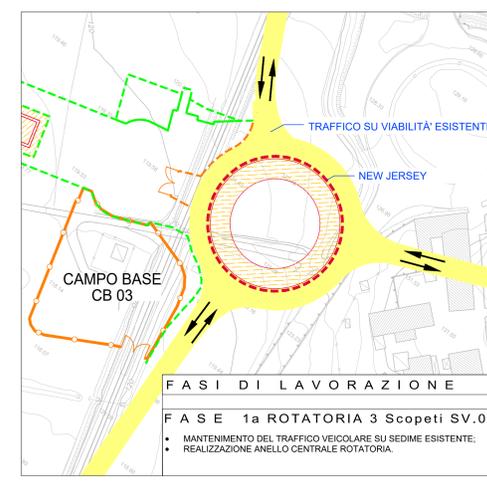
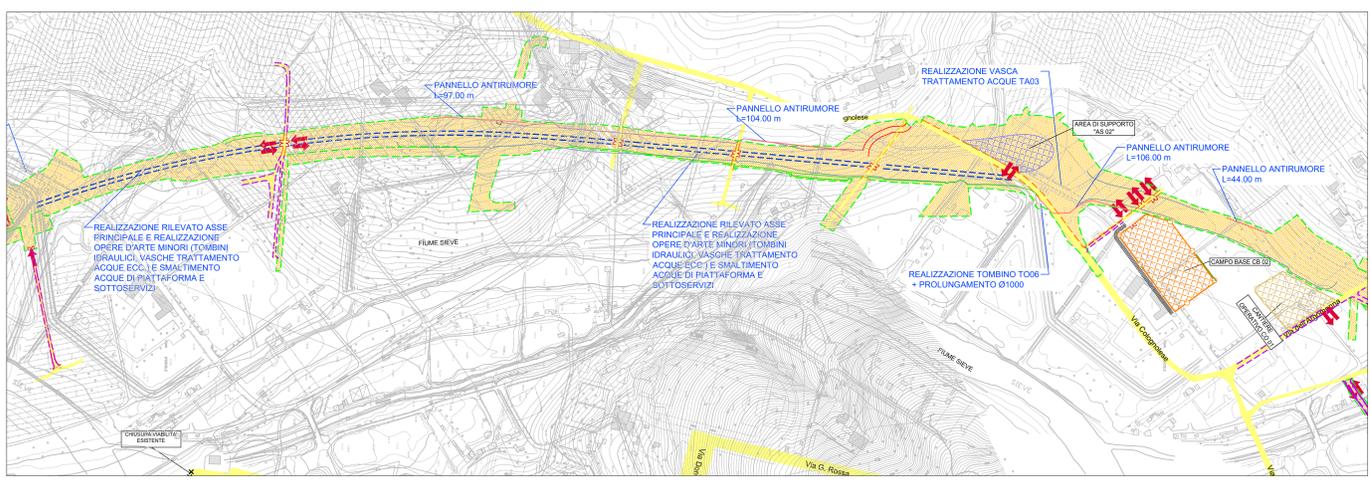
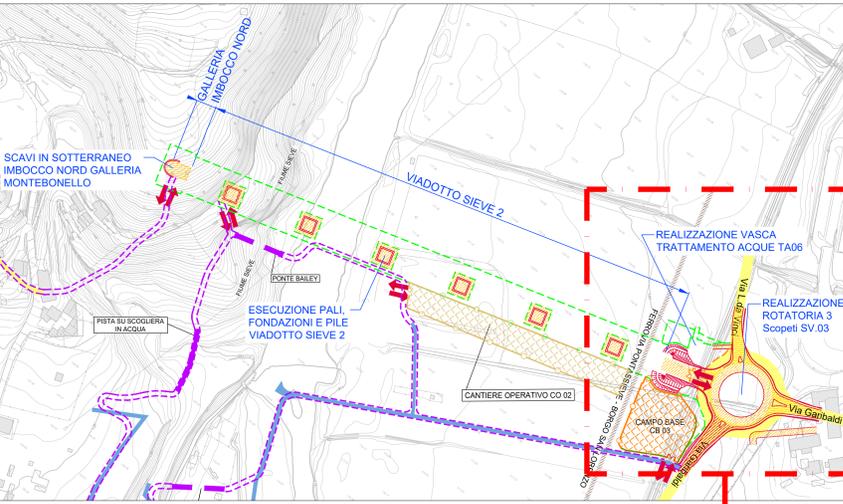
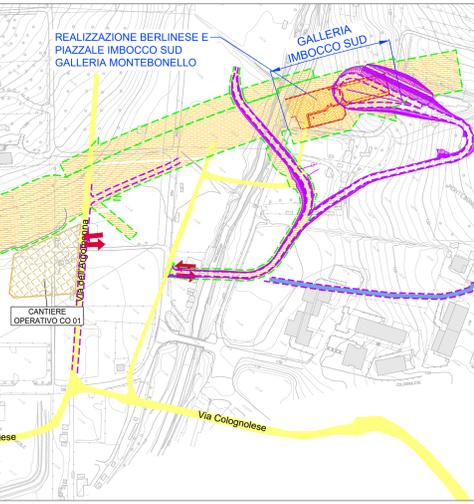


LEGENDA

- STATO DI PROGETTO
- DIREZIONE DEL DEFLUSSO VEICOLARE NELLE CARREGGIE ATTIVE
- ACCESSO AL CANTIERE
- VIABILITA' LOCALE ESISTENTE
- OPERE E CORPO STRADALE REALIZZATI NELLA FASE CORRENTE
- VIABILITA' ORDINARIA IN ESERCIZIO
- CAMPO BASE
- AREA TECNICA/CANTIERE OPERATIVO
- AREA DI SUPPORTO AL CANTIERE
- NUOVE PISTE INTERNE AL CANTIERE
- VIABILITA' PER CAMPI OPERATIVI DI NUOVA REALIZZAZIONE
- VIABILITA' PER CAMPI OPERATIVI DA RIQUALIFICARE
- VIABILITA' PER CAMPI OPERATIVI ESISTENTE
- NEW JERSEY IN CLS CON RETE SCHERMANTE
- RETE DI CANTIERE
- NEW JERSEY IN CLS

FASI DI LAVORAZIONE

- F A S E 0**
- MANTENIMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE SU SEDIME ESISTENTE;
  - INSTALLAZIONE CANTIERI OPERATIVI E AREE DI SUPPORTO;
  - INSTALLAZIONE PANNELLI MOBILI ANTIRUMORE CAMPO BASE CB 01 - CB 03;
  - REALIZZAZIONE PISTE DI CANTIERE;
  - REALIZZAZIONE VIABILITA' PER CAMPI OPERATIVI E/O AREE DI SUPPORTO;
  - RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' ESISTENTE PER CAMPI OPERATIVI E/O AREE DI SUPPORTO;
  - RISOLUZIONE INTERFERENZE E REALIZZAZIONE DI PASS PROVVISORI;
  - INSTALLAZIONE PONTI BAILEY.
- F A S E 1**
- MANTENIMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE SU SEDIME ESISTENTE;
  - INSTALLAZIONE REGIONI E NEW JERSEY CON E SEGNALETICA PROVVISORIA DI CANTIERE;
  - REALIZZAZIONE RILEVATO, SOTTOPASSO AGRICOLO, TOMBINI IDRAULICI, SMALTIMENTO ACQUE E SOTTOSERVIZI VARIANTE SS67 RAMO OVEST SV 01;
  - ESECUZIONE PALI, FONDAZIONI E PILE "VIADOTTO SIEVE 1";
  - REALIZZAZIONE RILEVATO E OPERE D'ARTE MINORI (TOMBINI IDRAULICI, VASCHE TRATTAMENTO ACQUE, SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA E SOTTOSERVIZI ASSE PRINCIPALE);
  - REALIZZAZIONE BERLINESI E DEL PIAZZALE DELL'IMBOCCO SUD "GALLERIA MONTEBONELLO";
  - SCAVI IN SOTTERRANEO DELL'IMBOCCO NORD "GALLERIA MONTEBONELLO";
  - REALIZZAZIONE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA, SOTTOSERVIZI, BARRIERE DI SICUREZZA E CORPO STRADALE, BRACCI ROTATORIA 3 "Scopeti" SV 03 (VEDERE FASI 1a-1b);
  - ESECUZIONE PALI, FONDAZIONI E PILE "VIADOTTO SIEVE 2";

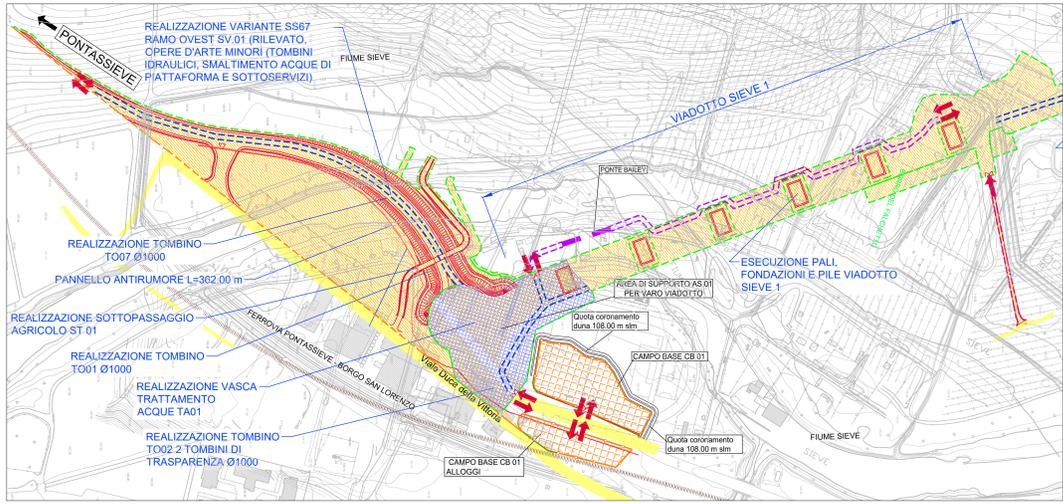

**Sanas**  
GRUPPO FS ITALIANE

**Direzione Tecnica**

S.S. 67 "Tosco Romagnola"  
Lavori di adeguamento della S.S. 67 nel tratto tra la località S.Francesco in Comune di Pelago e l'abitato di Dicomano.

Variante di Rufina (FIN) - LOTTI 2A e 2B

**PROGETTO DEFINITIVO** cod. F1462

PROGETTAZIONE: RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI	MANDATARIA: <b>PROITER</b>	MANDANTI: <b>sinergo</b> <b>VA</b>
IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Ing. Riccardo Formis - Società Pro Ter Srl Stabile Ingegneri Provincia di Milano n. 18945	IL GEODOLLO: Dott. Massimo Merzoni - Società Pro Ter Srl Dott. Giorgio de la Torre n. 762	
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Massimo Merzoni - Società Pro Ter Srl Dott. Angelo Formis di Torino n. 1022	VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO: Ing. Francesco Pisan	
PROTOCOLLO:	DATA:	

**06 - CANTIERI E FASI ESECUTIVE**

Fasi costruttive - tavola 1

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
ACNO01113	T00-CAD-CAN-PP01.dwg	B	1:200
D	UV_PROG		
C	COLORE		
B	Revisione a seguito di istruttoria ANAS	02/2024	Ing. Liso Ing. Scotti Ing. Formis
A	EMMISSIONE	10/2023	Ing. Liso Ing. Scotti Ing. Mangini
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO
