



RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA
 RELAZIONE DI CONFRONTO PV/PE
 PLANIMETRIA STATO DI FATTO E PROGETTO CON SEZIONI TIPO
 PROFILO E SEZIONI DI PROGETTO
 CARATTERISTICA - PIANTE E SEZIONI
 FASI REALIZZATE DELL'OPERA - PIANTE SCAVI E SEZIONI
 ARMATURA TAV. 1
 ARMATURA TAV. 2
 ARMATURA TAV. 3
 ARMATURA TAV. 4
 ARMATURA TAV. 5
 ARMATURA TAV. 6
 PARTICOLARI COSTRUTTIVI
 RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI AV/AC


IN1712E2PRON300001
 IN1712E2PRON300002
 IN1712E2PRON300003
 IN1712E2PRON300004
 IN1712E2PRON300005
 IN1712E2PRON300006
 IN1712E2PRON300007
 IN1712E2PRON300008
 IN1712E2PRON300009
 IN1712E2PRON300010

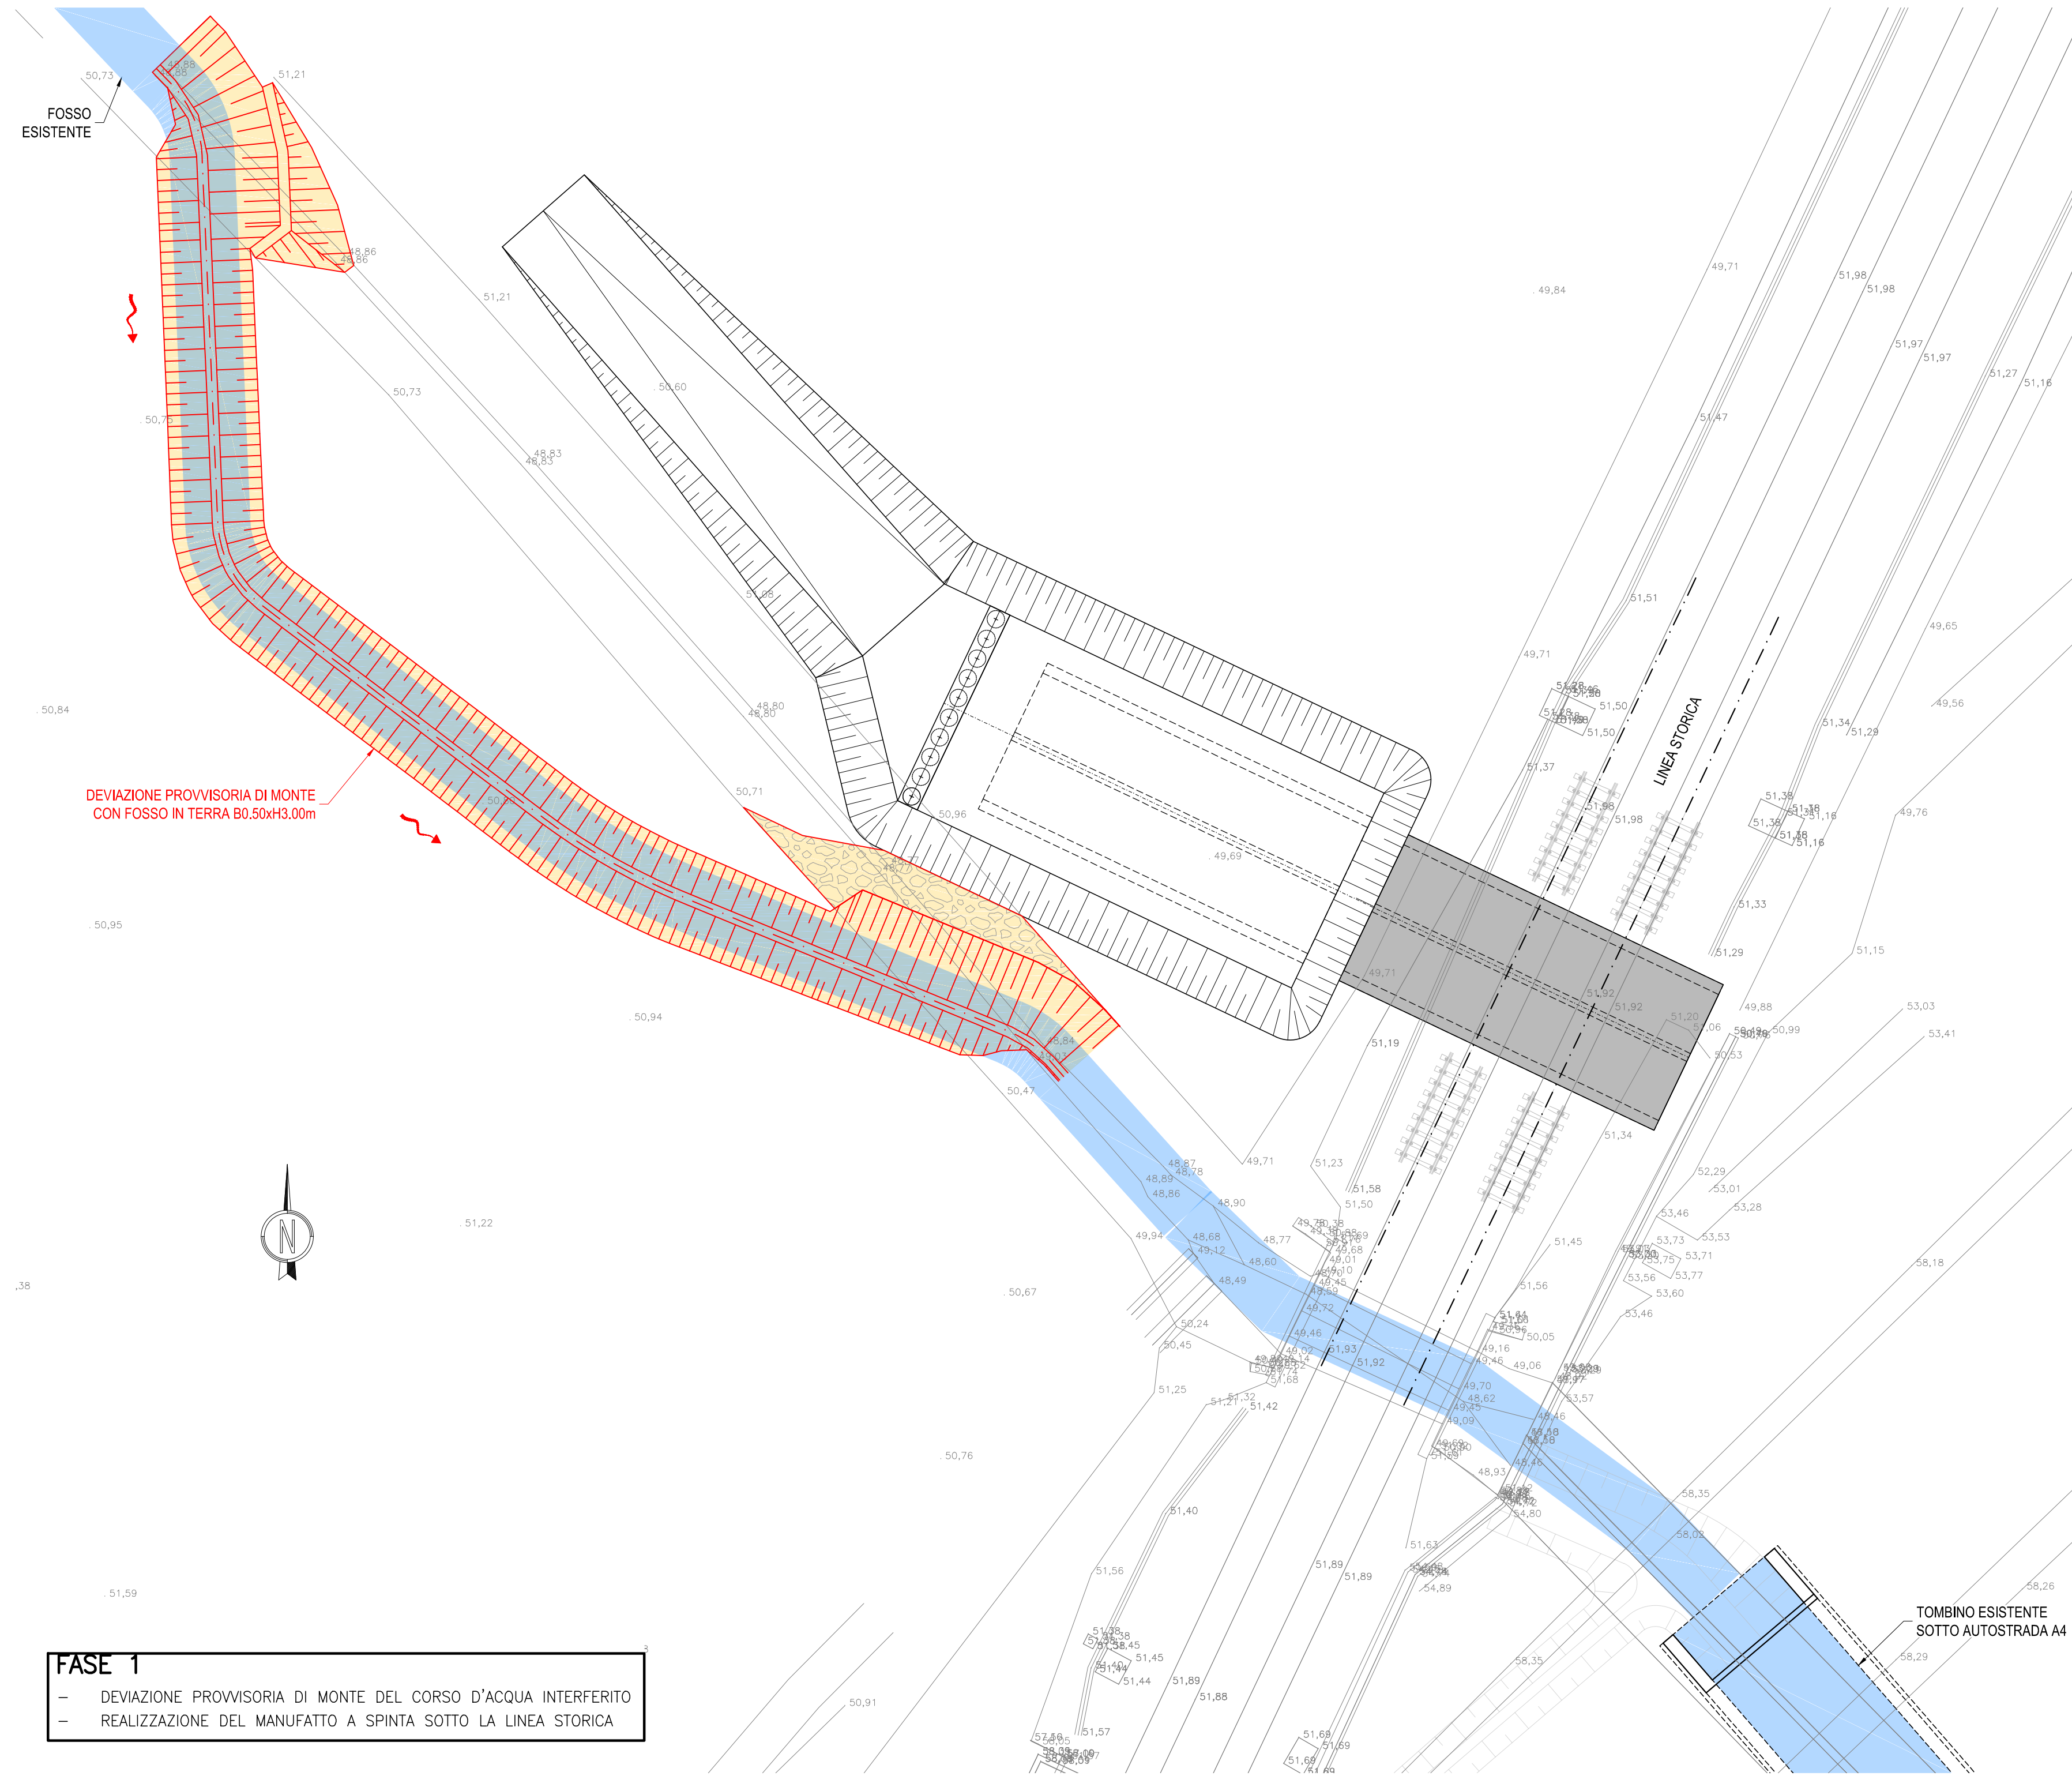


FASE 1
 - DEVIAZIONE PROVVISORIA DI MONTE DEL CORSO D'ACQUA INTERFERITO
 - REALIZZAZIONE DEL MANUFATTO A SPINTA SOTTO LA LINEA STORICA

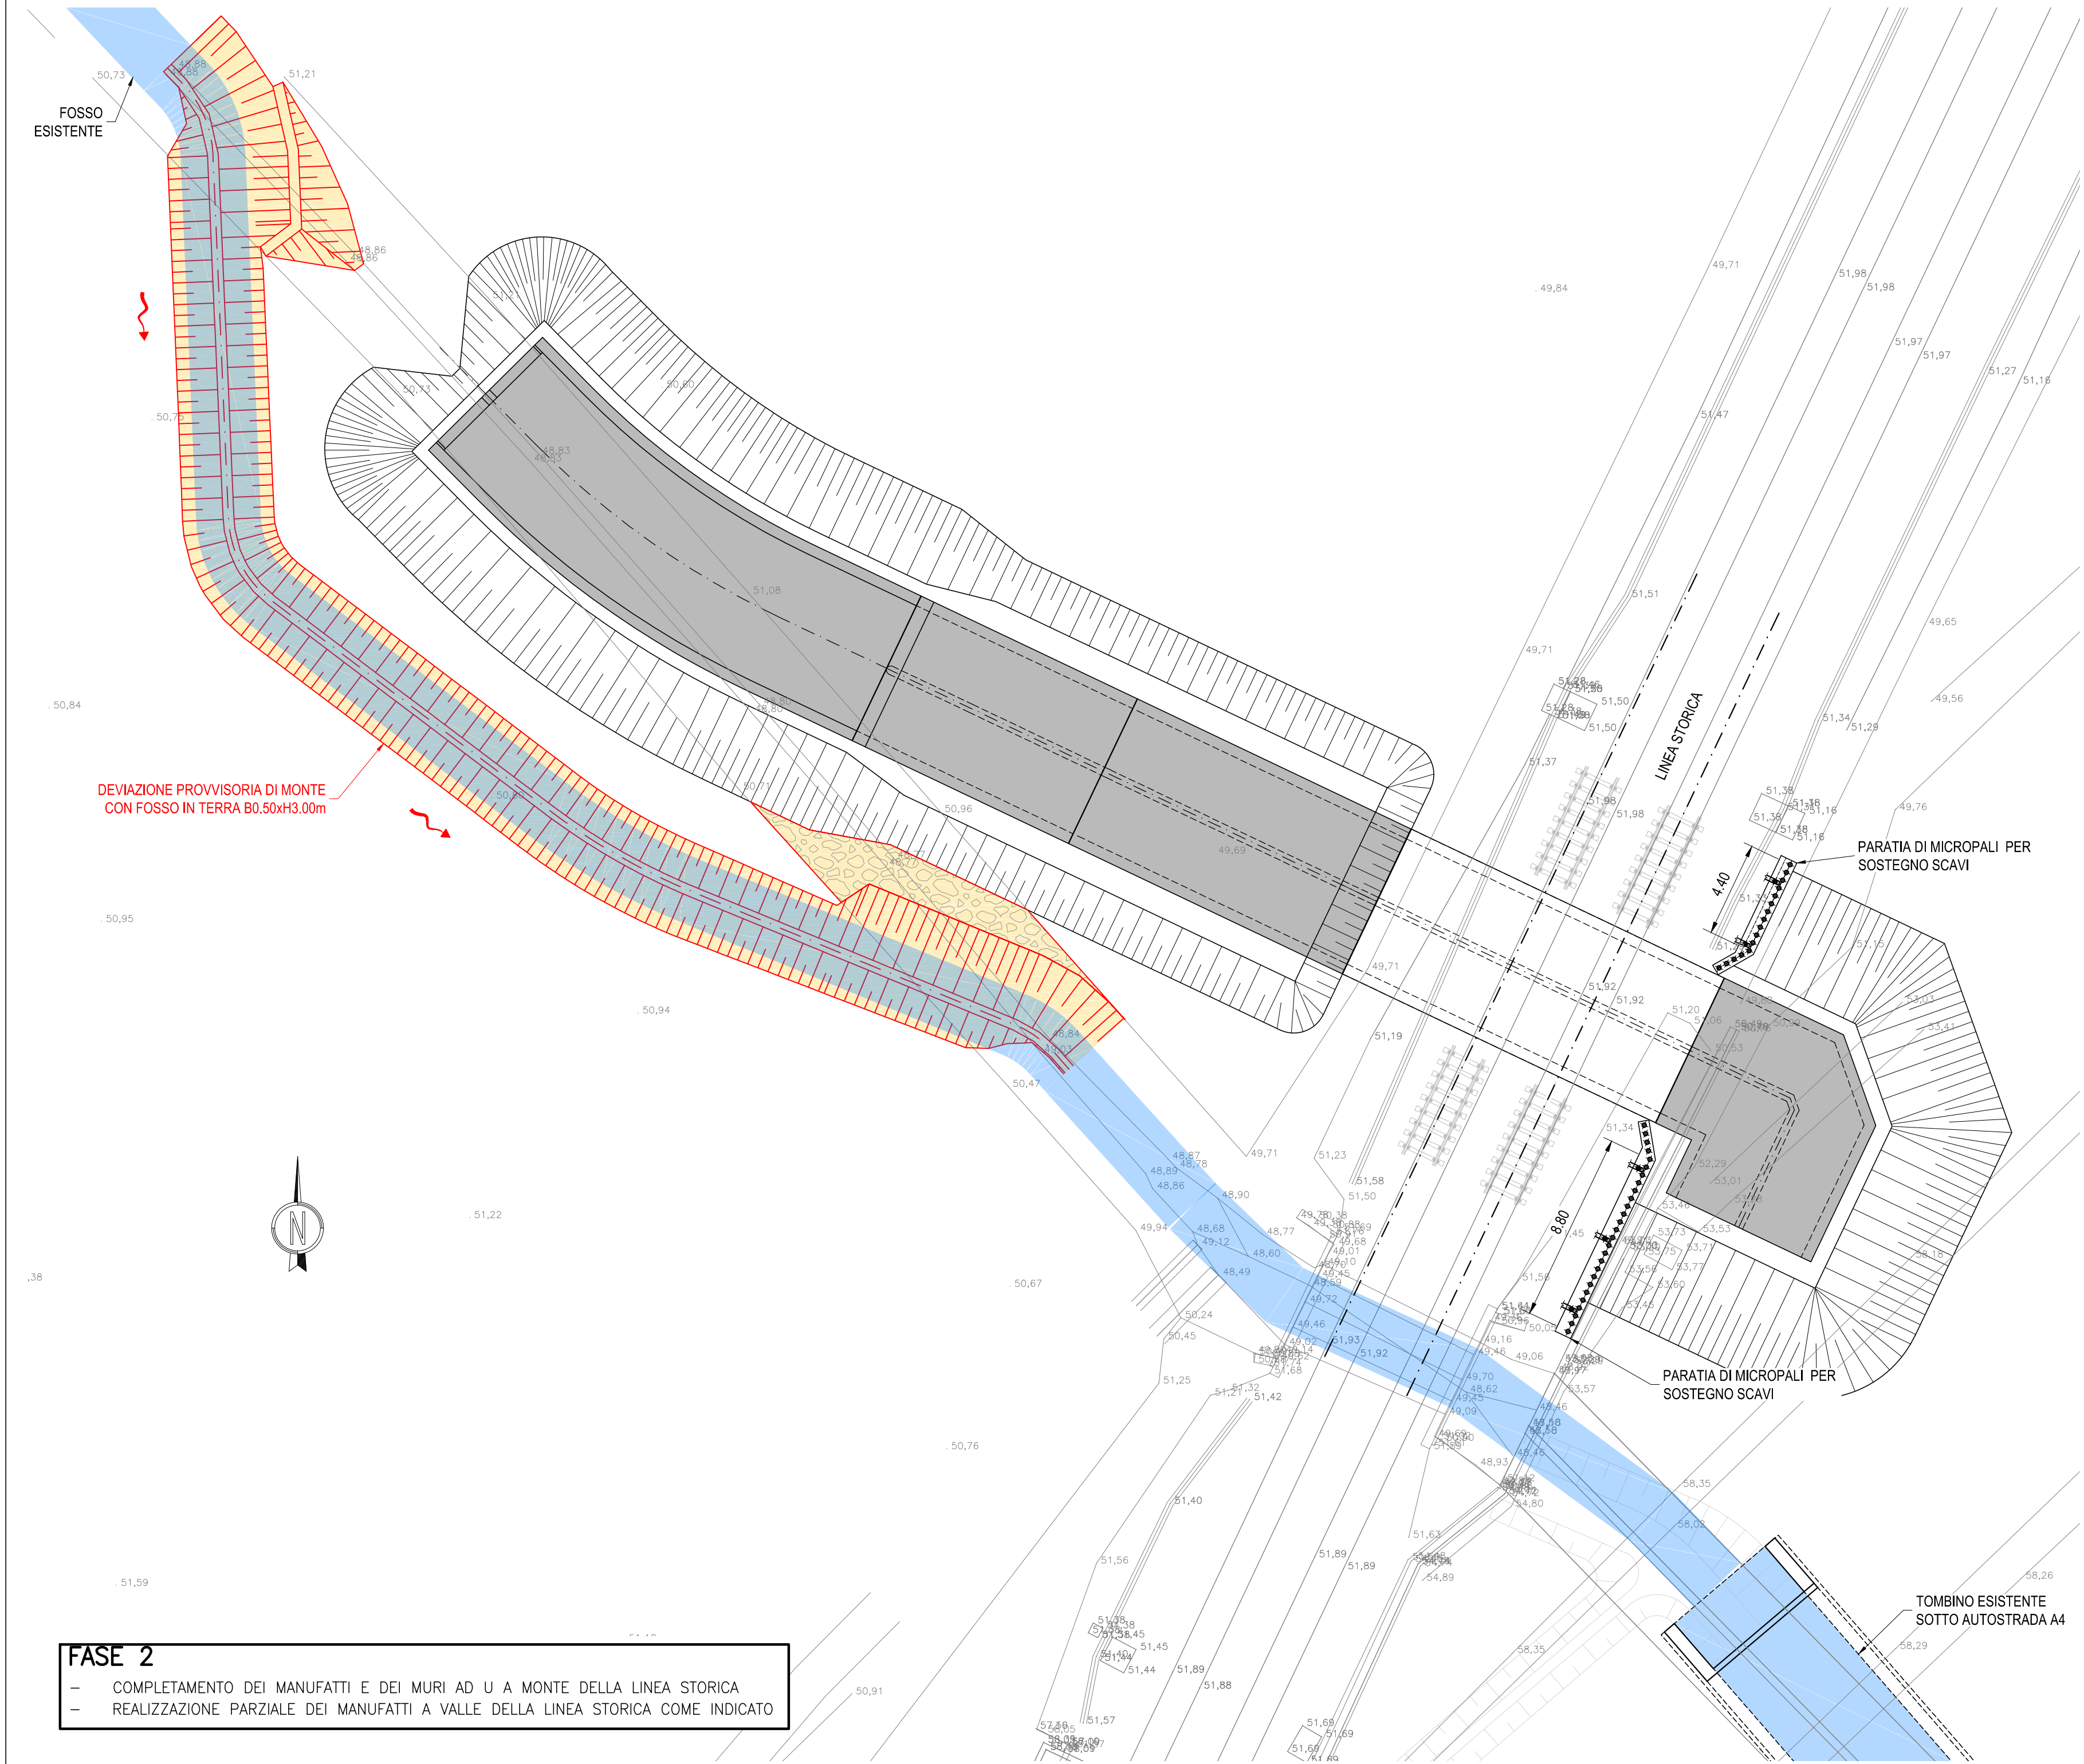

FASE 2
 - COMPLETAMENTO DEI MANUFATTI E DEI MURI AD A MONTE DELLA LINEA STORICA
 - REALIZZAZIONE PARZIALE DEI MANUFATTI A VALLE DELLA LINEA STORICA COME INDICATO

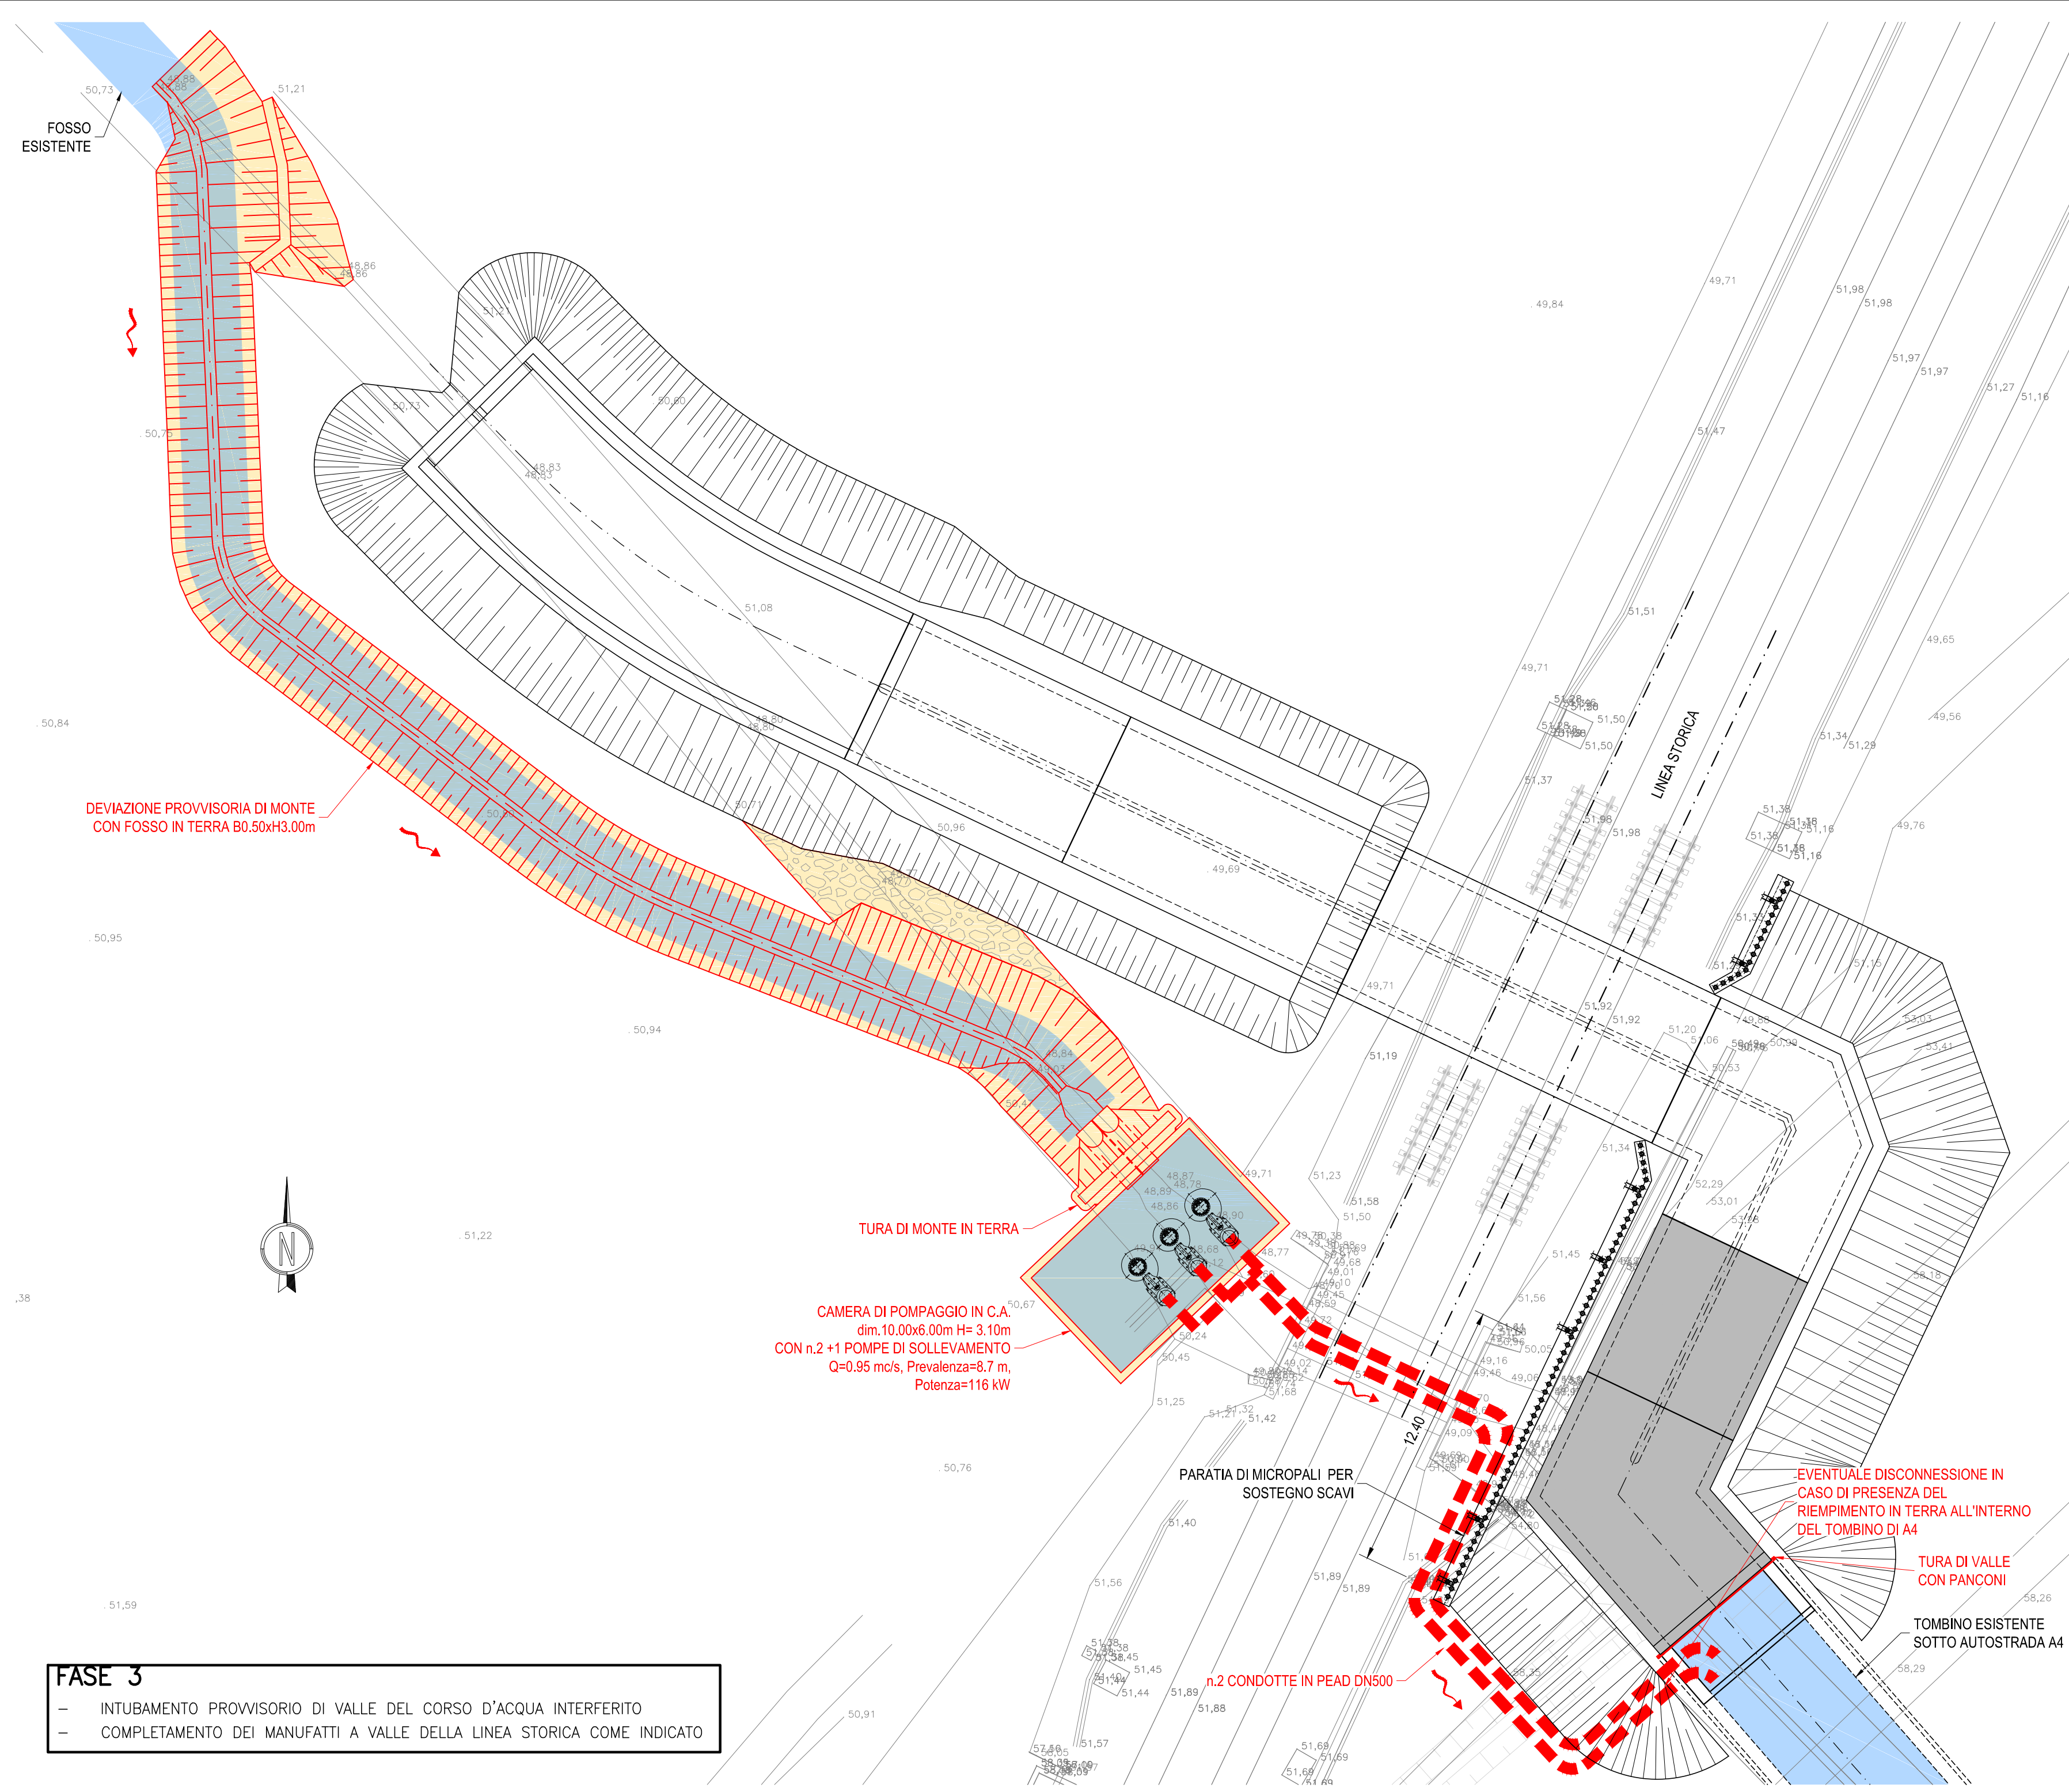

FASE 3
 - INTUBAMENTO PROVVISORIO DI VALLE DEL CORSO D'ACQUA INTERFERITO
 - COMPLETAMENTO DEI MANUFATTI A VALLE DELLA LINEA STORICA COME INDICATO

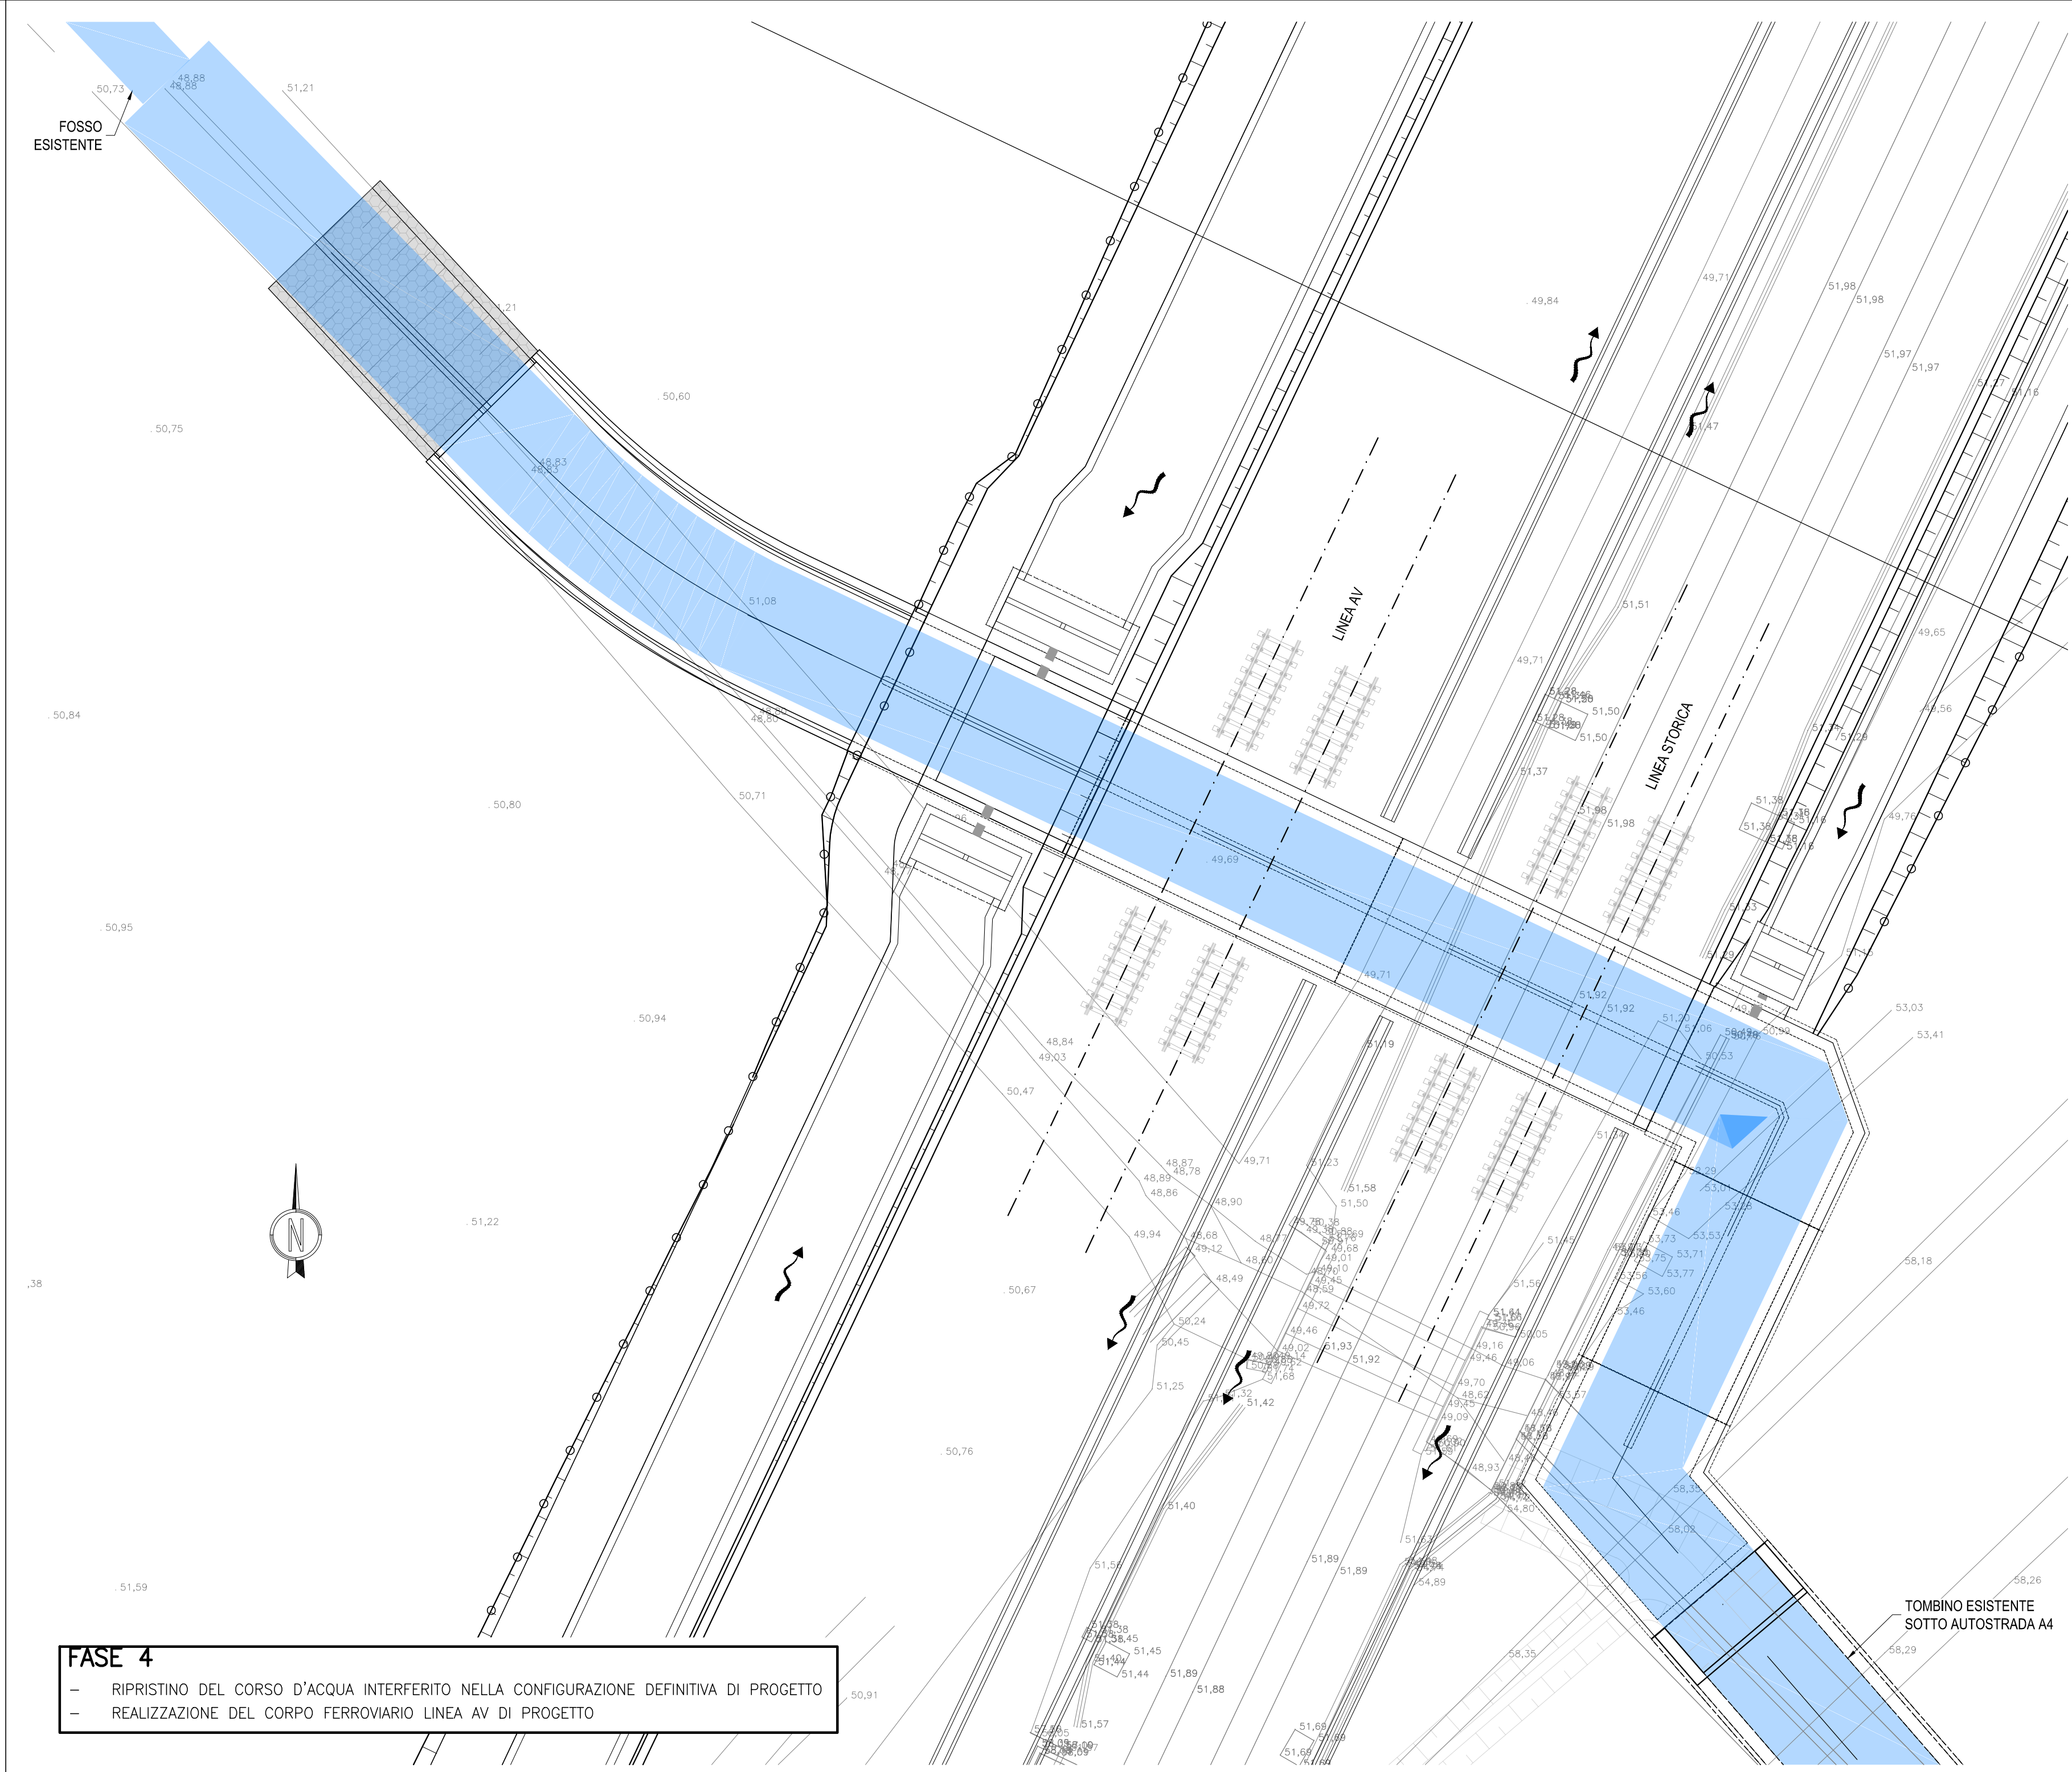

FASE 4
 - RIPRISTINO DEL CORSO D'ACQUA INTERFERITO NELLA CONFIGURAZIONE DEFINITIVA DI PROGETTO
 - REALIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO LINEA AV DI PROGETTO

NOTE GENERALI

- TUTTE LE PROGRESSIVE SONO RIFERITE AL BINARIO PARI, SALVO OVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO
- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

--- OPERE PROVVISORIALI PER LA CONTINUITA' IDRAULICA
--- FLUSSO DEL CORSO D'ACQUA INTERFERITO

N.B.: ALLO STATO ATTUALE NON SONO NOTE LE CONDIZIONI DEL TOMBINO A4 ESISTENTE, IN PARTICOLARE SULLA PRESENZA O MENO DEL RIEMPIMENTO IN TERRA INDICATO SULLE TAVOLE DI PROGETTO A DISPOSIZIONE DURANTE LA FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

COMMITTENTE:

ALTA SORVEGLIANZA:

GENERAL CONTRACTOR:

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01
 LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA
 Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza
 PROGETTO ESECUTIVO
 OPERE PROVVISORIALI
 TOMBINO DOPPIO SCATOLARE 3X1.5 SU SOGLIO SINGOLO ALLA PK 36+800,00 GENERALE

Opere provvisoria: deviazione provvisoria del canale

PROGETTISTA INTERMEDIARIA: Ing. Giovanni M. P. ... ALBO INGEGNERI 770/1000000000 Data: Giugno 2022		GENERAL CONTRACTOR: ITICAV2 Data: Giugno 2022		DIRETTORE LAVORI: Ing. Paolo ... Data: Giugno 2022		SCALA: 1:200	
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DIRIGENZA	PROGR.	REV.
IN17	12	E	IT2	PI2	IN16301	001	A
VISTO CONSORZIO IRICAV DUE				Data: Giugno 2022			
Progettazione:				VISTO CONSORZIO IRICAV DUE			
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	ESIZIONE	...	24/09/22	...	24/09/22	...	24/09/22
B							
C							
Cod. 83779201		CUP: J41E1000000009		F.lli: ...		Cod. origine: ...	
