

TABELLA MOVIMENTI TERRA - SCOTICO (*)	
Opera	Volume
VI06B	1285
<b>Totale mc</b>	<b>1285</b>

TABELLA MOVIMENTI TERRA - SCAVI	
Opera	Volume
Pila 10	343
Pila 11	343
Pila 12	331
Pila 13	331
Pila 14	356
Pila 15	382
Pila 16	382
Spalla B	529
<b>Totale mc</b>	<b>3018</b>

NOTA MOVIMENTI TERRA

(\*) Il volume di scotico è computato sull'impronta planimetrica dell'impalcato con uno spessore medio di 50 cm.  
I volumi riportati nella tabella "Movimenti terra - scavi" sono stati valutati al netto del volume di scotico.


NOTE PER L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI

- Preliminarmente all'esecuzione degli scavi si dovranno effettuare i tracciamenti sul sito, controllando la rispondenza alle ipotesi progettuali. Le eventuali difformità dovranno essere sottoposte ai progettisti per opportuna risoluzione.
- Preliminarmente, si controlleranno i livelli della falda dai piezometri predisposti esternamente agli scavi, per verifica della rispondenza alle ipotesi progettuali. Si avrà cura di evitare di effettuare scavi nei periodi nei quali il livello freatico è prossimo ai massimi delle oscillazioni stagionali o superiore alle previsioni progettuali (+27.00 m sim) o dopo periodi particolarmente piovosi.
- Ove la quota della falda si confermasse superiore al fondo scavo previsto l'esecutore degli scavi dovrà provvedere l'aprontamento di tutti i mezzi necessari per il dewatering. Le dotazioni dovranno essere dimensionate con prudenza per tener conto delle incertezze previsionali sulla variabilità dei livelli freatici e sulle eterogeneità delle caratteristiche di permeabilità dei terreni più superficiali.
- Se previsti, o ritenuti utili, i pozzi di emungimento saranno predisposti e verificato il funzionamento e l'efficacia. L'eventuale aggotamento sarà attivato con le modalità da verificare in corso d'opera in relazione all'effettivo livello idrico rilevato, alla stratigrafia locale, alle caratteristiche di portata dell'acquifero ed alla risposta del sistema.
- Qualora con scavi prossimi al completamento, si rilevasse una imprevedibile condizione di livello piezometrico tendente a superare le previsioni progettuali, si dovrà abbandonare lo scavo e interrompere il dewatering e lasciare allagare.

FASI ESECUTIVE

1. Preparazione piano di lavoro.
2. Realizzazione pali di fondazione con tratto a vuoto variabile.
3. Realizzazione pozzi di aggotamento.
4. Infissione delle palancole, ove previste.
5. Scavo fino al piano di imposta fondazione e scapitozzatura pali.
6. Realizzazione fondazioni ed elevazioni pile e spalle.
7. Reinterro fino al p.c. e sistemazione finale.

PIANTA CHIAVE

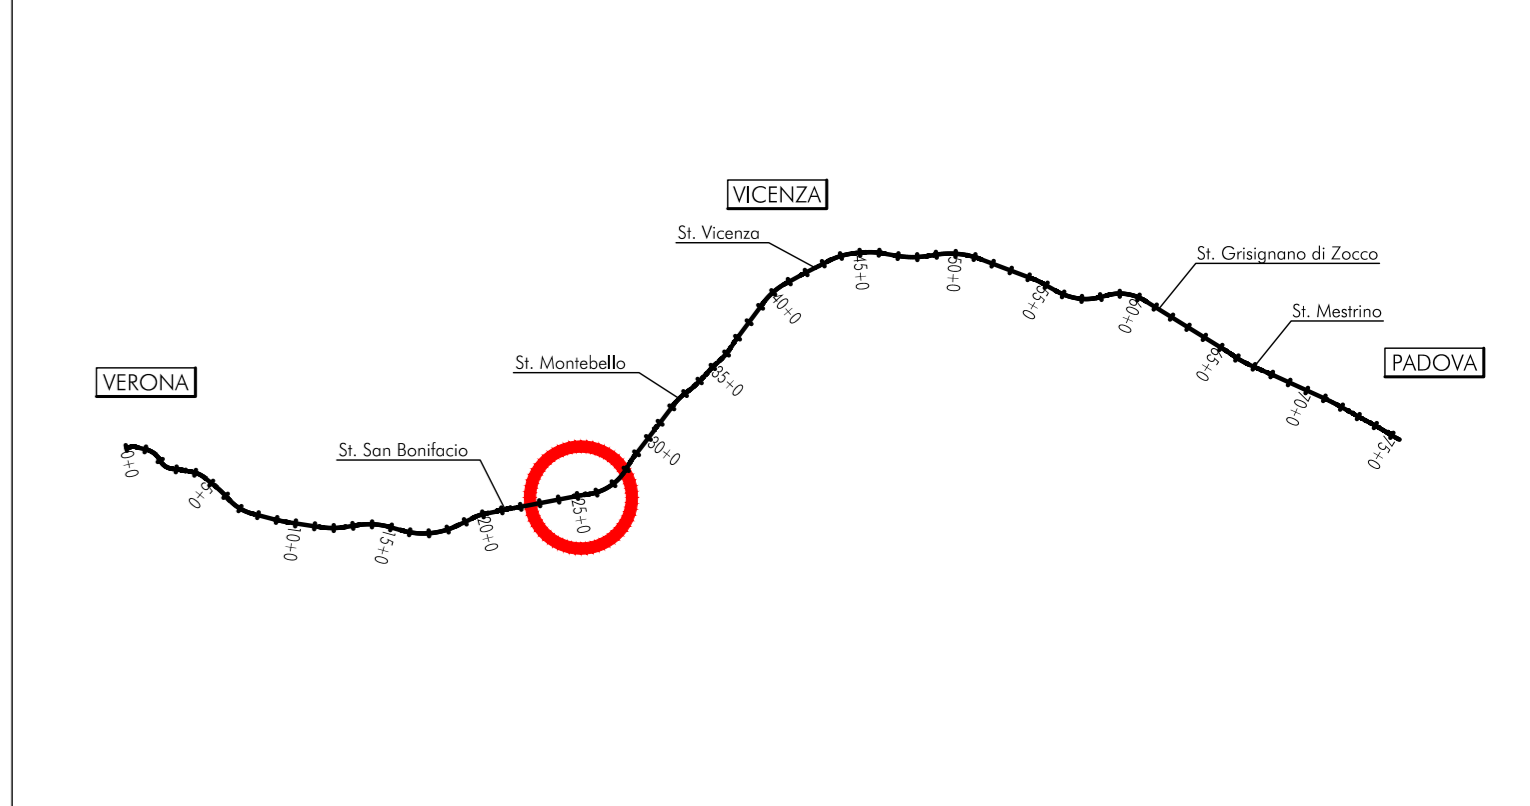

NOTE GENERALI

TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATE IN QUESTO ELABORATO, VEDERE IN F02E02T04000001 - TABELLA MATERIALI E PRESCRIZIONI

COMMITTENTE:

ALTA SORVEGLIANZA:

GENERAL CONTRACTOR:

**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01**  
**LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA**  
**Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza**  
**PROGETTO ESECUTIVO**  
**VIADOTTI E PONTI**  
**Viadotto San Bonifacio dal Km 25+114.95 al Km 25+314.95**  
**SCAVI, DEMOLIZIONI, OPERE PROVVISORIE**

PIANTO opere provvisorie e di scavo delle fondazioni, sezione longitudinale e tabella movimenti terra 2 di 2

IL PROGETTISTA INTERNO		GENERAL CONTRACTOR		DIRETTORE LAVORI		SCALA:
Ing. Giovanni... ALBO INGEGNERI... Data: Agosto 2022		Iricav Due Ing. Paolo... Data: Agosto 2022		Delio Data: Agosto 2022		1:200
COMMESSA	LOTTO	FASE	DISEGNO	PROG.	REV.	FOLIO
IN17	12	E	12	P9	VI06B1	002

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data	Il PROGETTISTA
A	EMISSIONI	...	...	...	...	...
B	RICERIMENTO STRUTTURE	...	...	...	...	...
C		...	...	...	...	...

COD. 837797031 CUP: J41E100000009 FILE: 11/11/2022 10:10:00  
 Progetto cofinanziato dalla Unione Europea. Cod. origine: caos
