




STATO DI FATTO - Scala 1:500

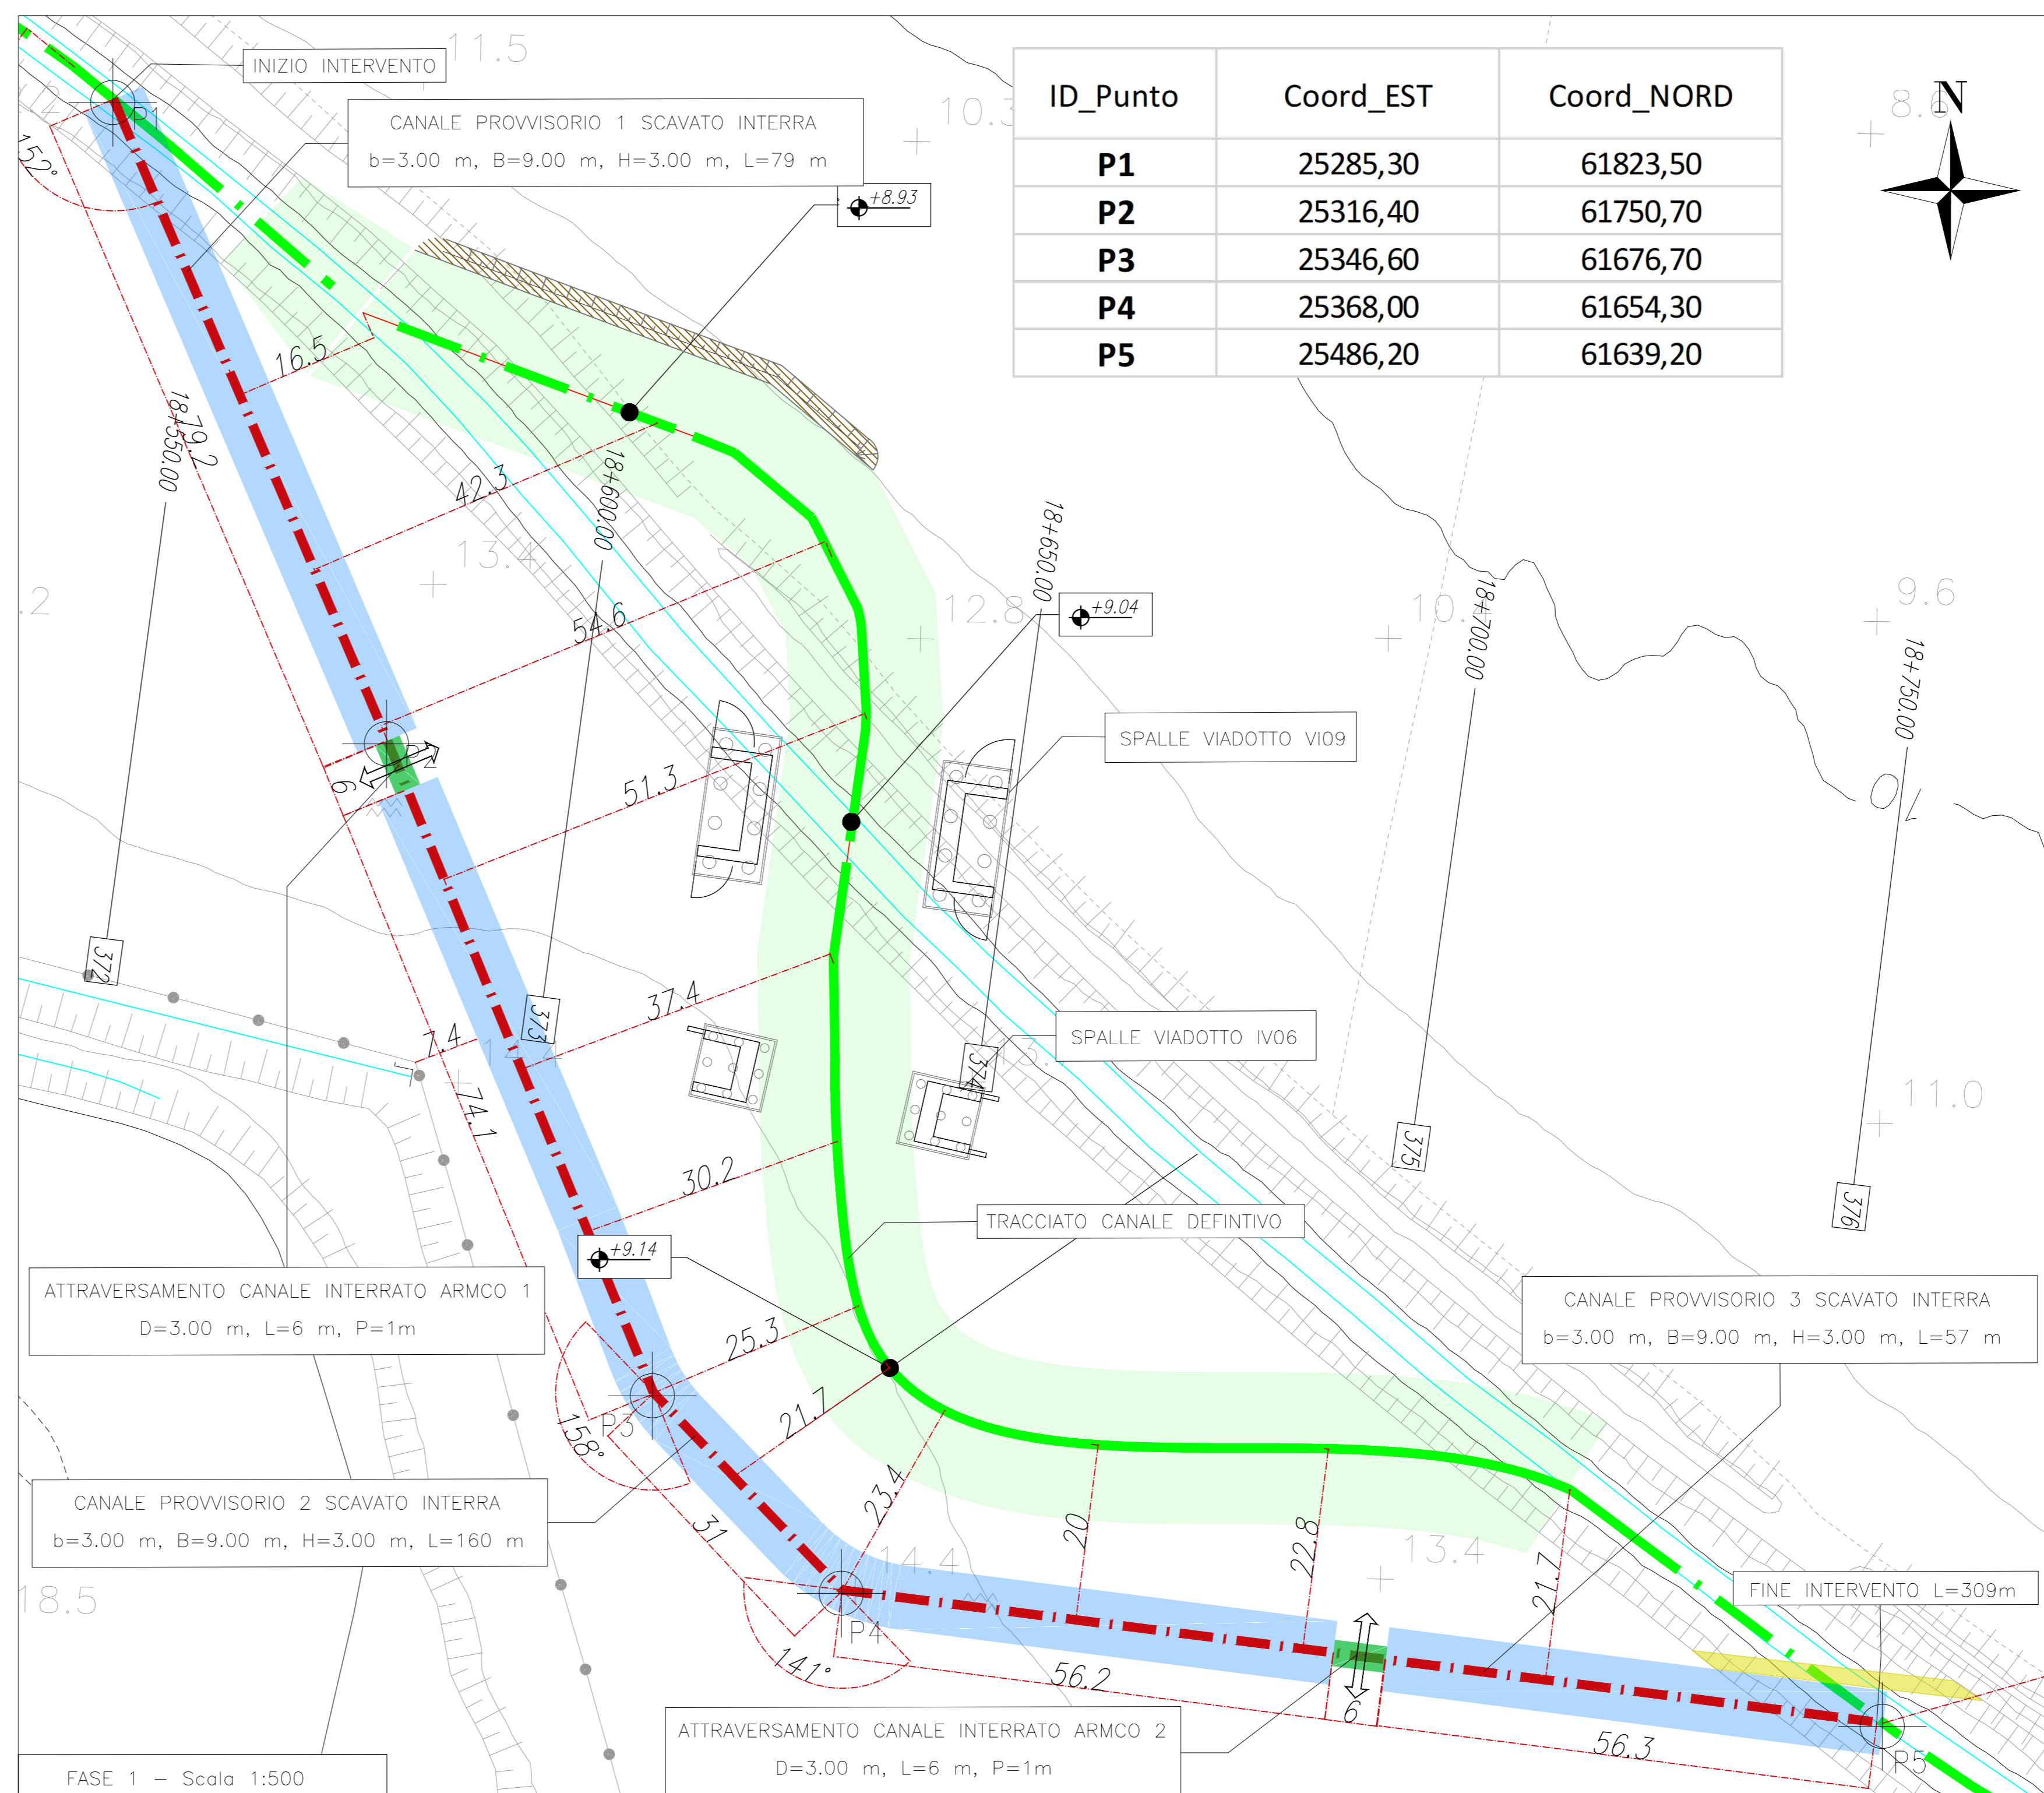

FASE 1 - Scala 1:500

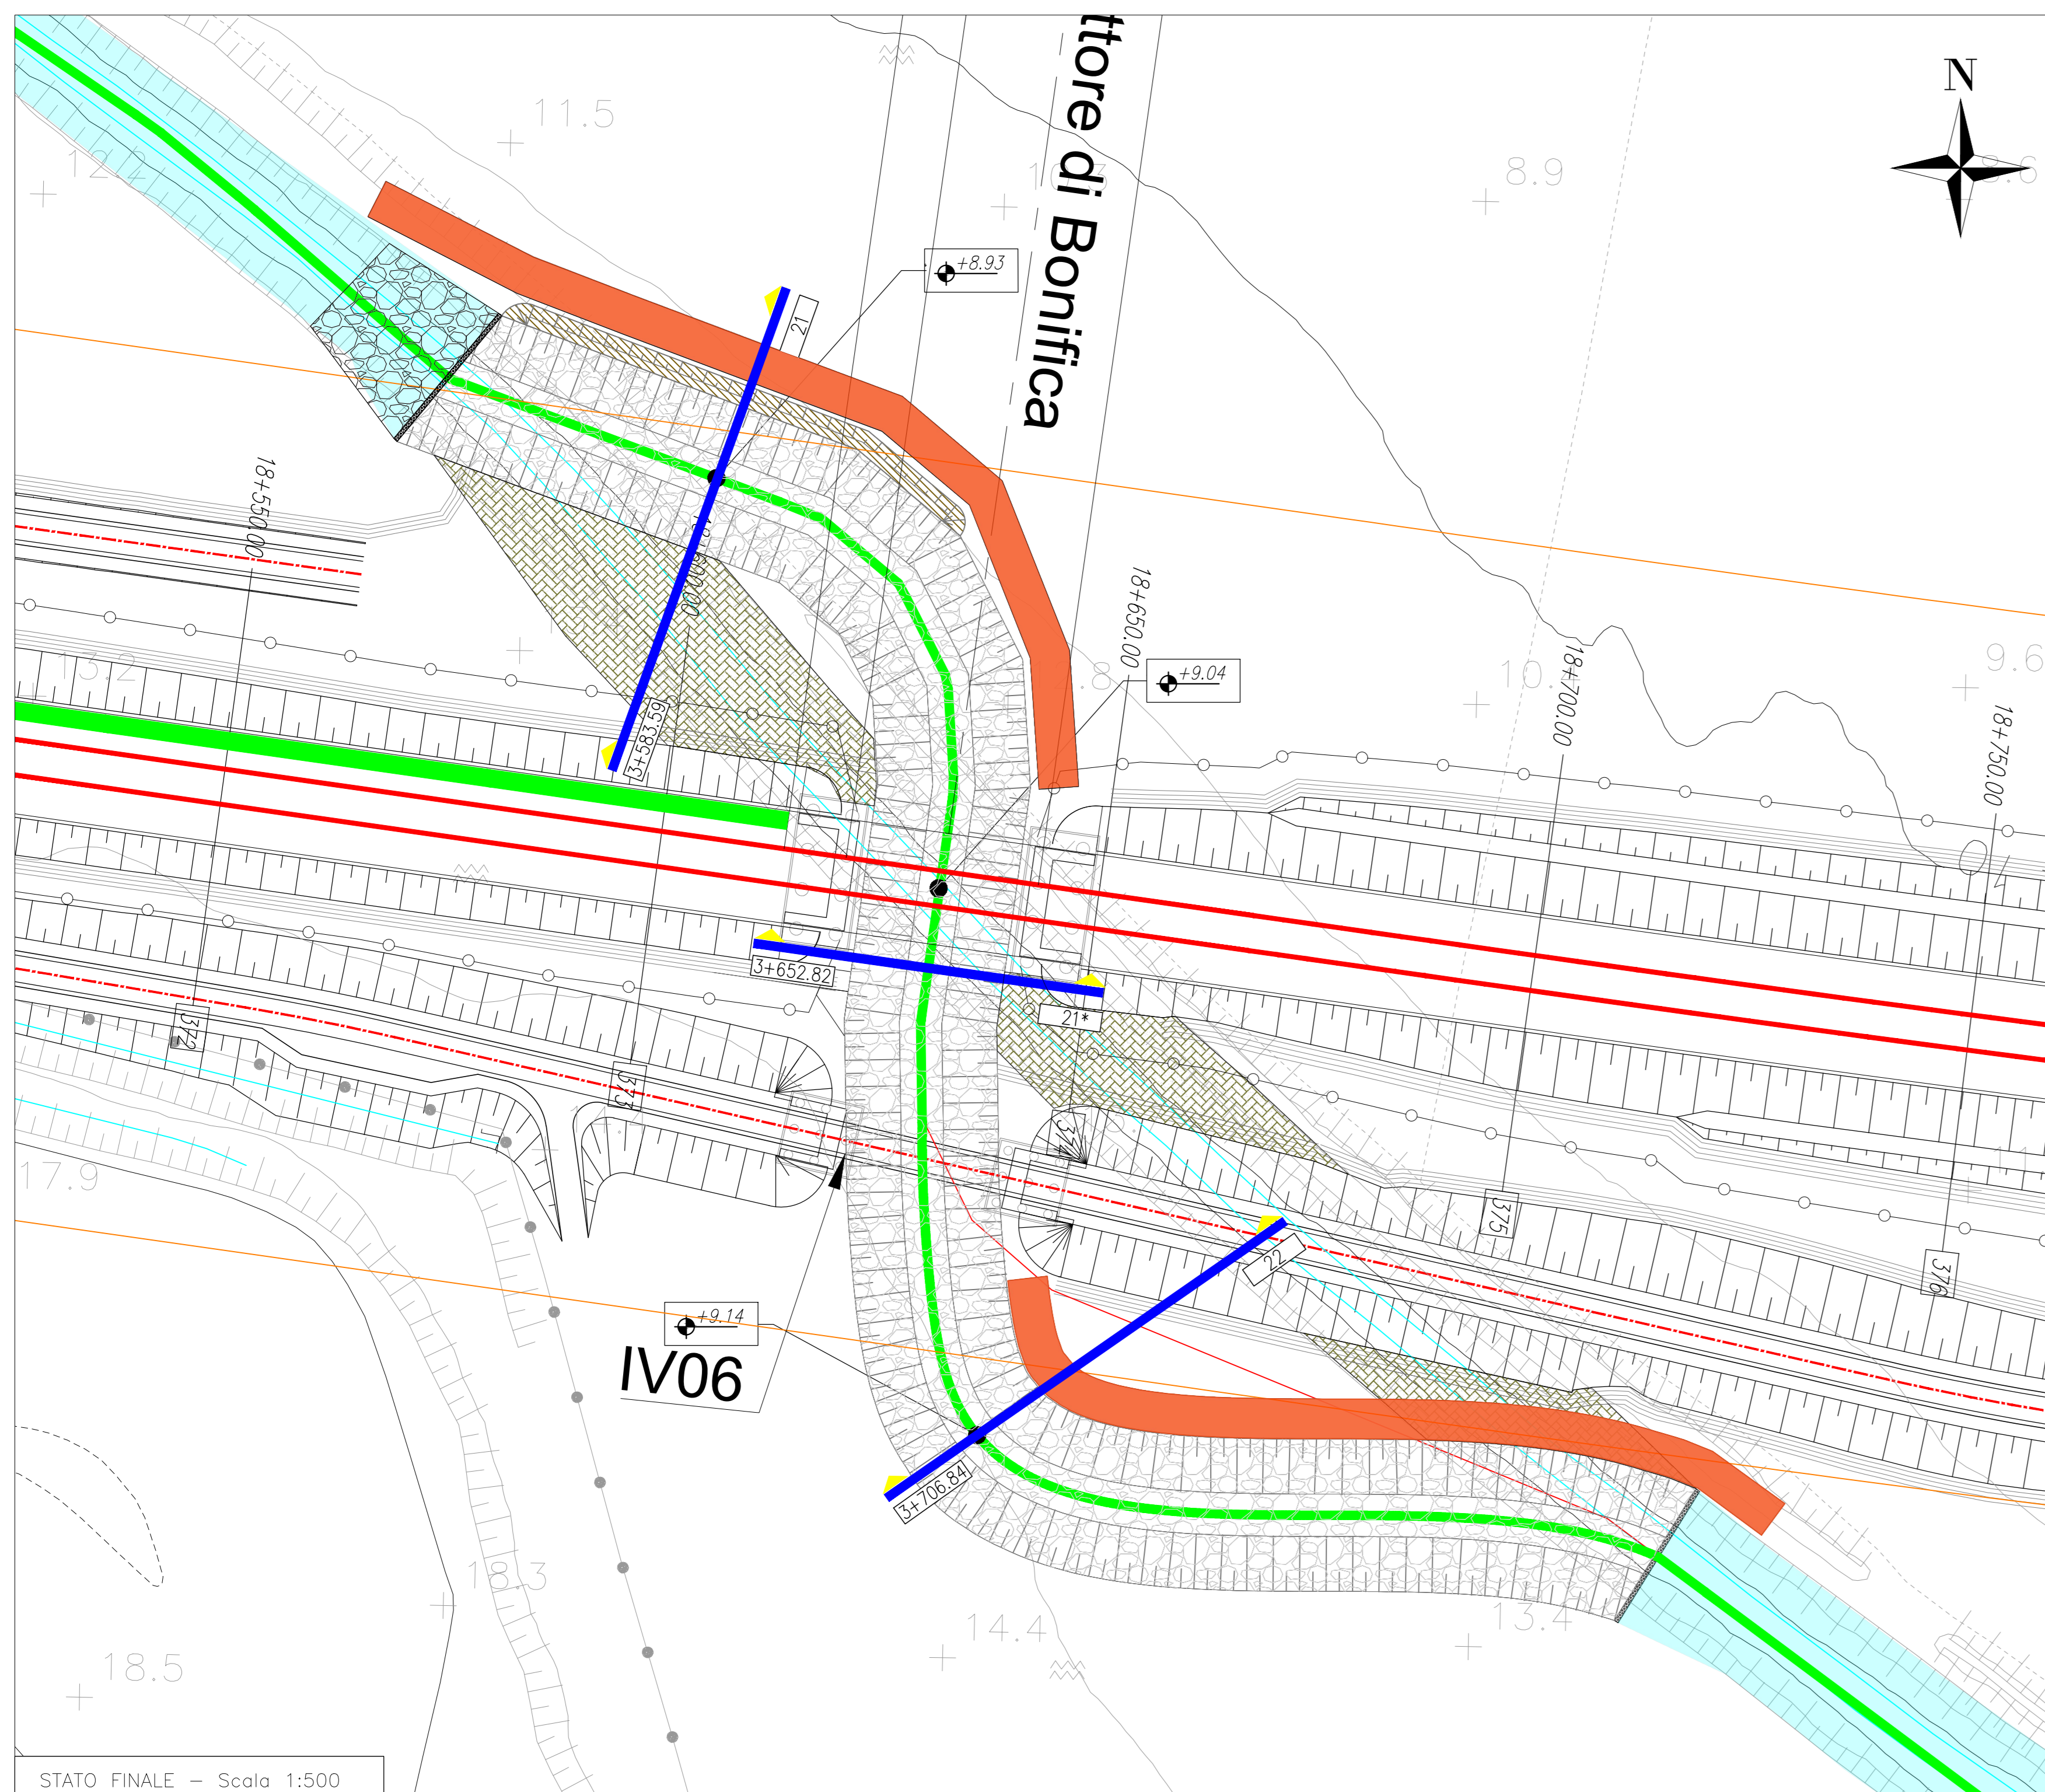

STATO FINALE - Scala 1:500

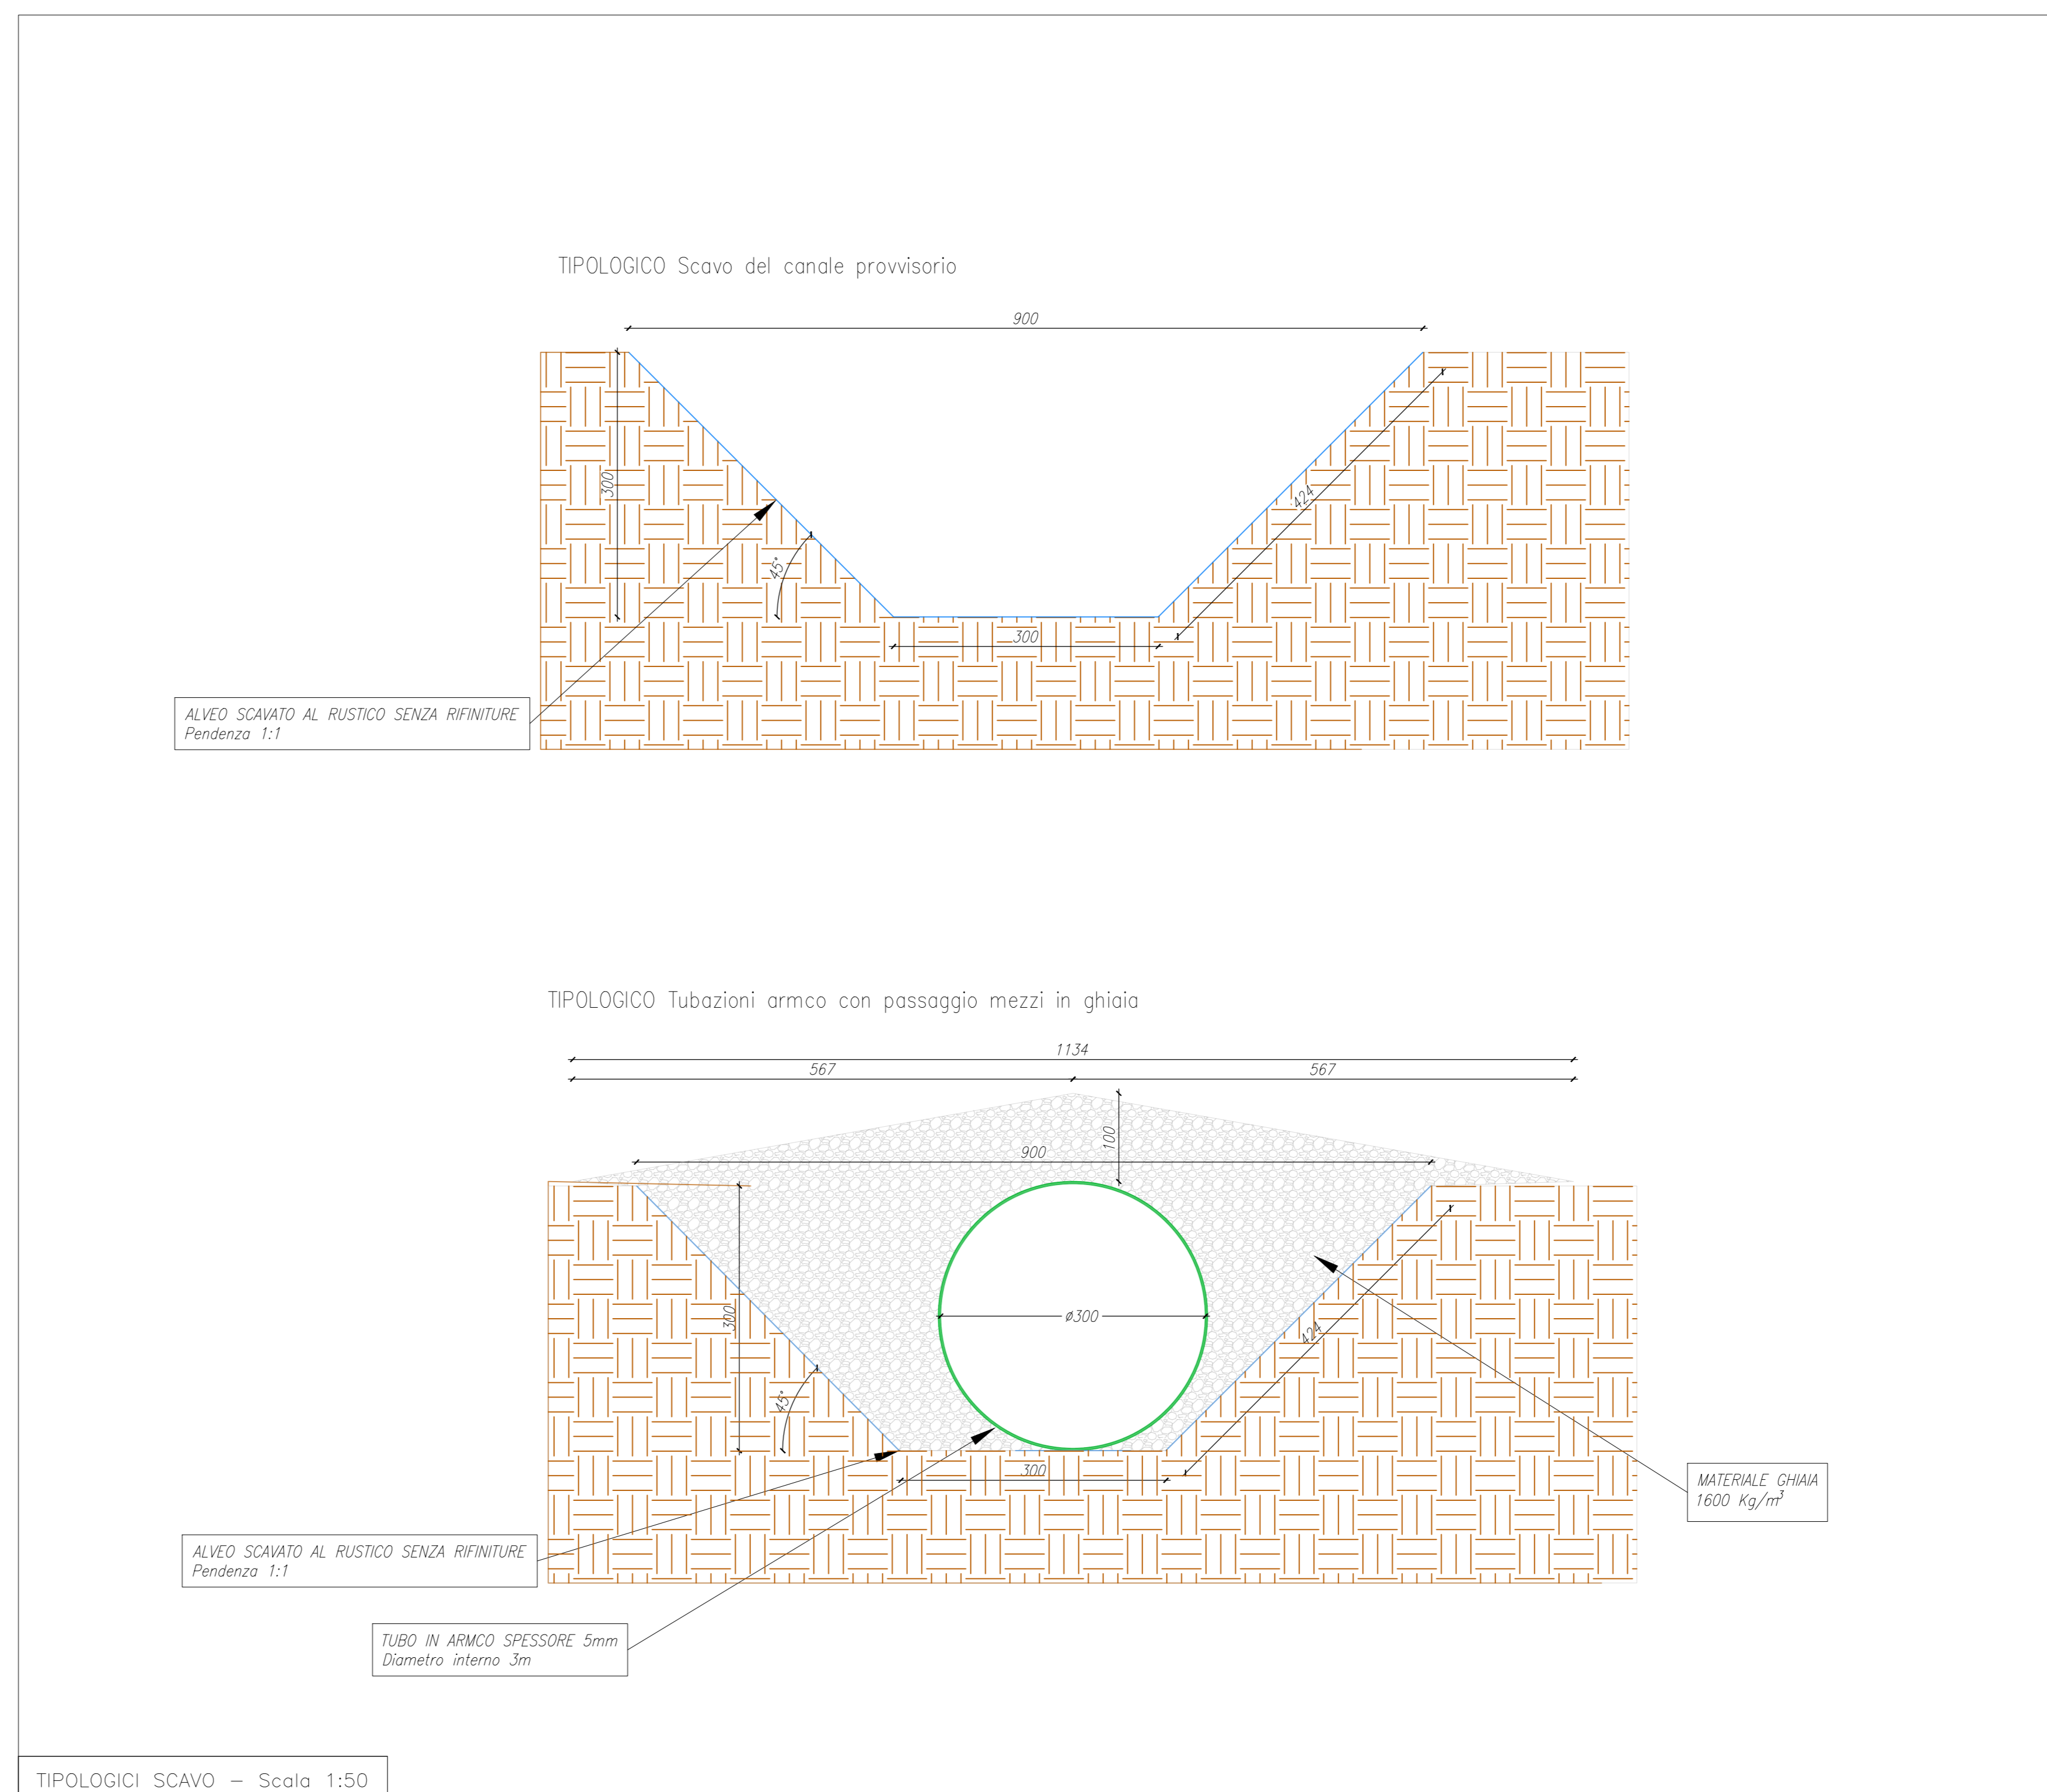

TIPOLOGICI SCAVO - Scala 1:50

- LEGENDA DELLA FASI
- Corso d'acqua
  - Asse canale provvisorio
  - Asse canale definitivo
  - Tubazione interrato provvisoria armco
  - Ingombro canale provvisorio
  - Reinterri
  - Argine provvisorio in sacchi di sabbia
  - Rivestimento alveo in massi intasati

1. STATO DI FATTO
  2. FASE 1
    - 2.1. Scavo del canale provvisorio a partire da valle verso monte e posa della tubazione armco per l'attraversamento
    - 2.2. Posa degli argini in sacchi di sabbia a protezione del cantiere
    - 2.3. Avvio delle lavorazioni delle opere viarie
  3. FASE 2
    - 3.1. Scavo e posa in opera del canale definitivo IN31 e del pietrame fondo alveo
    - 3.2. Rimozione degli argini in sabbia e rimozione dei tubi provvisori armco e riinterro del canale provvisorio
    - 3.3. Varo delle travate di impalcato del viadotto (se in interferenza con gli scavi dei canali definitivi)
  4. STATO FINALE
- NOTA: Il canale provvisorio è opera da realizzare preliminarmente alla posa del rilevato stradale. La realizzazione del canale definitivo deve essere completata eventualmente prima del varo della trave del viadotto se vi fosse interferenza.

COMMITTENTE: **RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO  
DIREZIONE INVESTIMENTI  
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI  
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: **AGOSTINO COSTANTINI** (Mandataria) | **ATLANTE** (Mandanti)

PROGETTAZIONE: **HUB** (Mandataria) | **ENIpro** (Mandanti)

**PROGETTO ESECUTIVO**  
LINEA PESCARA - BARI  
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA  
LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

## OPERE CIVILI

Fasi realizzative IN31

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	SCALA:
DIRETTORE TECNICO A. Agostino A. Costantini	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. M. Pasquini	VARIE

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAZIONE	PRIGR	REV.
LI0B	02	E	ZZ	PZ	IN3100	001	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autografo/Date
A	Emissione definitiva	C. Costantini	Giugno 2023	G. Costantini	Giugno 2023	V. Sacchi	Giugno 2023	
B	Revisione a seguito di RUV	C. Costantini	Ottobre 2023	G. Costantini	Ottobre 2023	V. Sacchi	Ottobre 2023	

File: UN1802ZZPZ31000118.DWG | n. Elab.:
