




STATO DI FATTO - Scala 1:500

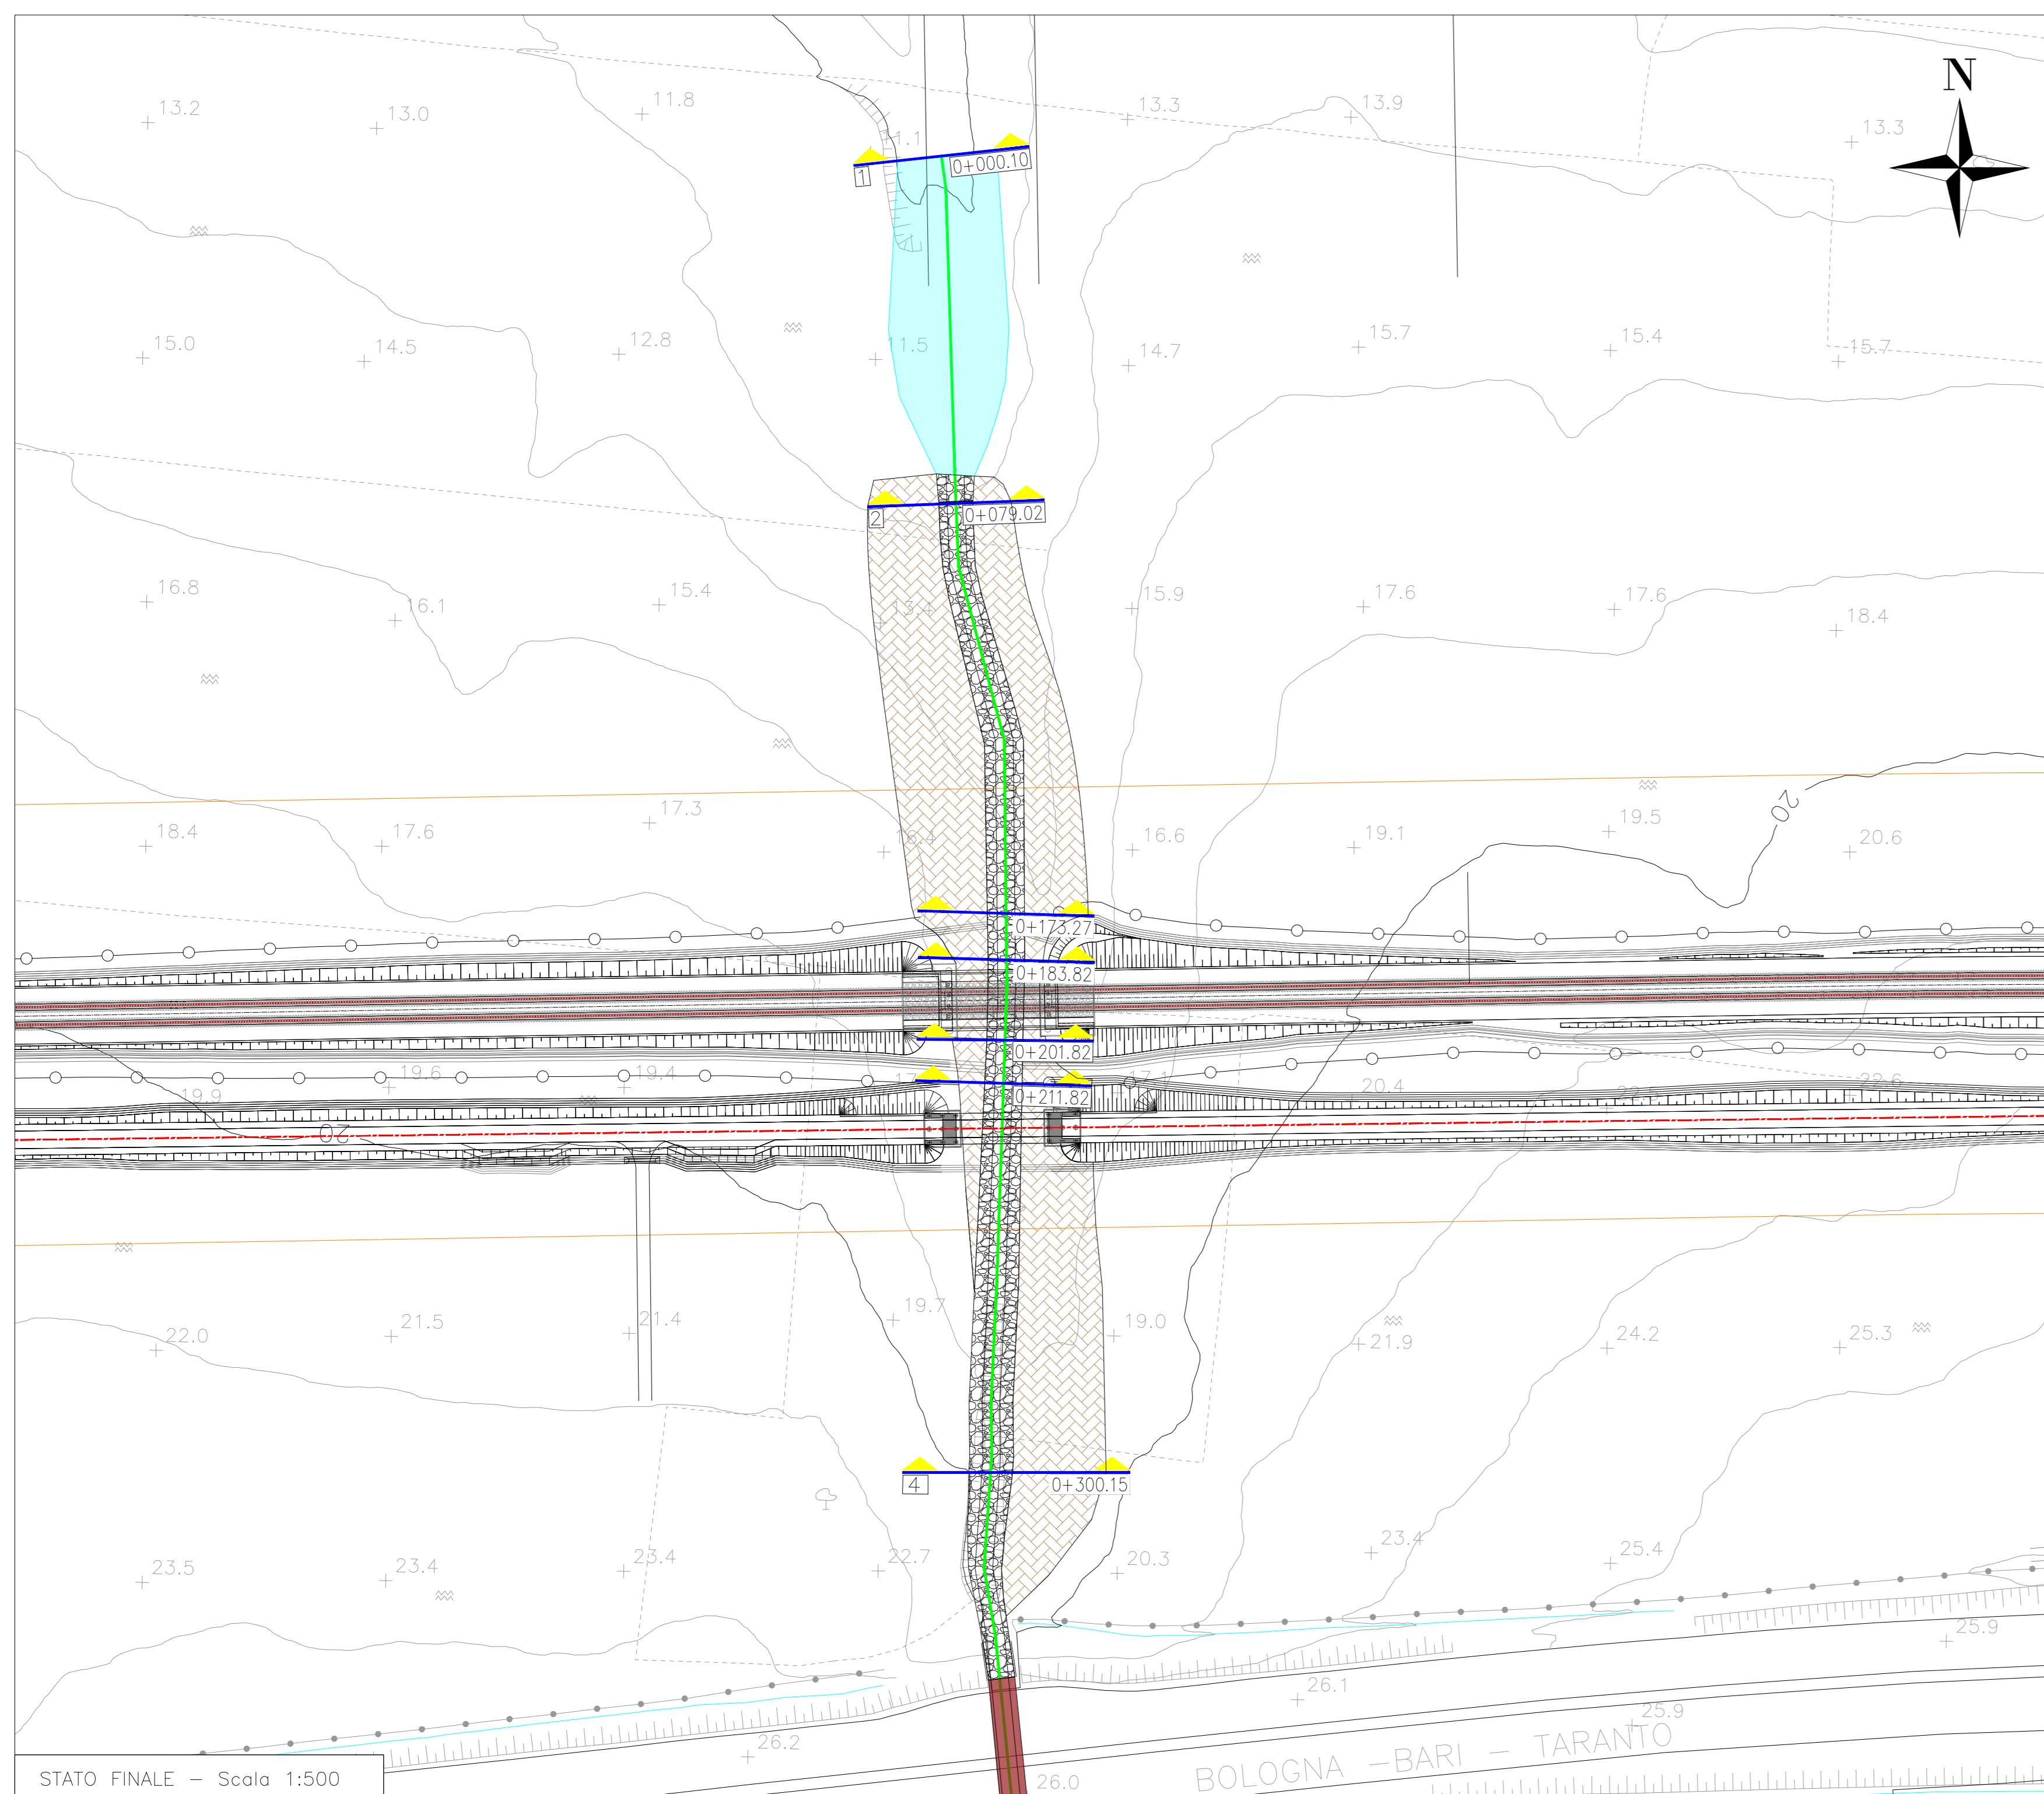

STATO FINALE - Scala 1:500

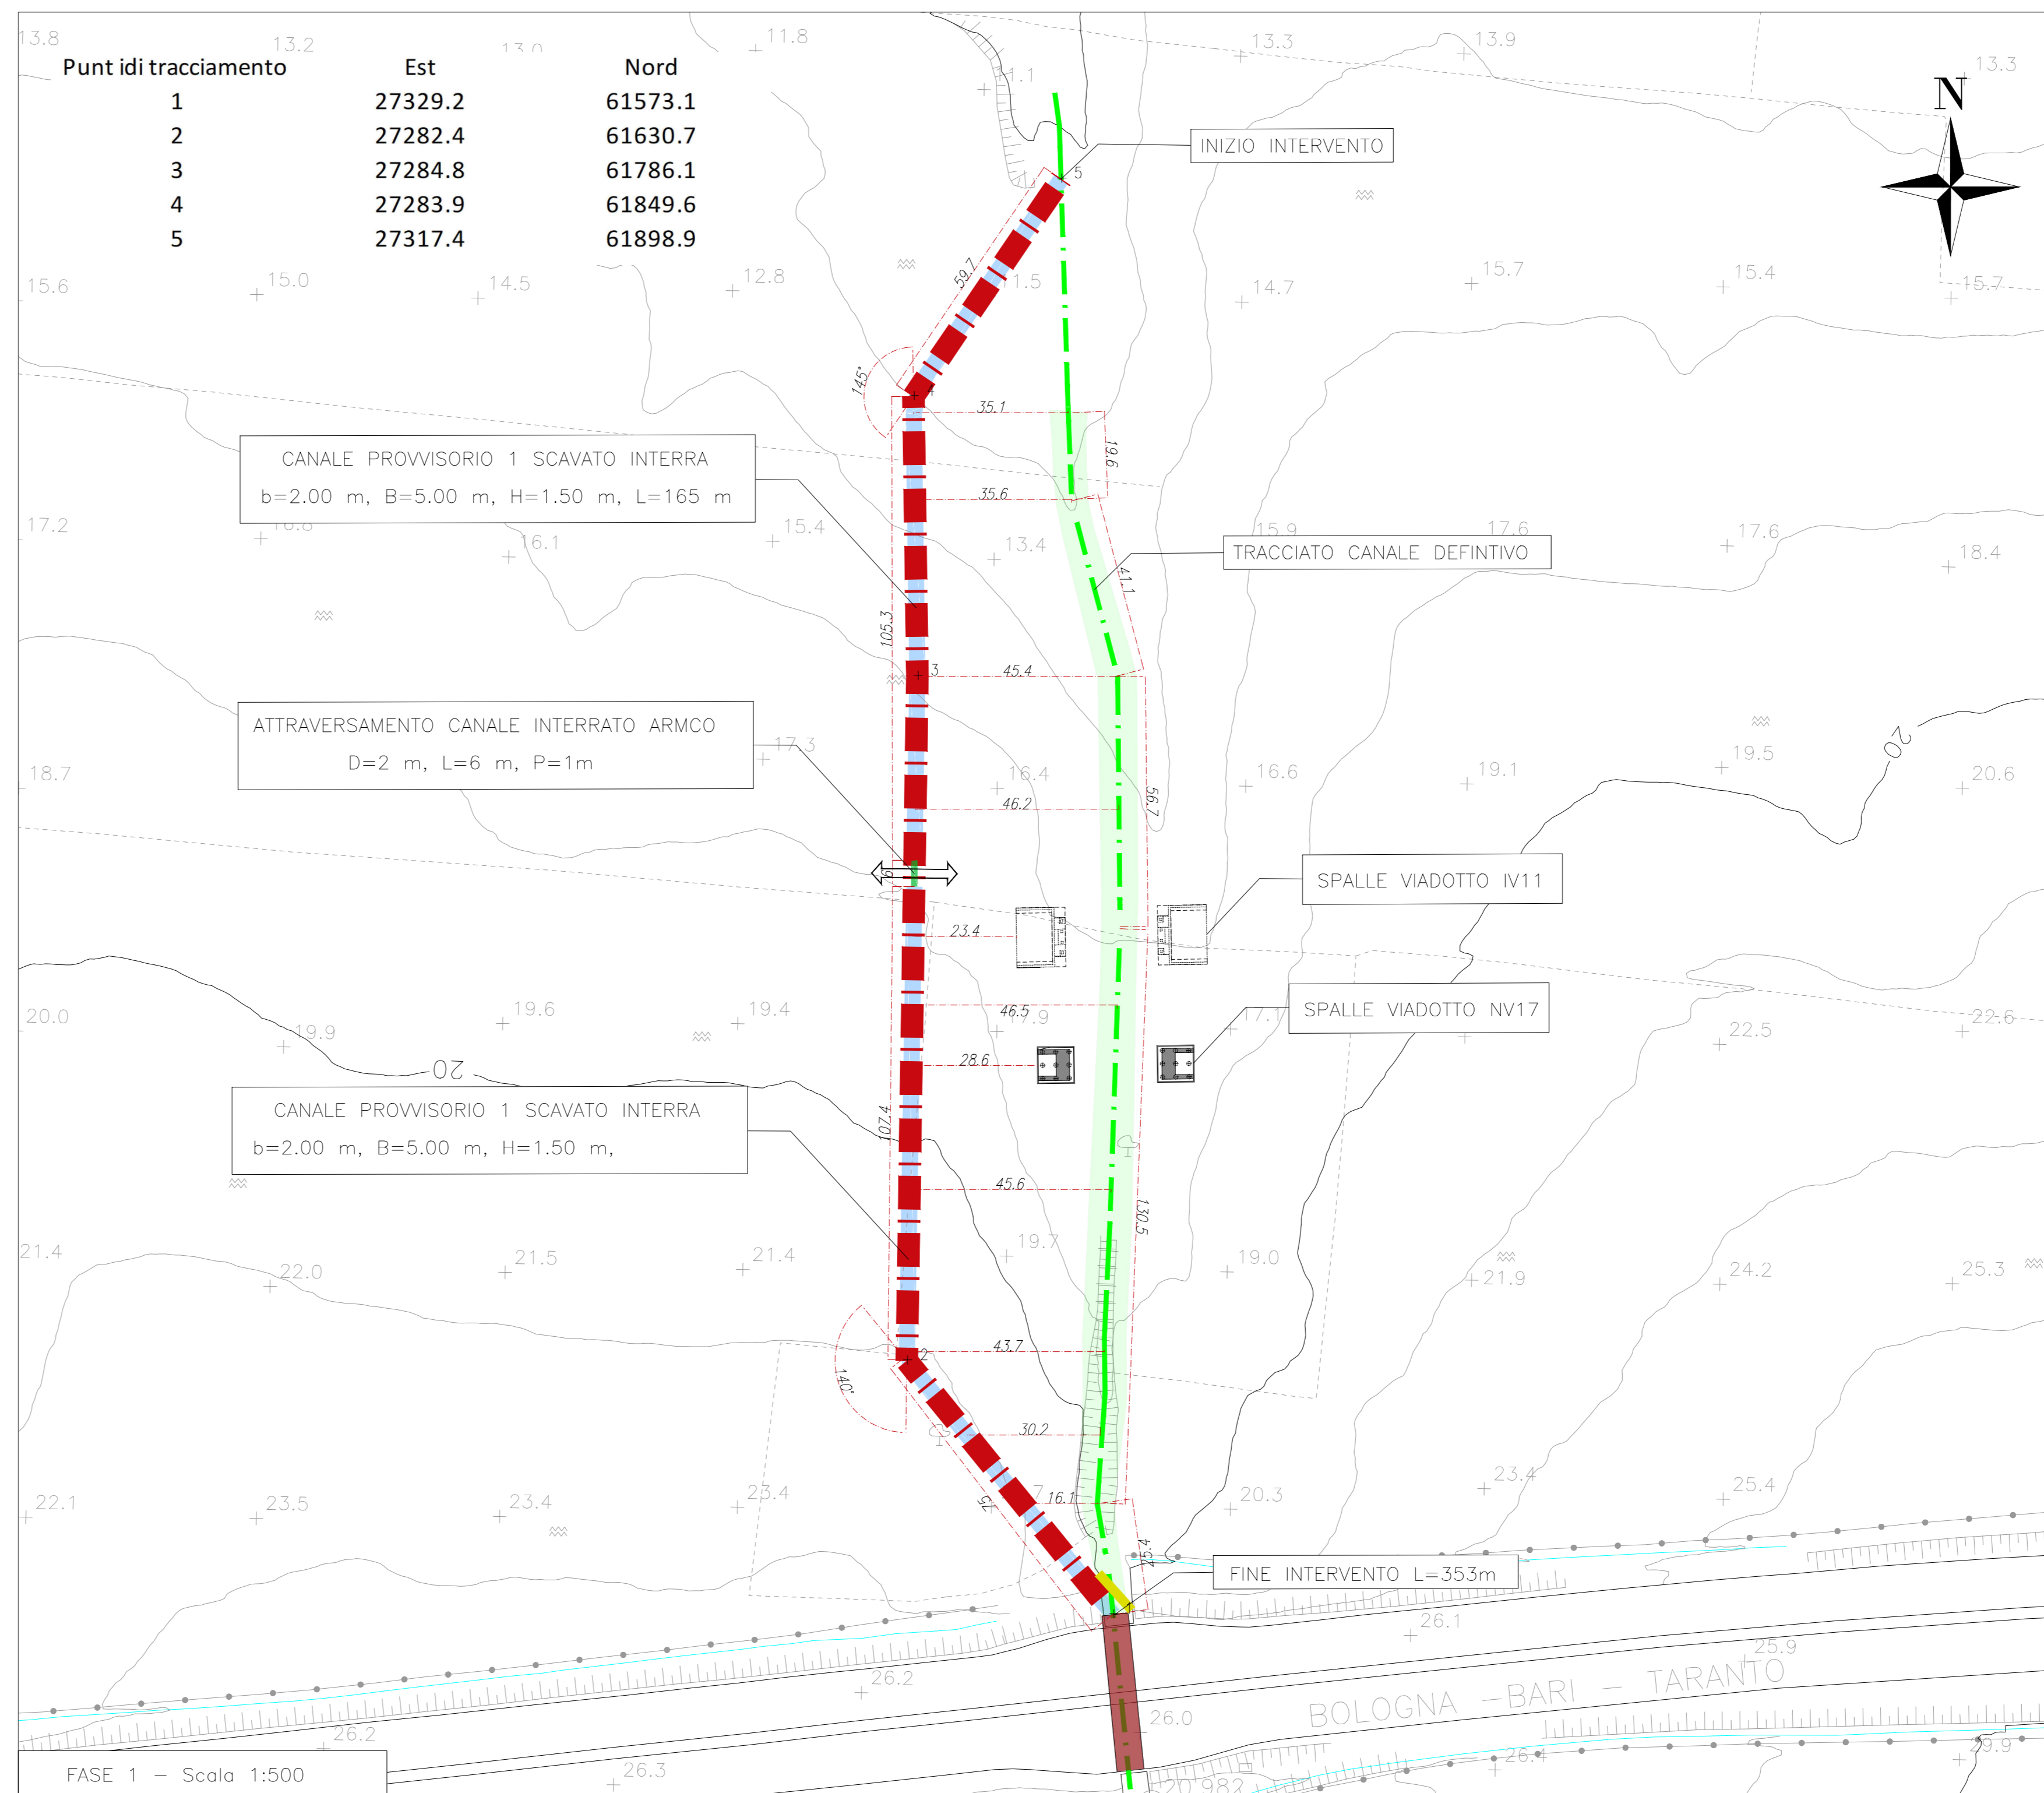

FASE 1 - Scala 1:500

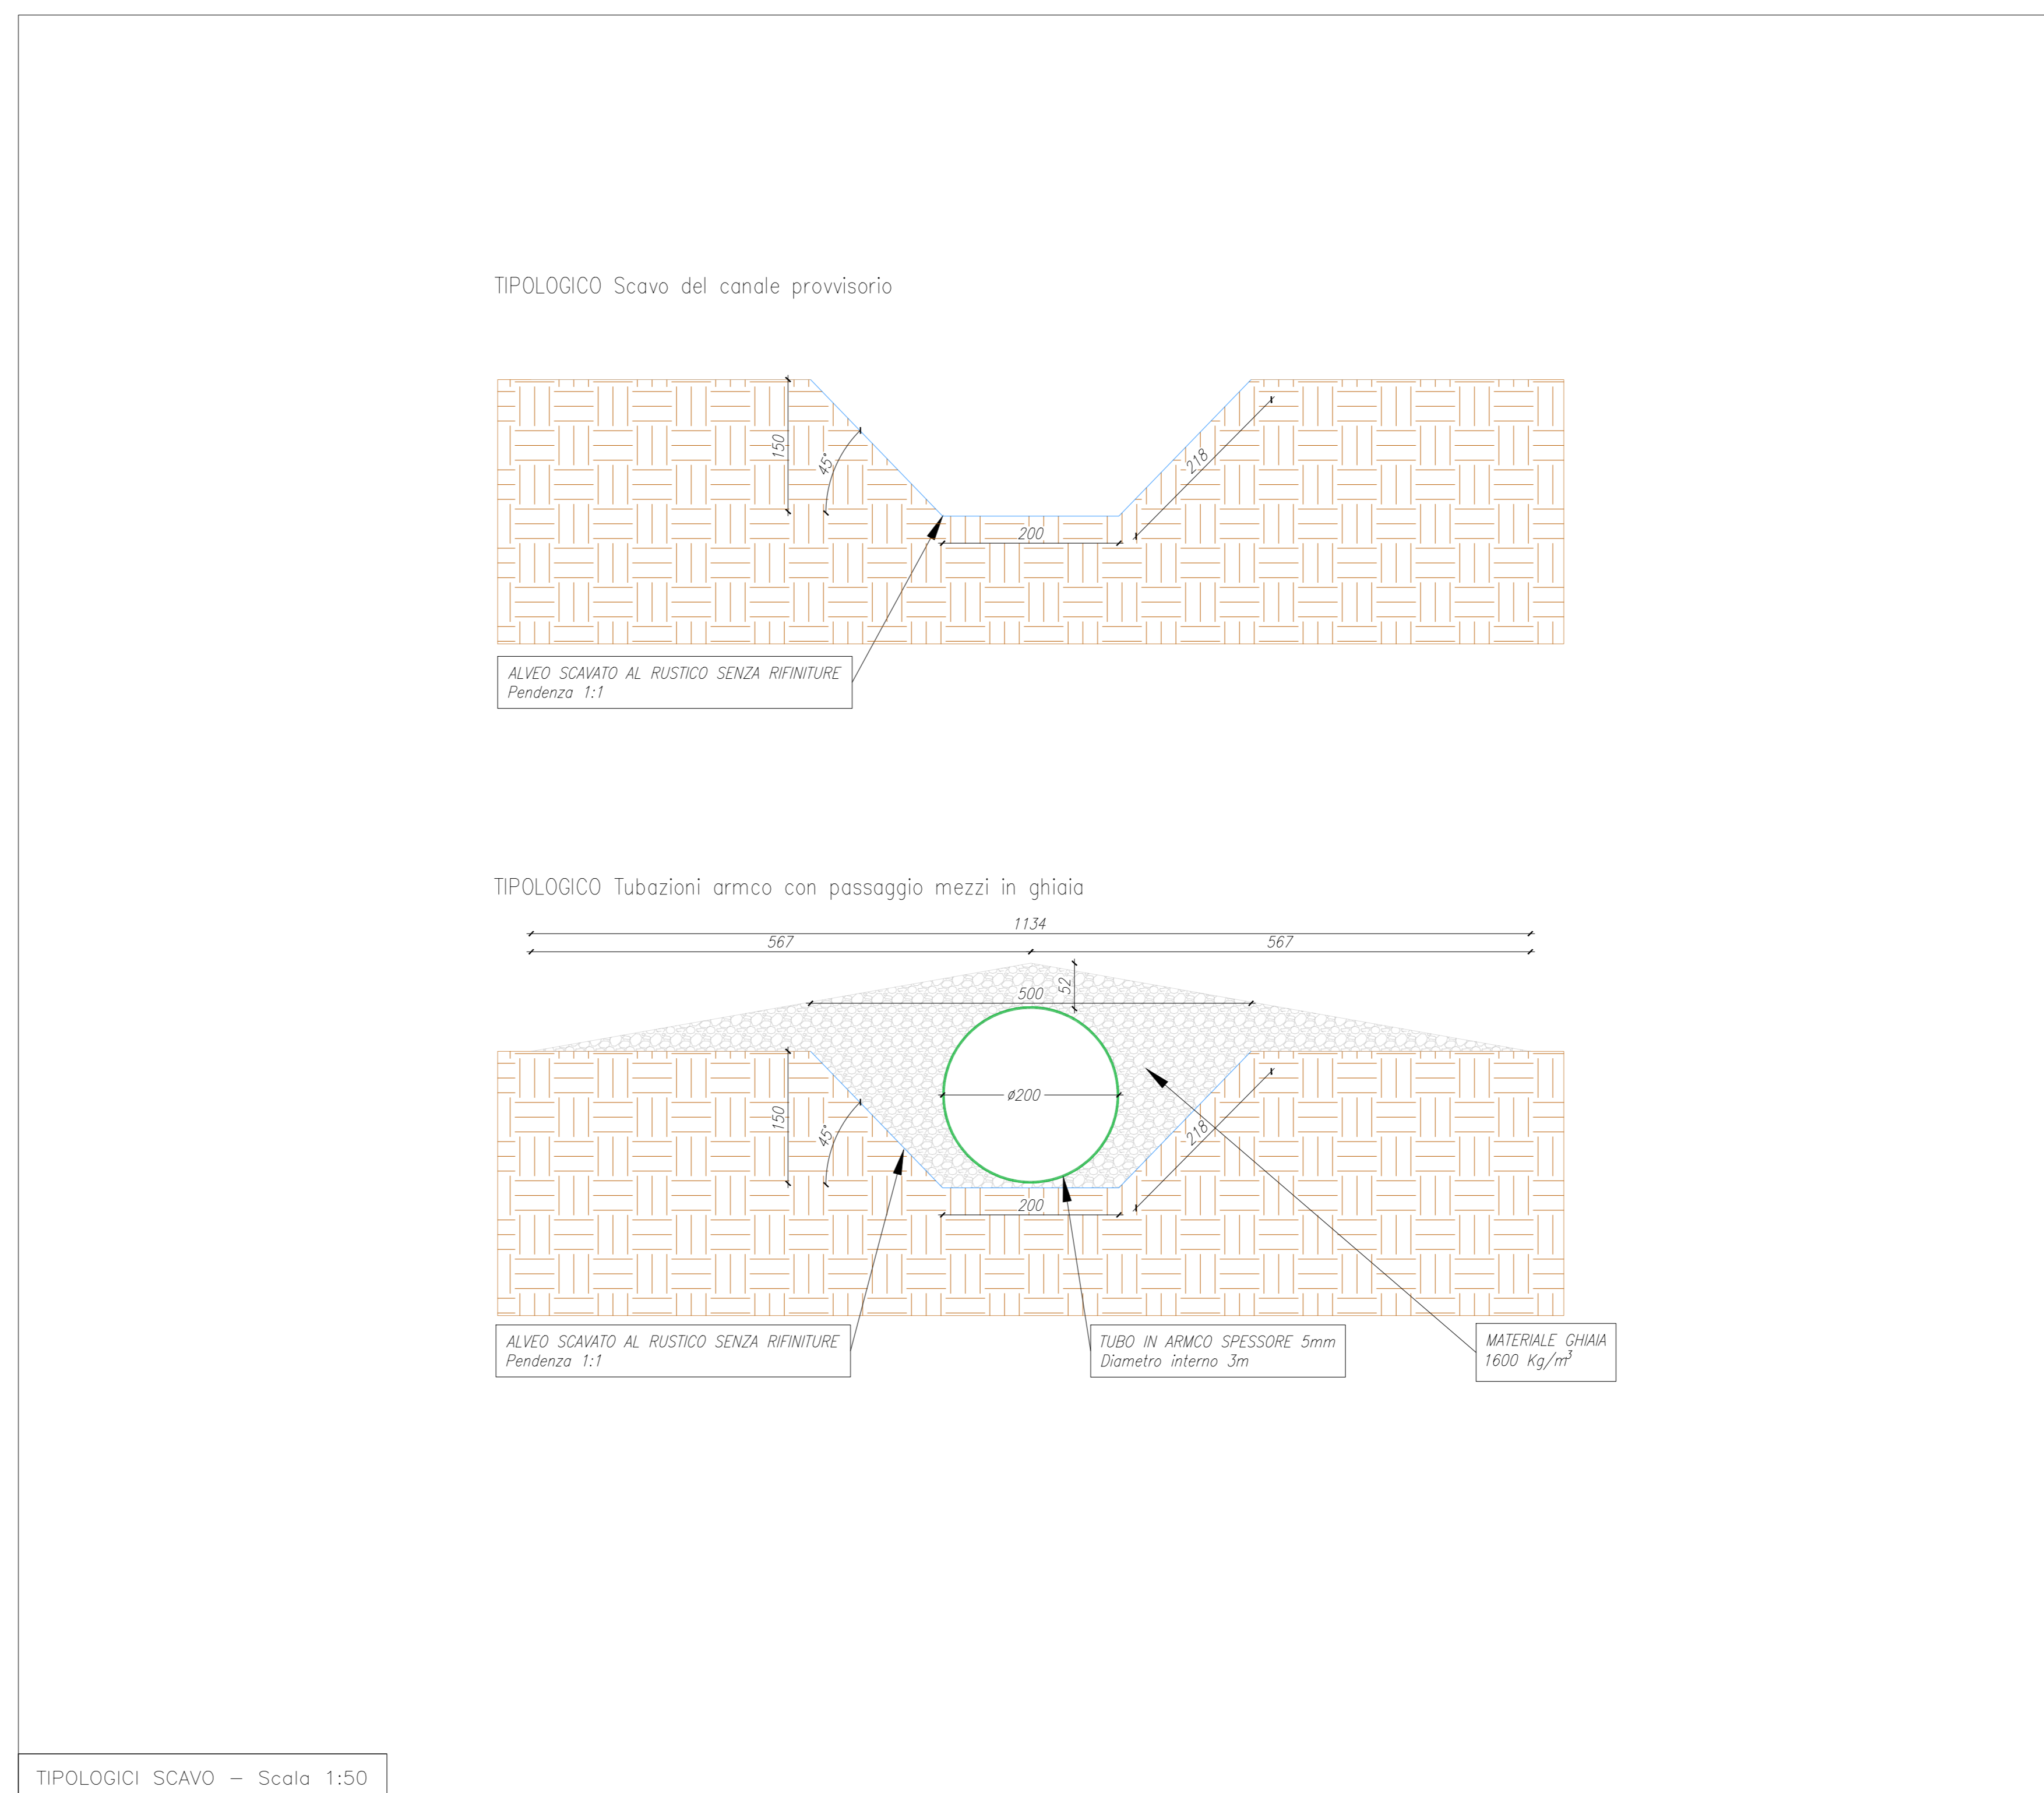

TIPOLOGICI SCAVO - Scala 1:50

- LEGENDA DELLA FASI**
- Corso d'acqua
  - ▬▬▬ Asse canale provvisorio
  - ▬▬▬ Asse canale definitivo
  - ▬▬▬ Tubazione interrato provvisoria armco
  - ▭ Ingombro canale provvisorio
  - ▭ Reinterri
  - ▭ Argine provvisorio in sacchi di sabbia
  - ▭ Rivestimento alveo in massi intasati

1. STATO DI FATTO
  2. FASE 1
    - 2.1. Scavo del canale provvisorio a partire da valle verso monte e posa della tubazione armco per l'attraversamento
    - 2.2. Posa degli argini in sacchi di sabbia a protezione del cantiere
    - 2.3. Avvio delle lavorazioni delle opere viarie
  3. FASE 2
    - 3.1. Scavo e posa in opera del canale definitivo IN36 e del pietrame fondo alveo
    - 3.2. Rimozione degli argini in sabbia e rimozione dei tubi provvisori armco e riinterro del canale provvisorio
    - 3.3. Varo delle travi di impalcato del viadotto (se in interferenza con gli scavi dei canali definitivi)
  4. STATO FINALE
- NOTA: Il canale provvisorio è opera da realizzare preliminarmente alla posa del rilevato stradale. La realizzazione del canale definitivo deve essere completata eventualmente prima del varo delle travi del viadotto se vi fosse interferenza.

**COMMITTENTE:** **RETE FERROVIARIA ITALIANA**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO  
DIREZIONE INVESTIMENTI  
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI  
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

**DIREZIONE LAVORI:** **ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

**APPALTATORE:** **AGOSTINO**  
CONSTRUTTORE - INGEGNERIA

**MANDATARIA:** **HUB** **ENIpro**

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**LINEA PESCARA - BARI**  
**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA**  
**LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**OPERE CIVILI**  
Fasi realizzative IN36

**APPALTATORE:** **AGOSTINO** **PROGETTAZIONE:** **AGOSTINO** **SCALA:** **VARIE**

**COMMESSA:** **LI0B 02 E ZZ PZ IN3600 001 B**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione definitiva	C. Colonna	Maggio 2023	D. Caruso	Maggio 2023	V. Sestini	Maggio 2023		
B	Revisione esecutiva in RV	C. Colonna	Ottobre 2023	D. Caruso	Ottobre 2023	G. Caruso	Ottobre 2023		

File: LI0802EZZPZIN3600001B.DWG | n. Elab.:
