


7

NOTE:
 a- SPOSTAMENTO DEL 1° RILEVATO DI PRECARICA NELLA PORZIONE OVEST DELLA VASCA SUD
 - REALIZZAZIONE DEL 2° RILEVATO DI PRECARICA CON MATERIALI PROVENIENTI DAL CANTIERE DEL 3° VALICO, CIRCA 65'000M³
 - TEMPO DI CONSOLIDAZIONE 8-10 MESI (DA VERIFICARE CON STRUMENTAZIONE IN CORSO D'OPERA)




8

NOTE:
 - ULTIMAZIONE DELLA POSA DEI CASSONI AL TERMINE DEI LAVORI DISISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MOLINASSI
 - REALIZZAZIONE BERME DI RINFIANCO DEI CASSONI
 - POSA GEOTESSILI E Telo HDPE ALL'INTERNO DELLA VASCA NORD
 a- SPOSTAMENTO DEL 2° RILEVATO DI PRECARICA ALL'INTERNO DELLA VASCA NORD E REALIZZAZIONE DEL 3° RILEVATO DI PRECARICA CON MATERIALI PROVENIENTI DAL CANTIERE DEL 3° VALICO, CIRCA 80'000M³

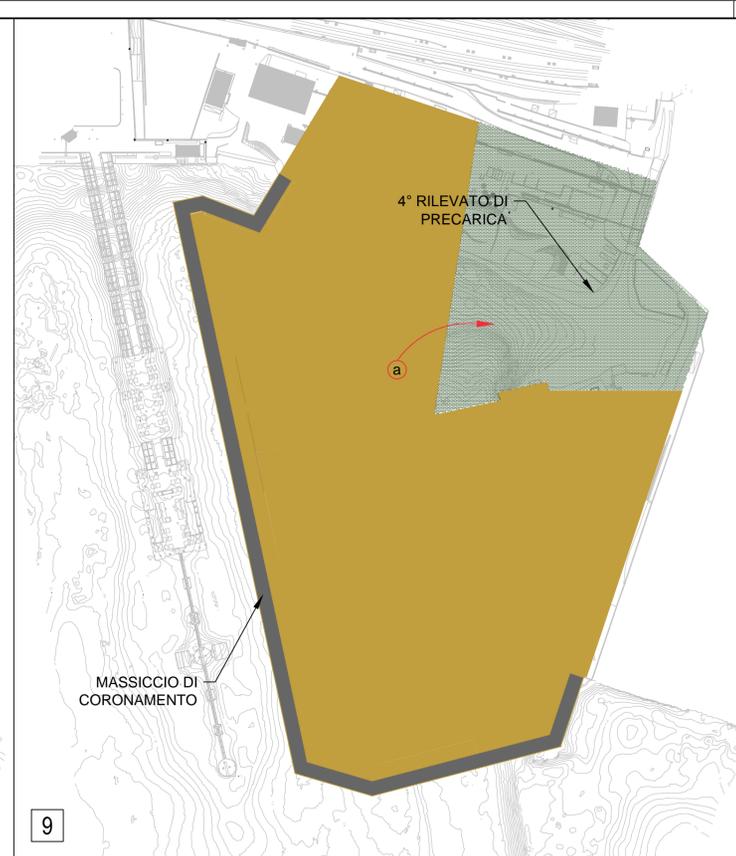





9

NOTE:
 a- SPOSTAMENTO DEL 3° RILEVATO DI PRECARICA ALL'INTERNO DELLA VASCA NORD E REALIZZAZIONE DEL 4° RILEVATO DI PRECARICA CON MATERIALI PROVENIENTI DAL CANTIERE DEL 3° VALICO, CIRCA 50'000M³
 - TEMPO DI CONSOLIDAZIONE 8-10 MESI (DA VERIFICARE CON STRUMENTAZIONE IN CORSO D'OPERA)
 - REALIZZAZIONE DEL MASSICCIO DI CORONAMENTO

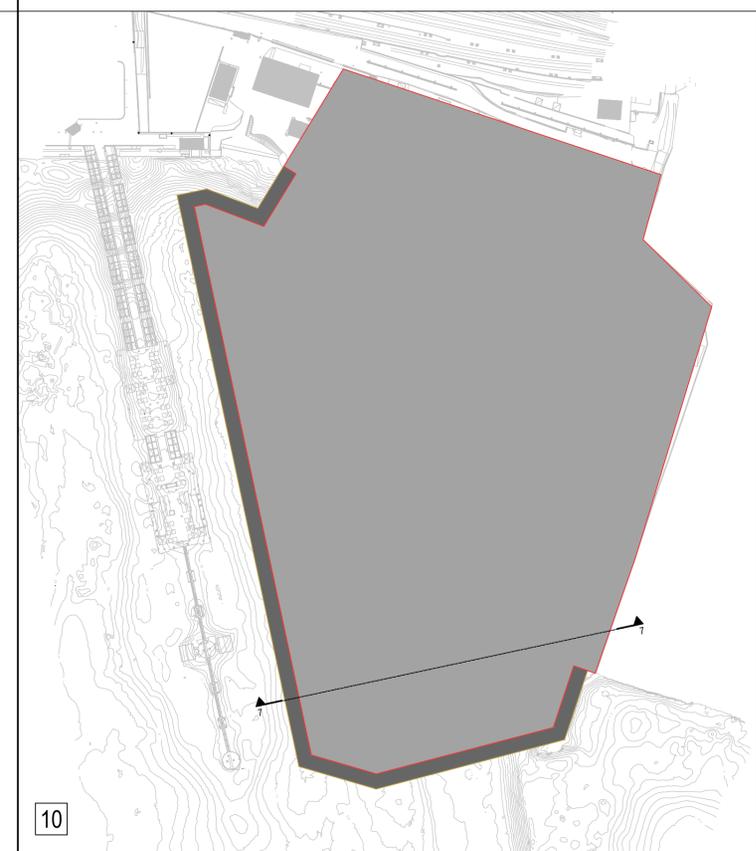

10

NOTE:
 - STESA DEL MISTO GRANULARE STABILIZZATO COME SOTTOFONDAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE
 - STESA E ADDITIVAZIONE CON CEMENTO PER FORMAZIONE DEL MISTO CEMENTATO DI SOTTOFONDO DELLA PAVIMENTAZIONE
 - REALIZZAZIONE MASSICCIO DI CORONAMENTO
 - REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE

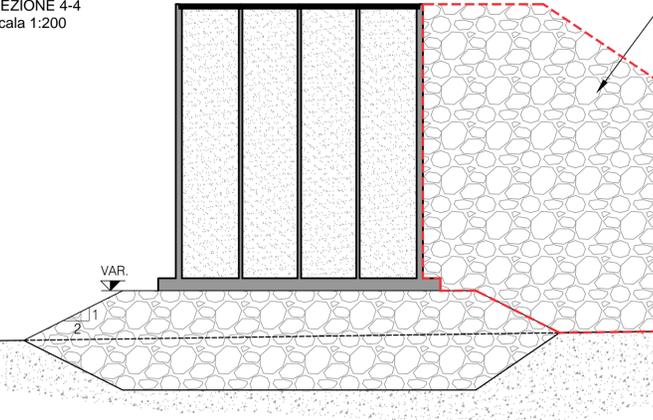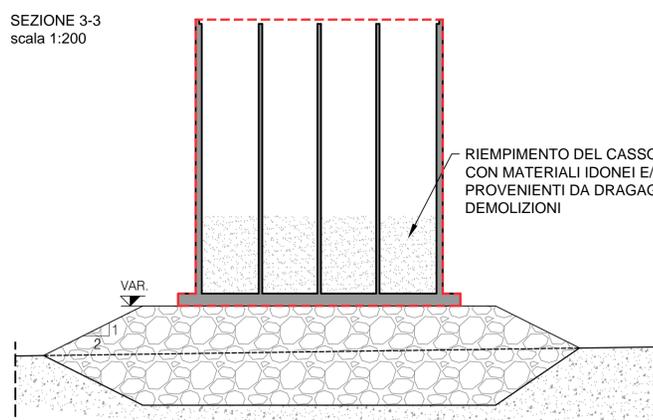

CONVENZIONE ATTUATIVA 21 DICEMBRE 2012 E ADDENDUM (2014) SOTTOSCRITTI DA AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA, COCIV, REGIONE LIGURIA E COMUNE DI GENOVA

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

Consorzio Collegamenti Integrati Valoci

PROGETTO DEFINITIVO DELLA NUOVA CALATA AD USO CANTIERISTICA NAVALE ALL'INTERNO DEL PORTO PETROLI DI GENOVA SESTRI PONENTE E DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MOLINASSI

LOTTO 2
 NUOVA CALATA AD USO CANTIERISTICA NAVALE

Fasi Realizzative 2/3

PROGETTISTA INCARICATO DA COCIV

MWH S.p.A. Corso Donatello Milano 2 - Palazzo Cavos 20090 Segrate (Milano)
 Tel. +39 02 210841 Fax. +39 02 2902070 Web: www.mwh.com/mwhglobal.com

SCALA:

COMMESSA: 45502376 FASE: D LOTTO: 2 TIPO DOC.: D PROGR.: 016 REV.: B

PROGETTAZIONE:

Rev.	Descrizione Emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	Prima Emissione	Castagnella	30/09/2014	Poli	30/09/2014	Susani	30/09/2014
B	Recupero progetto di risoluzione oleodotti	Castagnella	05/12/2014	Poli	05/12/2014	Susani	05/12/2014

IL PROGETTISTA: Dott. Ing. S. Susani

VERIFICATO: VALIDATO: AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

IL RUP	ASSISTENTI AL RUP
Dott. Ing. A. Pieracci	Dott. Geol. G. Canepa Geom. I. Dellepiane Geom. G. Di Luca P.I. F. Piazza Dott. Ing. D. Scattolo Dott. Ing. M. Vaccari Dott. Ing. C. Vincenzi
