

TABELLA MATERIALI

MACROFASI ESECUTIVE (LE FASI OGGETTO DELLA TAVOLA VENGONO EVIDENZIATE IN GRASSETTO)

FASI ESECUTIVE

MACROFASE A

1) REALIZZAZIONE DELLE PROTESE PER L'ESECUZIONE DELLA PARATA DI IMBOSCO IN PALI #1200;
 2) ESECUZIONE DEGLI SCAVI DI SBANCAMENTO SCITTO SUPERFICIALE E PROFILI PROSPETTIVICI ALLA REALIZZAZIONE DEI CONSOLIDAMENTI E DELLE PARATE IN JET-GROUTING;
 3) ESECUZIONE DELLA PARATA DI IMBOSCO IN PALI #1200 SECONDO LA GEOMETRIA DI PROGETTO E REALIZZAZIONE DELLA TRAVE DI TESTA;
 4) ESECUZIONE DEI CONSOLIDAMENTI E DELLE PARATE IN JET-GROUTING.

MACROFASE B

5) REALIZZAZIONE DELLA CANALETTA PER SMALTIMENTO ACQUE E DELLE ALTRE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA SUPERFICIALE;
 6) SCAVO FINO A QUOTA -0,50 IN VALLE DELLA PARATA DI IMBOSCO, FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA PIAZZALE;
 7) REALIZZAZIONE DEI TRANTI E DEI DRENAGGI APPARTENENTI AL PRIMO ORDINE E REALIZZAZIONE A SCENDELLA SULLA PARATA DI UNO STRATO DI CEMENTO BENTONITICO CON RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA 15x15cm E FIBROREINFORZATO;
 8) SCAVO FINO A QUOTA -0,50 IN VALLE DELLA PARATA DEL SECONDO ORDINE E REALIZZAZIONE A SCENDELLA SULLA PARATA DI UNO STRATO DI CEMENTO BENTONITICO CON RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA 15x15cm E FIBROREINFORZATO;
 9) REALIZZAZIONE DELLE SUEDETTI FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA DI FONDO SCAVO;
 10) ESECUZIONE DEGLI SCAVI DI SBANCAMENTO SCITTO SUPERFICIALE E PROFILI TERRENO PROSPETTIVICI AL GETTO DELLA PROTESI IN MISTO STABILIZZATO;
 11) REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO ALL'IMBOSCO DEL CUNCIULO E SCAVO DELL'IMBOSCO DEL CUNCIULO.

MACROFASE C

12) REALIZZAZIONE DELLA DMA DATACIO IN C.A. SECONDO LA GEOMETRIA DI PROGETTO;
 13) REALIZZAZIONE DELLA PROTESI IN MISTO STABILIZZATO;
 14) REALIZZAZIONE IN CORRISPONDENZA DEL FLO DI SCAVO DI UNO STRATO DI SPRETTON FIBROREINFORZATO SPESORE ≥ 200 mm;
 15) STELA DI TERRENO STABILIZZATO A CALCE SECONDO LA GEOMETRIA DI PROGETTO PER DRENAGGI NON SUPERIORI A 30cm E SUCCESSIVA RILAVATURA PER IL DETTAGLIO DELLE FASI ESECUTIVE DELLA COSTRUZIONE DEI RILEVATI SI VEDA LA RELAZIONE TECNICA;
 16) SCAVO DEL CUNCIULO;
 17) REALIZZAZIONE DEI PALI IN CORRISPONDENZA DELLA SAGOMA DELLA GALLERIA E ATTACCO DEGLI SCAVI PRIMA REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA PER CONSOLIDARE IL MEZZO DI RAGGIUNGERE LA QUOTA DI SCAVO;
 18) SCAVO E GETTO DELLE SELLE PER LA TRAGLIOLE DELLE TIM NON INTERFERENTI CON LA RAMPA DI ACCESSO ALLA GALLERIA;
 19) SCAVO E GETTO DELL'ULTIMA PORZIONE DI SELLA;
 20) ATTACCO DEGLI SCAVI CON TIM.

MACROFASE D

21) REALIZZAZIONE DELLE GALLERIA ARTIFICIALI E DEL BECCO DI FLAUTO IN C.A.;
 22) RIFORMAZIONE DELL'IMBOSCO E SISTEMAZIONE DEFINITIVA DEL PIAZZALE.


NOTA:

NELLA FASE DI SCAVO DEI PALI DI IMBOSCO DELLA PROTESI SI DOVRÀ PROVVEDERE ALL'IMPIEGO DI POMPE DI AGGIUSTAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE.

LEGENDA


- Q.P. QUOTA PROGETTO IN ASSE GALLERIA
- P.S. PIANO DI SCAVO
- Q.T.T. QUOTA TESTA TRAVE

SEZIONE A-A
SCALA 1:200

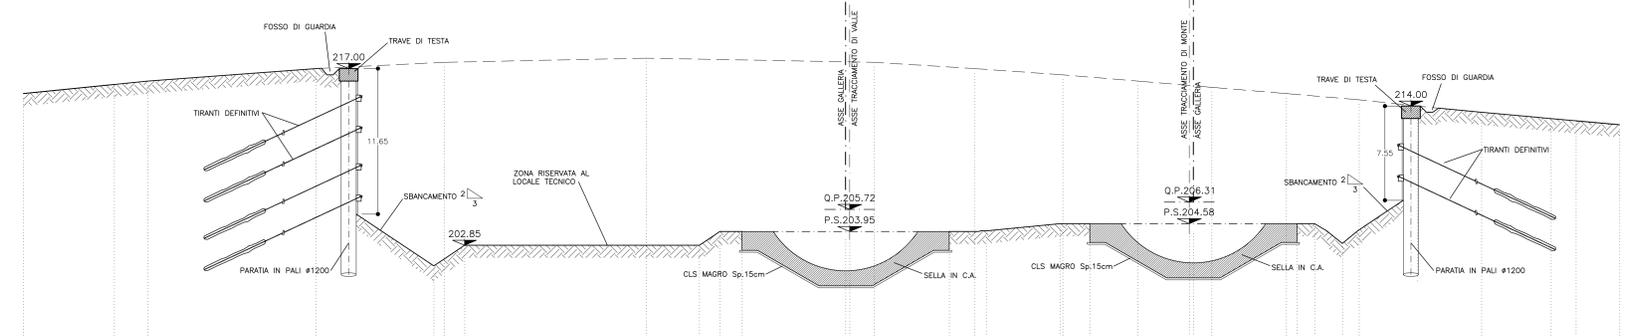


PROGETTO	QUOTE		Distanze parziali		Distanze parziali																				
	Q	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PROGETTO	201.20	202.85	6.22	2.46	19.78	1.65	1.77	8.30	0.33	7.97	2.010.96	5.91	2.38	7.97	0.33	8.30	1.41	2.22	4.89	206.45					
TERRENO	212.73	215.60	214.00	217.50	217.83	217.50	217.50	217.00	217.50	217.00	217.00	216.50	216.00	216.00	215.50	215.00	214.50	214.00	213.50	213.83	217.50				
PROGETTO	1.501.19	13.47	10.28	16.18	18.28	8.01	7.09	6.01	5.92	5.97	5.84	4.68	5.13	4.04	1.53	2.00	2.00	2.00	2.00	217.50					
TERRENO	1.501.19	13.47	10.28	16.18	18.28	8.01	7.09	6.01	5.92	5.97	5.84	4.68	5.13	4.04	1.53	2.00	2.00	2.00	2.00	217.50					

SEZIONE B-B
SCALA 1:200

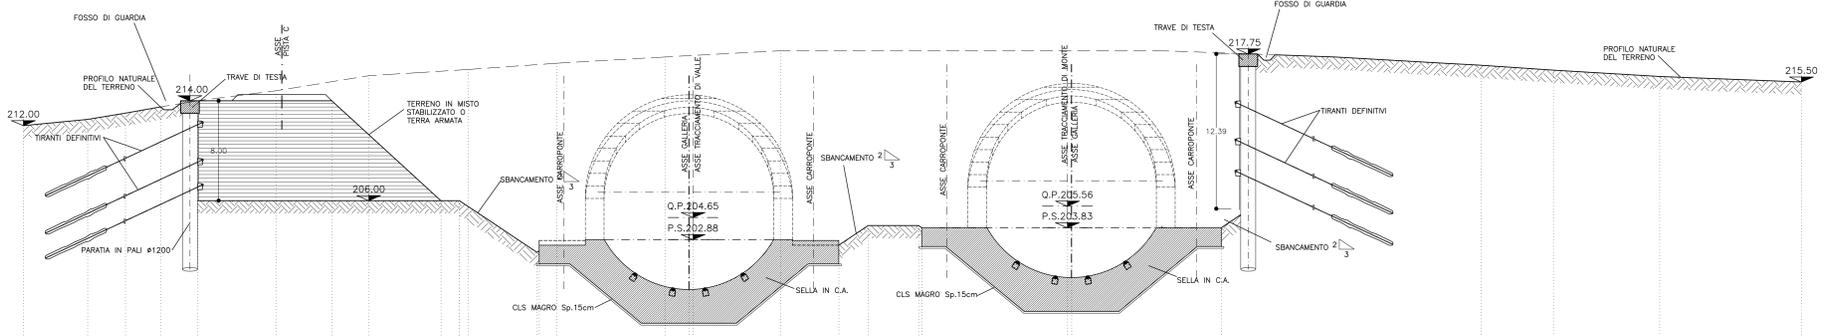

PROGETTO	QUOTE		Distanze parziali		Distanze parziali																				
	Q	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PROGETTO	214.00	214.00	10.67	8.74	1.48	6.22	0.17	201.96	202.86	202.86	202.86	202.43	204.00	204.00	204.00	203.83	204.87	203.83	204.87	215.50					
TERRENO	212.50	213.00	213.50	214.00	214.80	216.00	216.50	217.00	217.50	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00				
PROGETTO	3.02	2.82	2.98	6.26	7.44	7.95	7.10	8.67	9.26	30.60	11.67	0.33	12.00	1.56	13.89	8.71	2.68	6.04	8.51	215.50					
TERRENO	3.02	2.82	2.98	6.26	7.44	7.95	7.10	8.67	9.26	30.60	11.67	0.33	12.00	1.56	13.89	8.71	2.68	6.04	8.51	215.50					

SEZIONE C-C
SCALA 1:200

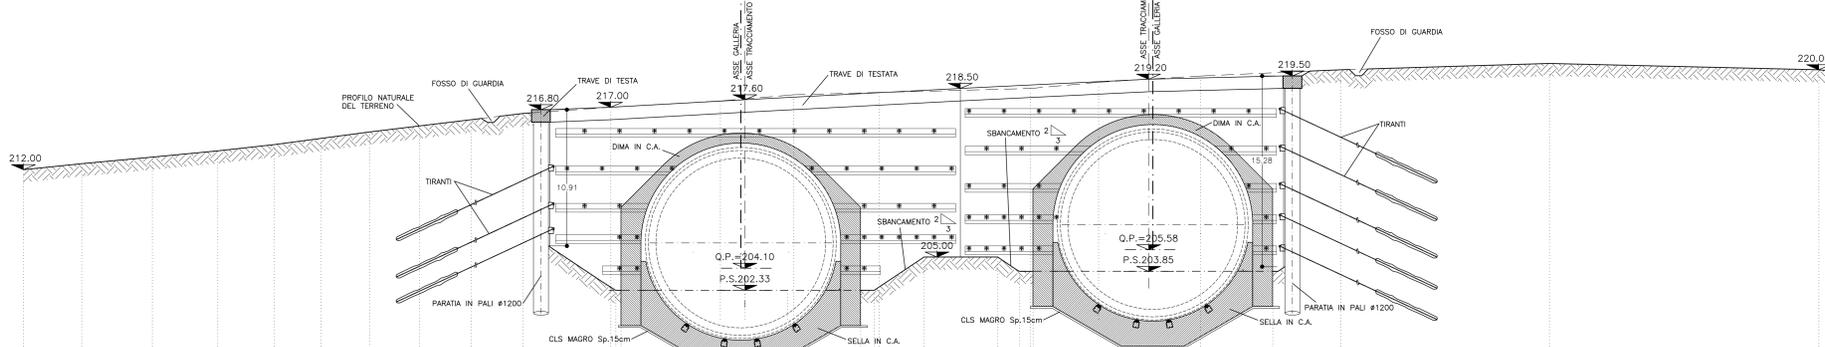

PROGETTO	QUOTE		Distanze parziali																					
	Q	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PROGETTO	202.33	202.33	5.38	0.43	9.60	0.33	202.33	202.33	202.33	202.33	202.33	202.33	202.33	202.33	202.33	202.33	202.33	202.33	202.33	202.33	202.33	202.33	202.33	202.33
TERRENO	214.48	213.00	213.50	214.00	214.50	214.86	215.01	215.50	216.00	216.50	216.99	217.50	218.00	218.18	218.50	219.00	219.50	219.89	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
PROGETTO	5.66	5.23	-11.92	4.51	3.76	2.76	1.15	4.00	4.14	4.16	7.02	8.78	5.88	6.82	12.11	5.48	8.17	8.77	2.46	16.73	21.58			
TERRENO	5.66	5.23	-11.92	4.51	3.76	2.76	1.15	4.00	4.14	4.16	7.02	8.78	5.88	6.82	12.11	5.48	8.17	8.77	2.46	16.73	21.58			

Autostrada Asti-Cuneo

REGIONE PIEMONTE
 PROVINCIA DI ASTI
 PROVINCIA DI CUNEO

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE ASTI - CUNEO

TRONCO II A21 (ASTI EST) - A6 (MARENE)
 LOTTO 6 RODDI - DIGA ENEL

PROGETTO ESECUTIVO
 OPERE D'ARTE IN SEDE

SEZIONI FASE C TAV. 1/3

Approvato: 01/03/2015
 Data: 01/03/2015
 Descrizione: Decisione
 Revisione: Rev. a seguito rich. MIT-SVCA
 Firmato: Ing. Gatti
 Controllato: Ing. Gatti
 Approvato: Ing. Gatti
 Controllato: Ing. Gatti

Approvato: 01/03/2015
 Data: 01/03/2015
 Descrizione: Decisione
 Revisione: Rev. a seguito rich. MIT-SVCA
 Firmato: Ing. Gatti
 Controllato: Ing. Gatti
 Approvato: Ing. Gatti
 Controllato: Ing. Gatti

Scala: 1:200

PROGETTISTA & RESP. INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
 Dott. Ing. Enrico Ghislandi
 Abto di Milano
 N° A 16993

CONSULENZA SPECIALIZZATA
RCR S.p.A.
 Via S. Pietro 10
 10121 TORINO

CONCESSIONARIA:
ASSTRAS
