


352.01/14226300.DWG 26.05.14 - REV/00 GA/MI

NOTE GENERALI

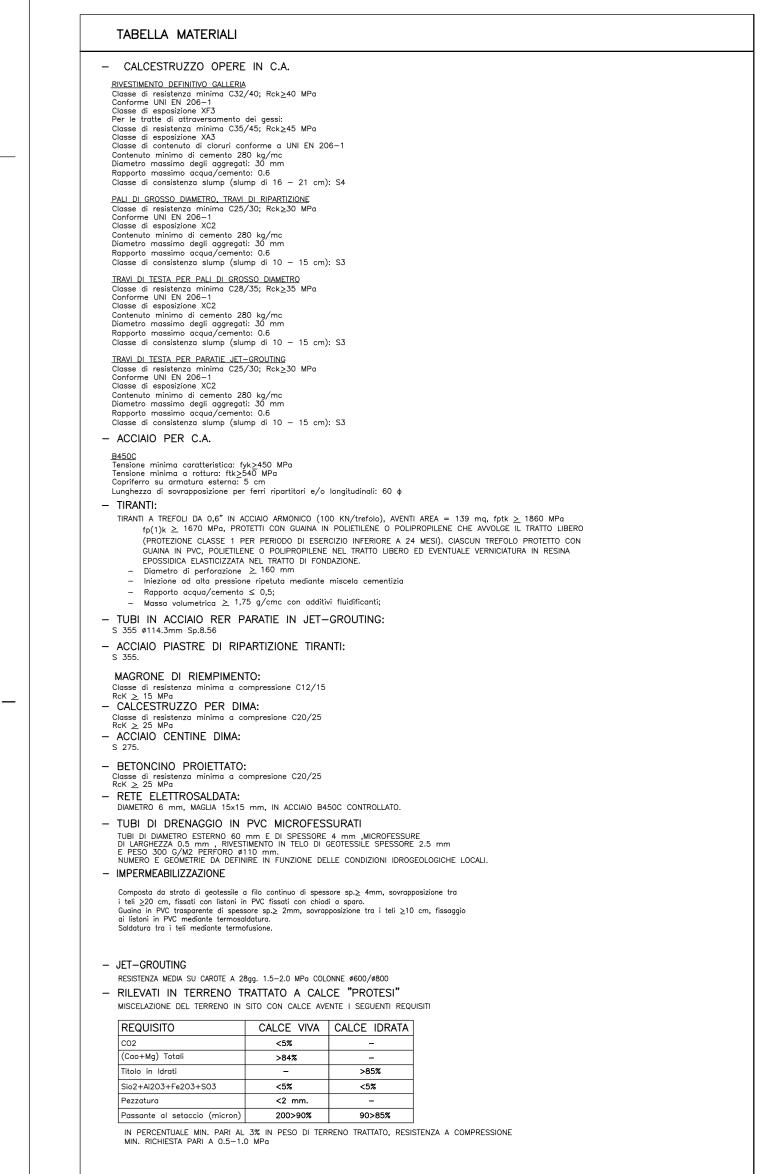

FASI ESECUTIVE (LE FASI OGGETTO DELLA TAVOLA SONO EVIDENZIATE IN GRASSETTO)

MACROFASE A 1) REALIZZAZIONE DELLA CANALETTA PER SMALTIMENTO ACQUE E DI TUTTE LE OPERE DI STABILIZZAZIONE PIEZOMETRICA MEDIANTE TRINCEE DRENANTI

(VEDI ELABORATO SPECIFICO)

2) REALIZZAZIONE (DOVE PREVISTO) DI PARATIE IN JET-GROUTING Ø800 PROPEDEUTICHE AI SUCCESSIVI SBANCAMENTI.

3) ESECUZIONE SCAVI DI SBANCAMENTO E RIPORTO TERRENO A PREPARARAZIONE DEL GETTO DELLA PROTESI IN MISTO STABILIZZATO; 4) REALIZZAZIONE CONSOLIDAMENTI PROPEDEUTICI ALLA FONDAZIONE DELLA PROTESI;

MACROFASE B

5A) REALIZZAZIONE DELLA PROTESI IN MISTO STABILIZZATO

- REALIZZAZIONE IN CORRISPONDENZA DEL FILO DI SCAVO DI UNO STRATO DI SPRITZ-BETON SPESSORE SP.=20cm ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA

STESA DI TERRENO STABILIZZATO A CALCE SECONDO LA GEOMETRIA DI PROGETTO PER STRATI NON SUPERIORI A 30cm E SUCCESSIVA RULLATURA.

5B) ESECUZIONE DELLA PARATIA IN PALI DI GROSSO DIAMETRO RIVESTITA

MACROFASE C

6) ESECUZIONE DEGLI SCAVI E REALIZZAZIONE DEI TIRANTI FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA DI SCAVO.

7) REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI DI SBANCAMENTO NECESSARI AL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA FONDO SCAVO DELLA GALLERIA NATURALE .

8) REALIZZAZIONE DELLA DIMA D'ATTACCO IN C.A.9) RIMOZIONE DEI PALI IN CORRISPONDENZA DELLA SAGOMA DELLA GALLERIA E ATTACCO DEGLI SCAVI PREVIA REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA PER CONSENTIRE AI MEZZI DI RAGGIUNGERE LA QUOTA DI SCAVO;

10) SCAVO E GETTO DELLE SELLE PER LA TRASLAZIONE DELLE TBM NON INTERFERENTI CON LA RAMPA DI ACCESSO ALLA GALLERIA; 11) SCAVO E GETTO DELL' ULTIMA PORZIONE DI SELLA;

12) ARRIVO TBM

FASE DEFINITIVA

13) REALIZZAZIONE DELLE GALLERIE AI

13) REALIZZAZIONE DELLE GALLERIE ARTIFICIALI E DEL BECCO DI FLAUTO IN C.A.;14) RITOMBAMENTO DELL'IMBOCCO E SISTEMAZIONE DEFINITIVA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEFINITIVA.

JELLIMBOCCO E SISTEMAZIONE DEFINITIVA E DELLE OFERE DI REGIMAZIONE IDRAGLICA DEFIN

| | LEGENDA |
|---------|---------------------------------|
| – Q.P. | QUOTA PROGETTO IN ASSE GALLERIA |
| – P.S. | PIANO DI SCAVO |
| _ 0.T.T | OLIOTA TESTA TRAVE |

- P.S. PIANO DI SCAVO - Q.T.T. QUOTA TESTA TRAVE









PROVINCIA DI ASTI

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE ASTI - CUNEO

TRONCO II A21 (ASTI EST) - A6 (MARENE) LOTTO 6 RODDI - DIGA ENEL

LOTTO 0 RODDI-DIGA LINEL

PROGETTO ESECUTIVO OPERE D'ARTE IN SEDE

GALLERIA DI VERDUNO GALLERIA ARTIFICIALE E IMBOCCO LATO ALBA PROFILI D'INTERVENTO FASE A

Aggiornato: Data: Descrizione: Redatto: Ing. Gatti Ing. Ossesia Ing. Ghislandi Data: Descrizione: Ing. Gatti Ing. Ossesia Ing. Ghislandi Data: Descrizione: Redatto: Controllato: Approvato: Ing. Ghislandi Data: Descrizione: Redatto: Controllato: Approvato: Ing. Ghislandi Ing. Ghislandi Data: Descrizione: Redatto: Controllato: Approvato: Ing. Ghislandi Data: Descrizione: Ing. Ghislandi Data: Data: Data: Data: Descrizione: Ing. Ghislandi Data: Data: Data: Data: Descrizione: Ing. Ghislandi Data: D



ETTISTA e RESP. INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICI Dott. Ing. Enrico Ghislandi Albo di Milano N° A 16993

