



PROGETTO: Collegamento 220kV Italia - Malta
PROJECT: 220kV Malta - Italy link

TITOLO: DOCUMENTAZIONE DI OTTEMPERANZA
TITLE: ALLA PRESCRIZIONE N°29
del DVADEC - 2012 - 0000739 del 20/12/2012

Intervento di riqualificazione naturalistico e paesaggistico
dell'area di approdo del cavidotto Italia - Malta

PROVINCIA DI RAGUSA
COMUNE DI RAGUSA

TITOLO: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTISTA

DOTT. ING. Umberto Lisa

Collaboratore

DOTT. ARCH. Valerio Dimartino




VISTO

| NOME DEL FILE FILE NAME | SCALA CAD CAD SCALE | FORMATO FORMAT | SCALA SCALE | ALLEGATO |
|----------------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | | | N |

Questo documento contiene informazioni di proprietà Enemalta Corporation e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Enemalta Corporation

This document contains information proprietary to Enemalta Corporation and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been delivered. Whichever kind of spreading or reproduction without the written permission of Enemalta Corporation is prohibited.

| N. ord. | Cod. | Attività | Inizio | Fine | Durata gg. |
|---------|------|---|------------|------------|------------|
| 1 | A | Consegna dei lavori | 01/01/2016 | 01/01/2016 | 0 |
| 2 | B | Preparazione cantiere | 01/01/2016 | 04/01/2016 | 3 |
| 3 | C | Pulizia e livellamento terreno | 04/01/2016 | 03/02/2016 | 30 |
| 4 | D | Sistemazione scarico reflui | 07/01/2016 | 12/01/2016 | 5 |
| 5 | E | Ripristino asfalto, scarifica e stesura tappeto di usura | 04/02/2016 | 24/02/2016 | 20 |
| 6 | F | Realizzazione di mantellata | 24/02/2016 | 10/03/2016 | 15 |
| 7 | G | Realizzazione di percorsi pedonali con misto granulare stabilizzato | 10/03/2016 | 30/03/2016 | 20 |
| 8 | H | Realizzazione impianto di illuminazione pubblica | 24/03/2016 | 23/04/2016 | 30 |
| 9 | I | Realizzazione di impianto di irrigazione | 20/04/2016 | 05/05/2016 | 15 |
| 10 | L | Posa di attrezzature per area giochi bimbi | 06/05/2016 | 16/05/2016 | 10 |
| 11 | M | Posa di elementi di arredo urbano quali panche, cestini e portabici | 17/05/2016 | 24/05/2016 | 7 |
| 12 | N | Rintaralizzazione area con piantumazione di alberi, arbusti, ecc. | 25/05/2016 | 24/06/2016 | 30 |
| 13 | O | Smobilizzo cantiere e Fine lavori | 26/06/2016 | 29/06/2016 | 3 |

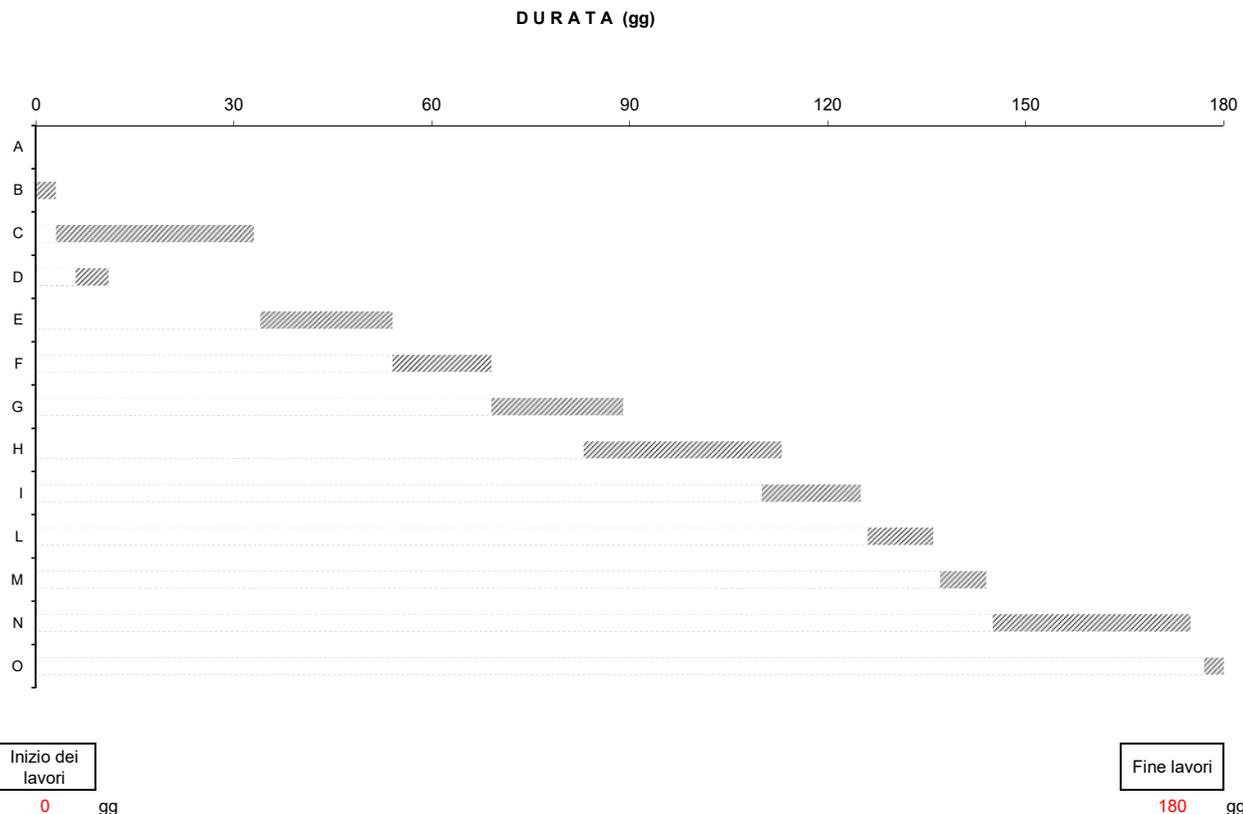

TC **180** gg.
naturali consecutivi
