



SEZIONE C-C 1:50

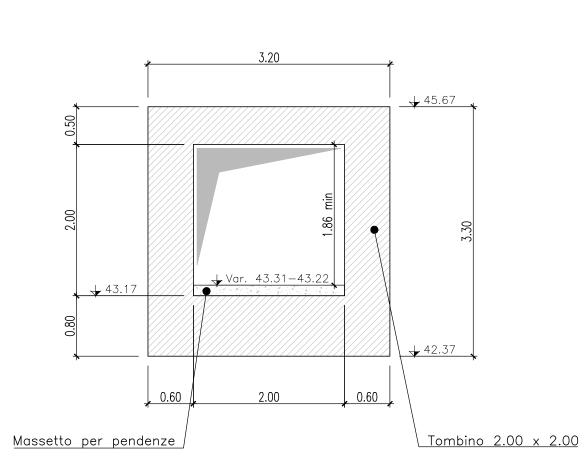

NOTA:

GIUNTO REALIZZATO IN
WATERSTOP CON PROFILATO IN
RESINE VINILICHE DI 300mm.

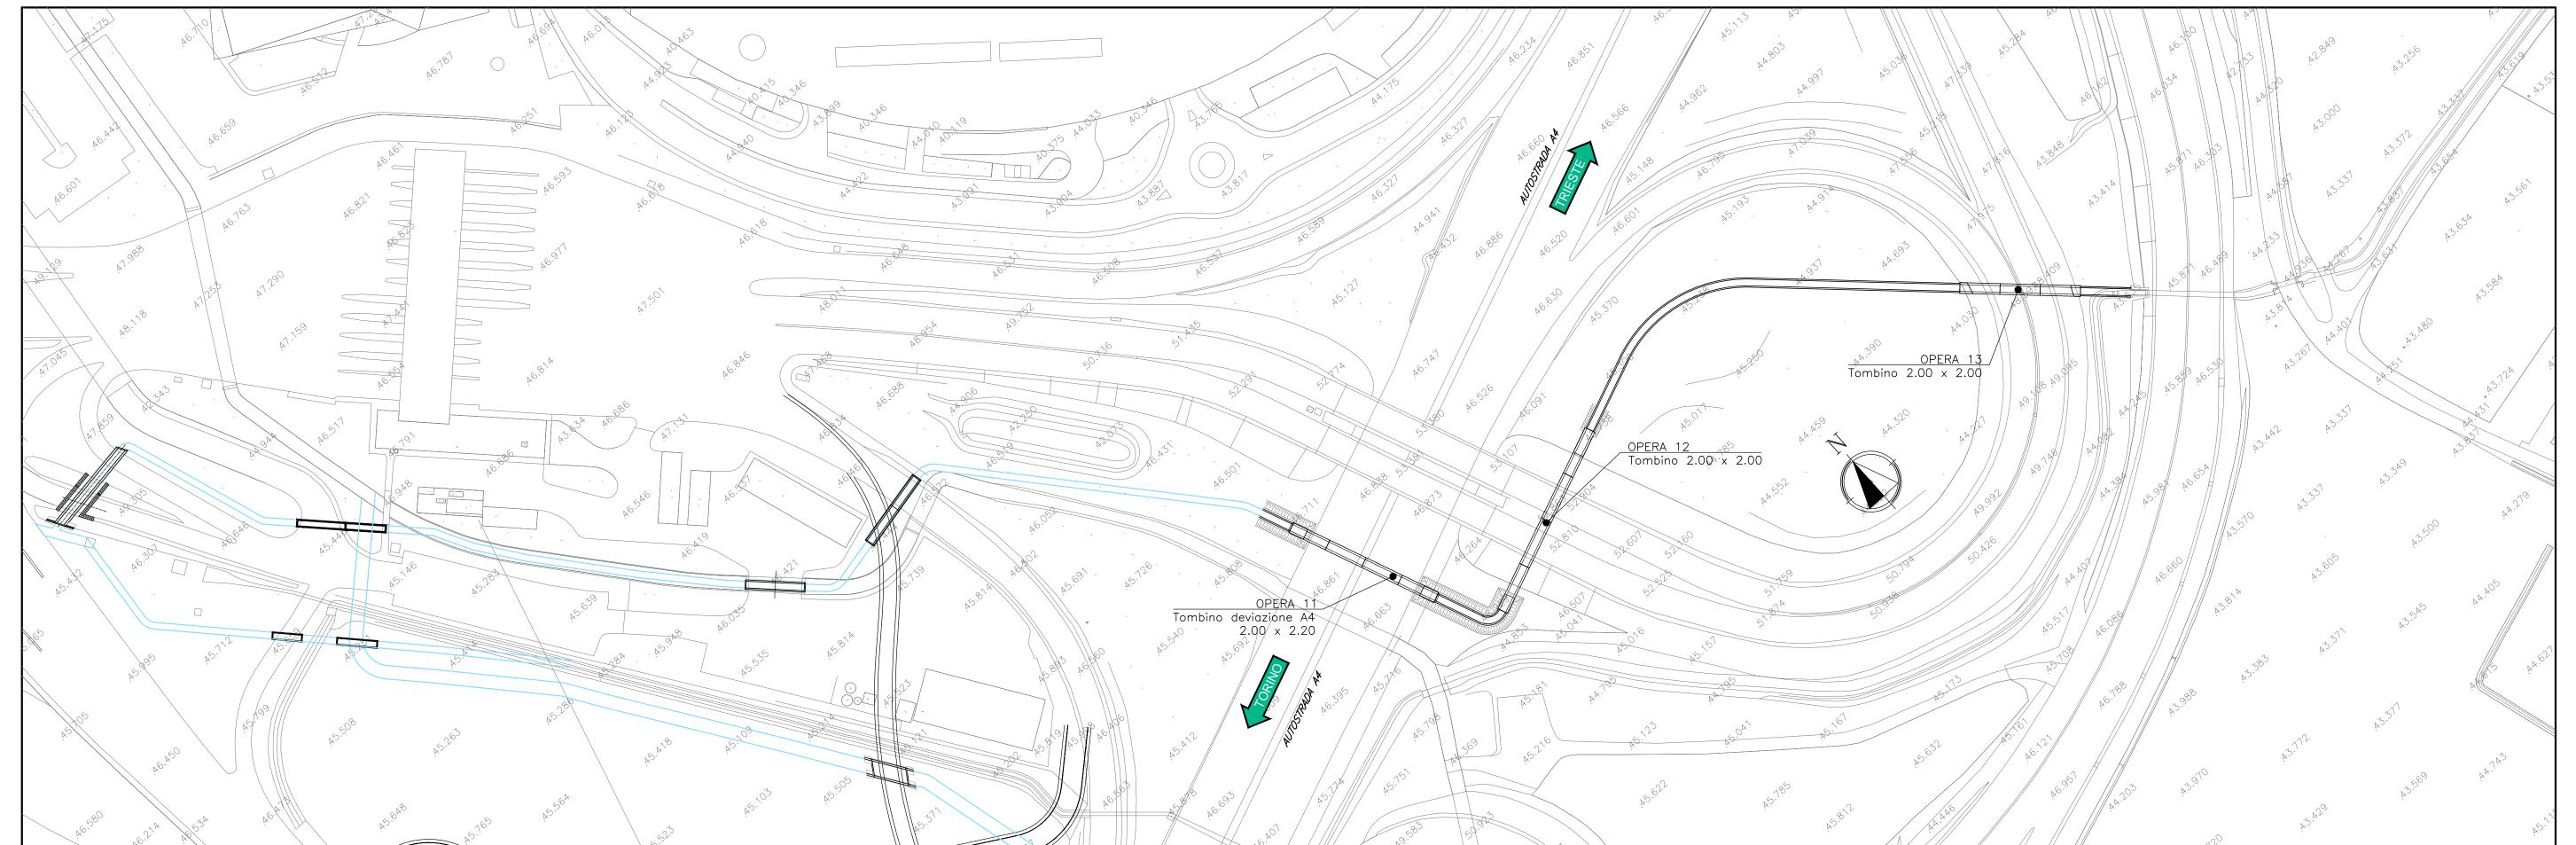

SEQUENZA FASI REALIZZATIVE

1) Preparazione area di cantiere e scavo a sezione aperta; Getto in opera del muro reggispinta, della platea di contrasto e della platea di varo con relativi martinetti; Posa in opera del primo concio con relativo rostro metallico;

1) Spinta del primo concio, in c.a. (lungh 15.00 m) con relativa estensione dei martinetti idraulici; collegamento dei conci successivi con waterstop idroespandibili di tenuta idraulica con effetto ritardante;

FASE 3

1) Spinta dell'ultimo concio con massima estensione dei martinetti;
Monitoraggio inclinazione scatolare e pavimentazione stradale
superiore;

FASE 4

1) Smontaggio rostro metallico, realizzazione massetto delle pendenze e realizzazione soletta di invito del canale idraulico; sistemazione finale.

Incidenza armatura	
Elemento	kg/mc
Copertura	120
Piedritti	120
Fondazione	120
Muri andatori (Paramento e Fondazione)	90
Muri reggispinta Platea di varo	150 160



CIG: 3320049F17

Data: Maggio 2015
