

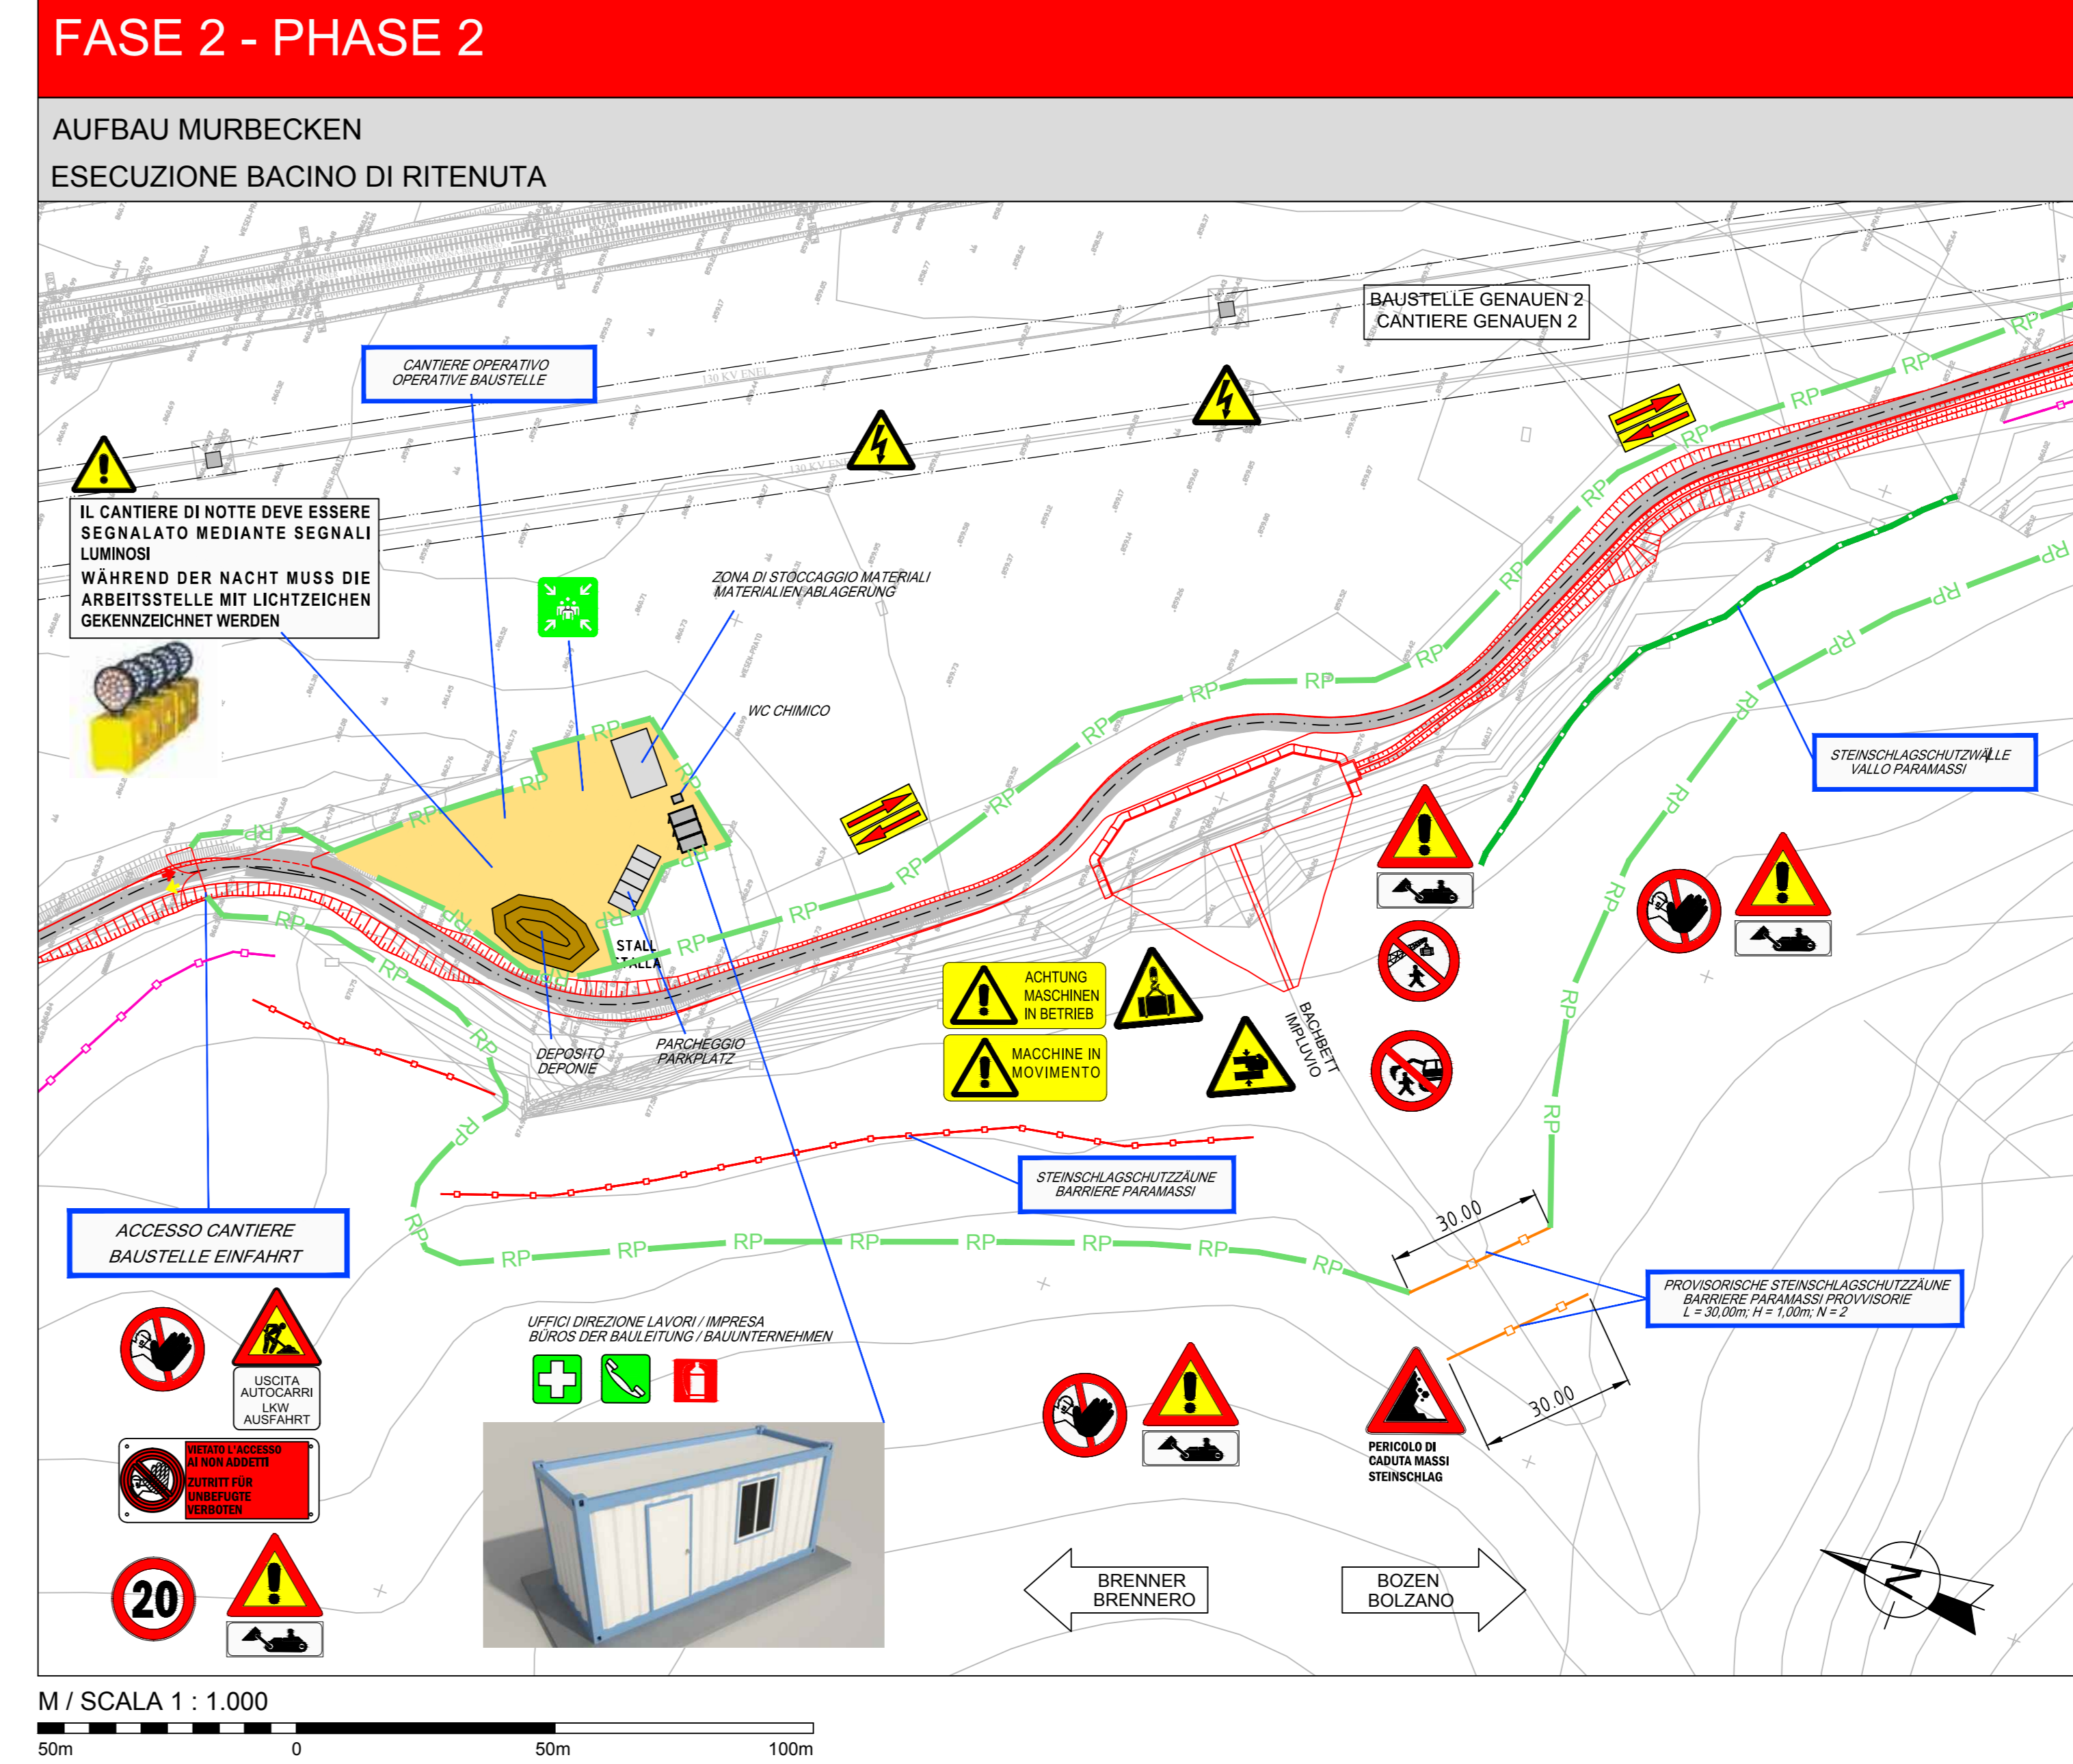


**LEGENDA CANTIERE
LEGENDE BAUSTELLE**

- Tratto di strada interessata dai lavori / Strassenstrecke mit Arbeiten
- Cantiere / Baustelle
- Nuovo tratto di strada realizzato / Neue realisierten Straße
- Flusso di traffico / Verkehrsfluss
- Flusso di traffico mezzi di cantiere / Verkehrsfluss Baustellenfahrzeuge
- Flusso di traffico a senso unico alternato / Abwechseleinbahnverkehrsfluss
- "New Jersey"
- Recinzione di cantiere in plastica / Umzäunung der Baustelle aus Plastik
- Recinzione di cantiere in metallo / Umzäunung der Baustelle aus Metall
- Recinzione di cantiere in legno / Baustellenschaum
- Accesso mezzi di cantiere - cancelli / Baustelleneinfahrt - Tore
- Lampada di cantiere / Baustellenbeleuchtung
- Regolazione traffico con moviere / Verkehrsleitung durch Streckenposten
- Fische / Fische
- Area interessata dai lavori / Fläche mit Arbeiten
- Reti paramassi esistenti / Existierende Steinschlagschutz
- Nuove reti paramassi / Neue Steinschlagschutz
- Barriere paramassi provvisoria / Provisorische Steinschlagschutz
- Nuove valli paramassi / Neue valli paramassi
- Disboscamenti per nuovi paramassi / Rodungen für neue Steinschlagschutz

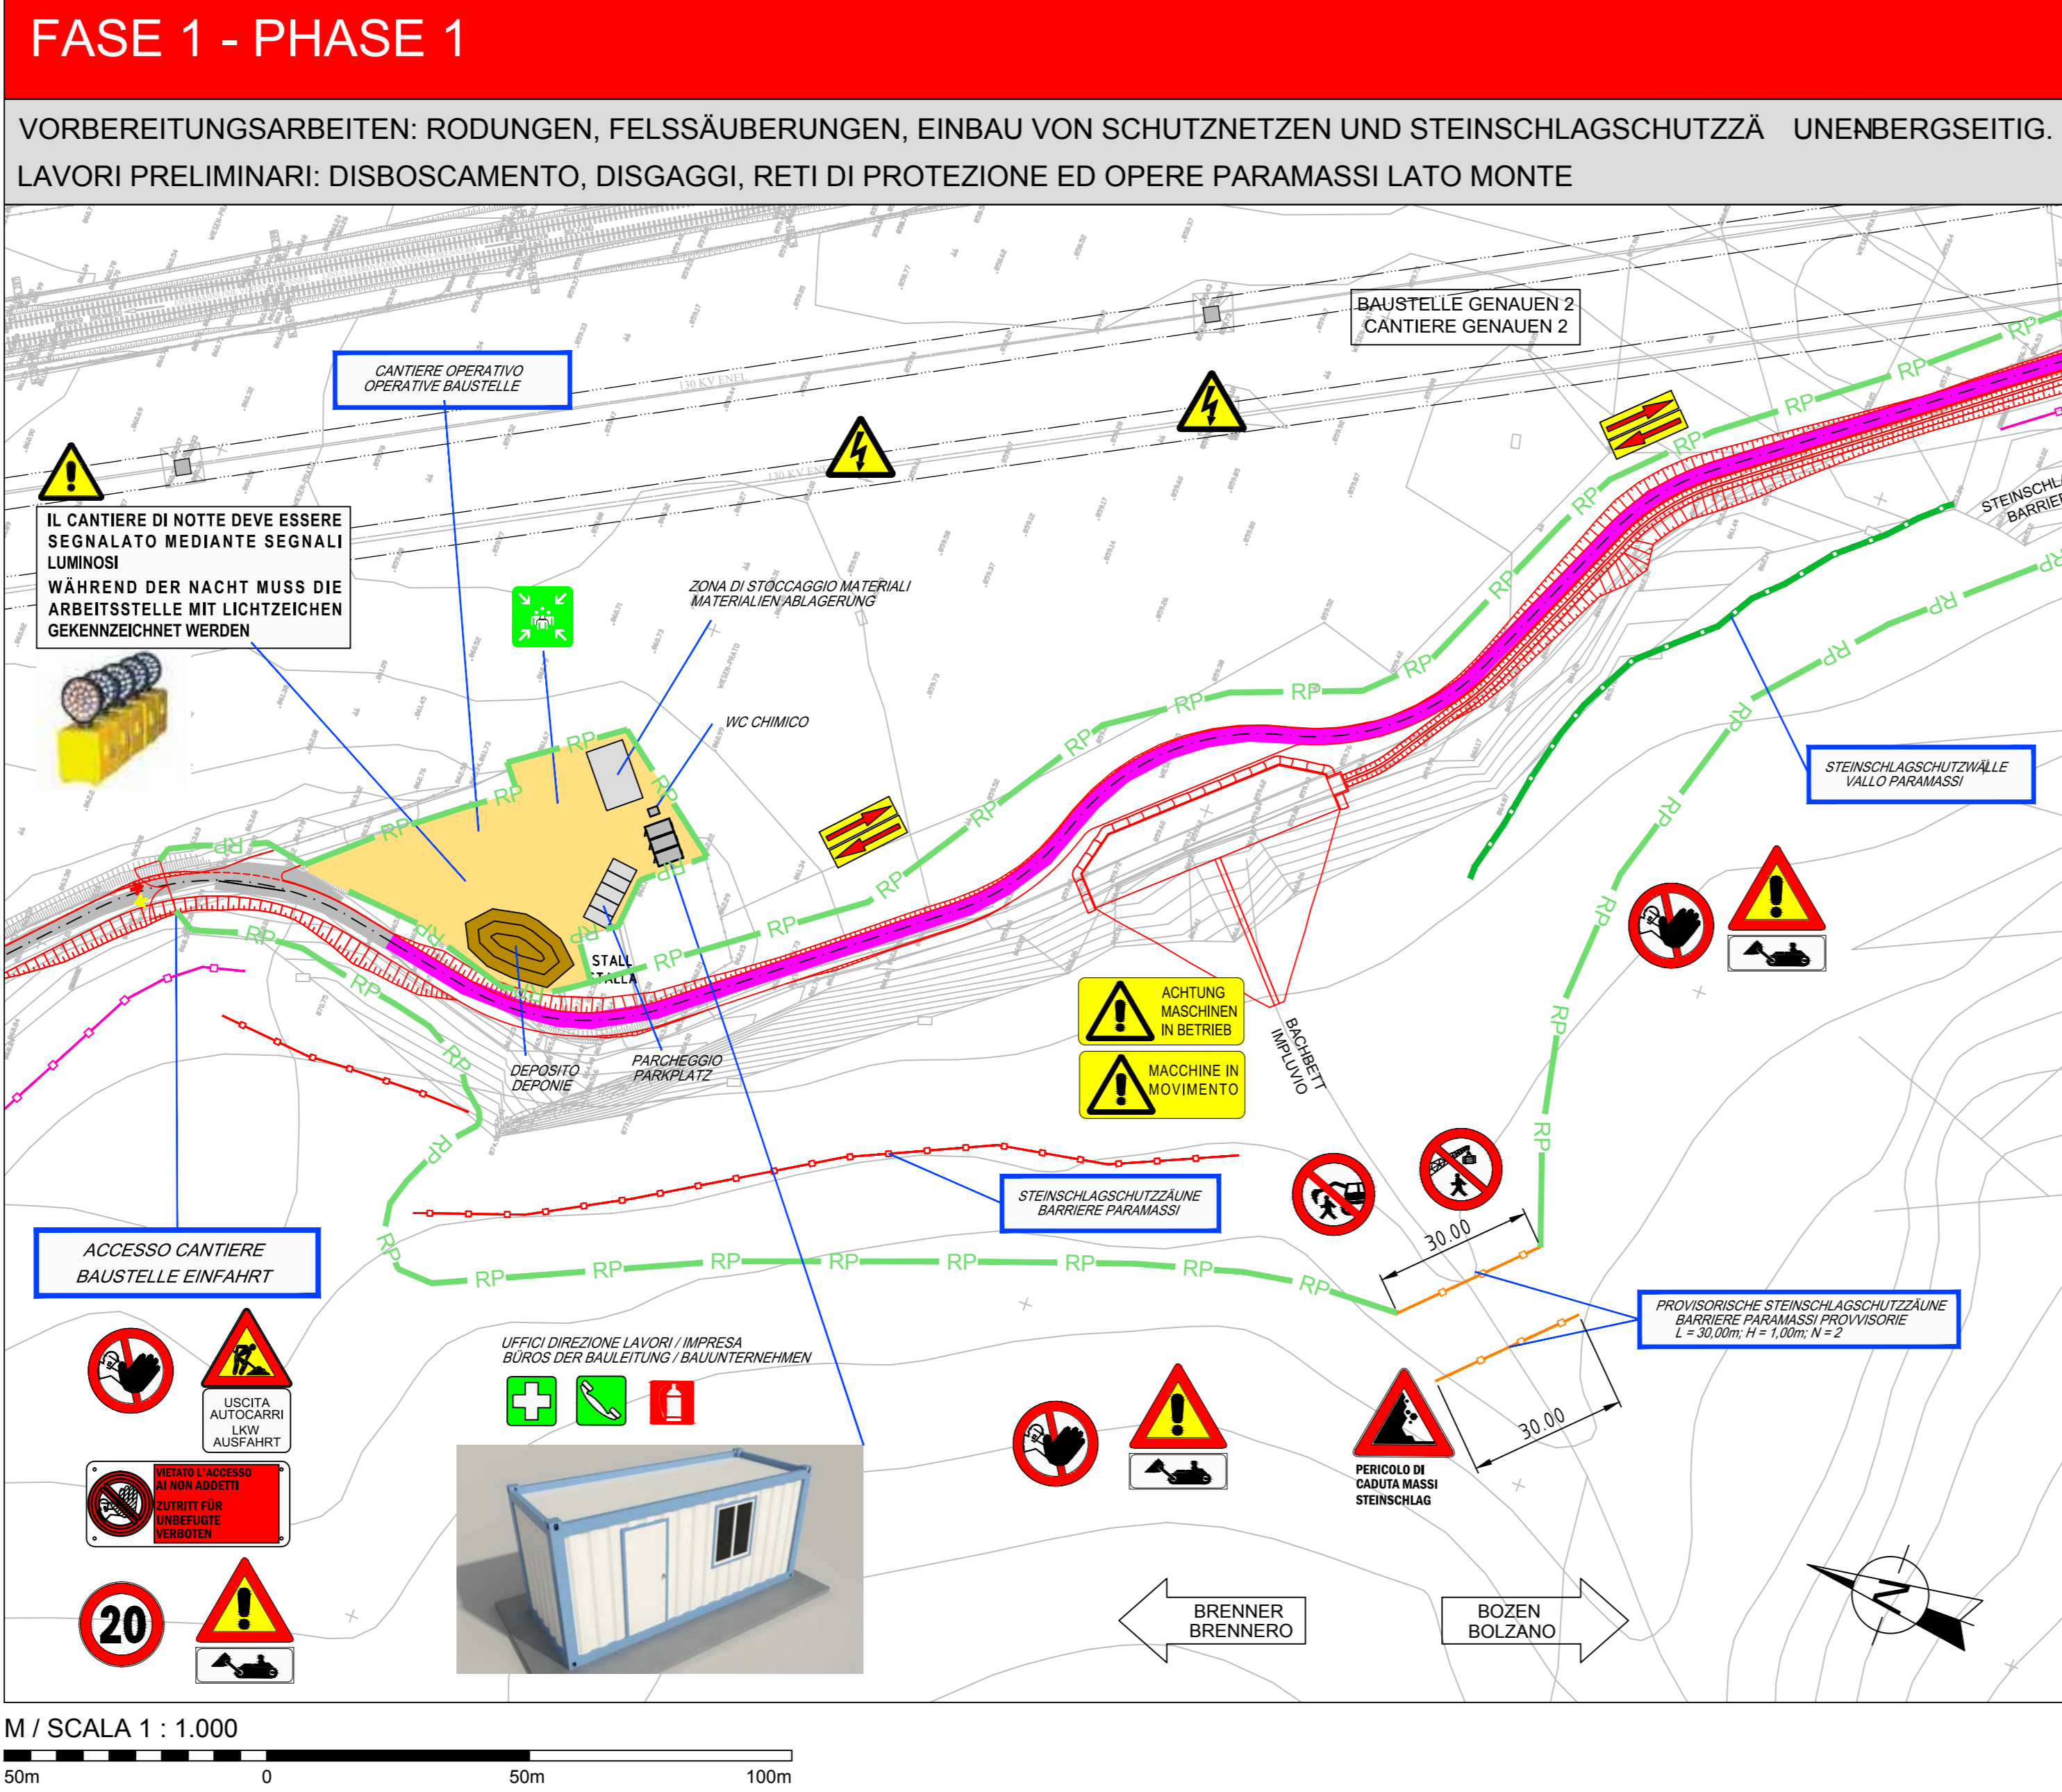

Bezugssystem / Sistema di riferimento:
BBT_TM_WGS84

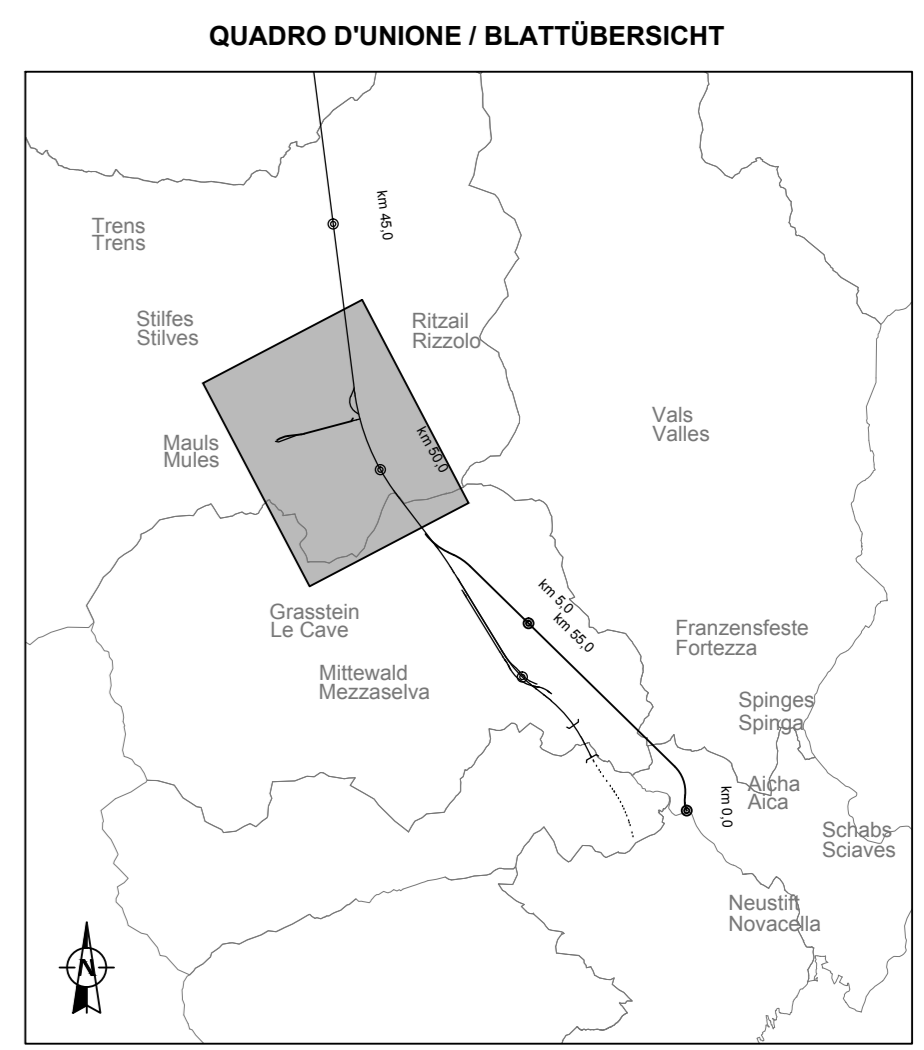

**Referenzdokumente
Documenti di riferimento**

02_H61_SI_550_KSG_D0700_41005	Bericht - Allgemeiner Teil	Relazione - Parte Generale





**Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione**

Revision	Revisione	Änderungen Modifiche	Verantwortliche Änderung Responsabile modifica	Datum Data
00	Estensione / Prima Versione		Mrs	06.06.2014
10	Einstufige / Consiglio Definitivo		Mrs	31.07.2014
11	Festlegung/Bestimmung und Umsetzung der Verbesserungen aus dem Prüfverfahren / Completamento progetto e montaggio situazione		Mrs	08.10.2014
20	Überarbeitung/Änderung/Änderungsbefehl Nr. 1 nach 17.10.2014 / Revisione a seguito OOS n°1 del 17.10.14		Mrs	04.12.2014
21	Abgabe für Ausschreibung/ Emissionen per Appalto		Mrs	30.01.2015

**VERIFICARE LA PRESENZA DI CONDOTTURE ELETTRICHE INTERRATE O DI ALTRI SERVIZI
SICHERSTELLEN, DASS KEINE ELEKTROKUTUNG ODER ANDERE**

Le norme di prevenzione infortuni vietano di eseguire lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza come dalla tabella sotto riportata. L'operatore dovrà fare particolare attenzione nel manovrare il braccio o la benne del mezzo meccanico, per non andare a toccare le linee elettriche aeree.

Un ≤ 1	Distanza minima consentita (metri)
1 <math>< Un \leq 30</math>	3
30 <math>< Un \leq 132</math>	3,5
> 132	5

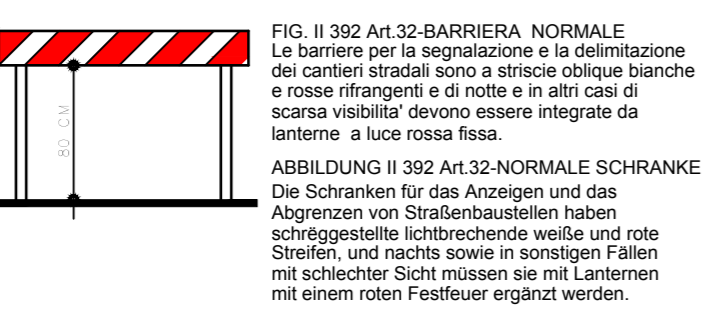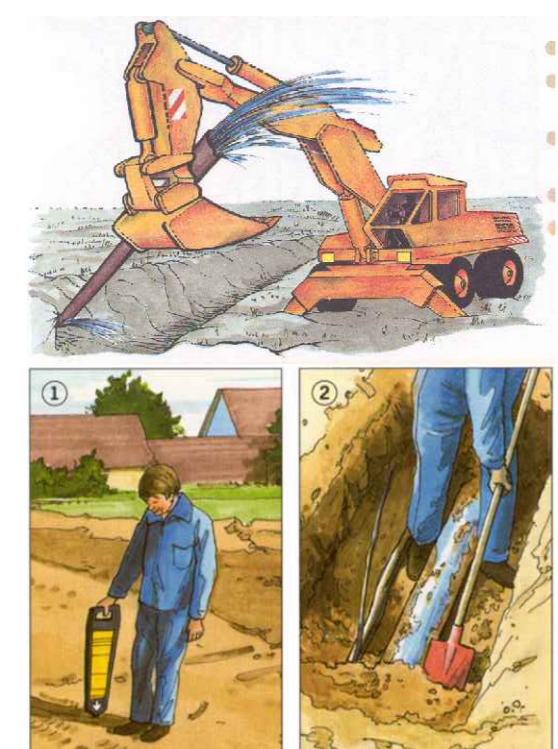

INDOSSARE GILETTE O BRETELLE ARANCIONI FLUORESCENTI ORANGENFÄRBIGE LEUCHTSTOFFWESTEN ODER SICHERHEITSGELBE TRAGEN

IL CANTIERE DI NOTTE DEVE ESSERE SEGNALATO MEDIANTE SEGNALI LUMINOSI WÄHREND DER NACHT MUSS DIE ARBEITSSTELLE MIT LICHTZEICHEN GEBEKENZEICHNET WERDEN

SCAVI / AUSHUBARBEITEN

VIETATO TRANSITARE SENZA PROTEZIONE ACUSTICA / KEIN DURCHGANG OHNE GERÄUSCHSCHUTZ

dBa _____ Hz _____



RISCHIO	Segnali di pericolo	Misure di sicurezza	Segnali di sicurezza
Schaccoamento per fana parete di scavo		Parapetto h. min. 100 cm	
Caduta nello scavo		Non posizionare alcun materiale sul ciglio dello scavo	
Caduta materiali nello scavo		Alfonzare l'ultima cabina autocarro	
Investimento in fase di carico		Effettuare sondaggi con appositi strumenti e contattare i servizi erogatori	
Folgorazione per presenza di linee elettriche aeree			

**CARTELLONISTICA PRESSO L'ACCESSO CANTIERE
RESCHILDERUNG BEI BAUSTELLENEINGANG**

MINIMO 20 CM DI DISTANZA PER IL PASSAGGIO DEI VEICOLI

SCHREIBSCHILDERN CARBONISCHER

ALLENARE LE PERSONE PERSONEN ENTFERNEN

FIG. II 382 Art. 30-TABELLA LAVORI
Pannello da installare in prossimità delle testate del cantiere stradale


ABBLDUNG II 382 Art. 30-ARBEITSTAFEL
In unmittelbarer Nähe der Kopfenden der Straßenbaustelle anzubringende Tafel

Lavori di Attività	Obiettivo	Verifica	Uscita	Tempo

**PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE
ORGANISATORISCHE VORSCHRIFT**

1. Verificare la presenza e la profondità dei sottoservizi prima di ogni intervento non superiore ai 1,50 m.
2. Riscrivere l'area di cantiere con un'apposita recinzione prima di operare. In caso di esecuzione occorre indicare nei pressi del MOVIMENTO DEL MATERIALE PRODOTTI DAL DISGAGGIO POTREBBE INTERESSARE ANCHE AREE SOTTOSTANTI ALLA STRADA, OGGETTO DELLA LAVORAZIONE. IN TAL CASO, DETTE ZONE DEVONO ESSERE PROTETTE DA BARRIERE PROVVISORIE.
3. DURCH DEN BEREICH ANGEGEBENER MATERIALBEREICHEN KÖNNEN AUCH DEN BEREICH UNTERHALB DER STRASSE, AUF DER GEMACHTET WIRD BETRIEBEN. IN DIESER FALL MÜSSEN BEZÜGTE BEREICHE DURCH PROVVISORISCHE STEINSCHLAGSCHUTZWÄNDE ATTENZIONE IN CASO DI PIOGGIA SOSPENSIONE DEI LAVORI E METTERSI AL RIPARO DA EVENTUALI COLATE DETRITICHE

**LAVORI PRELIMINARI:
VORBEREITUNGSARBEITEN:**

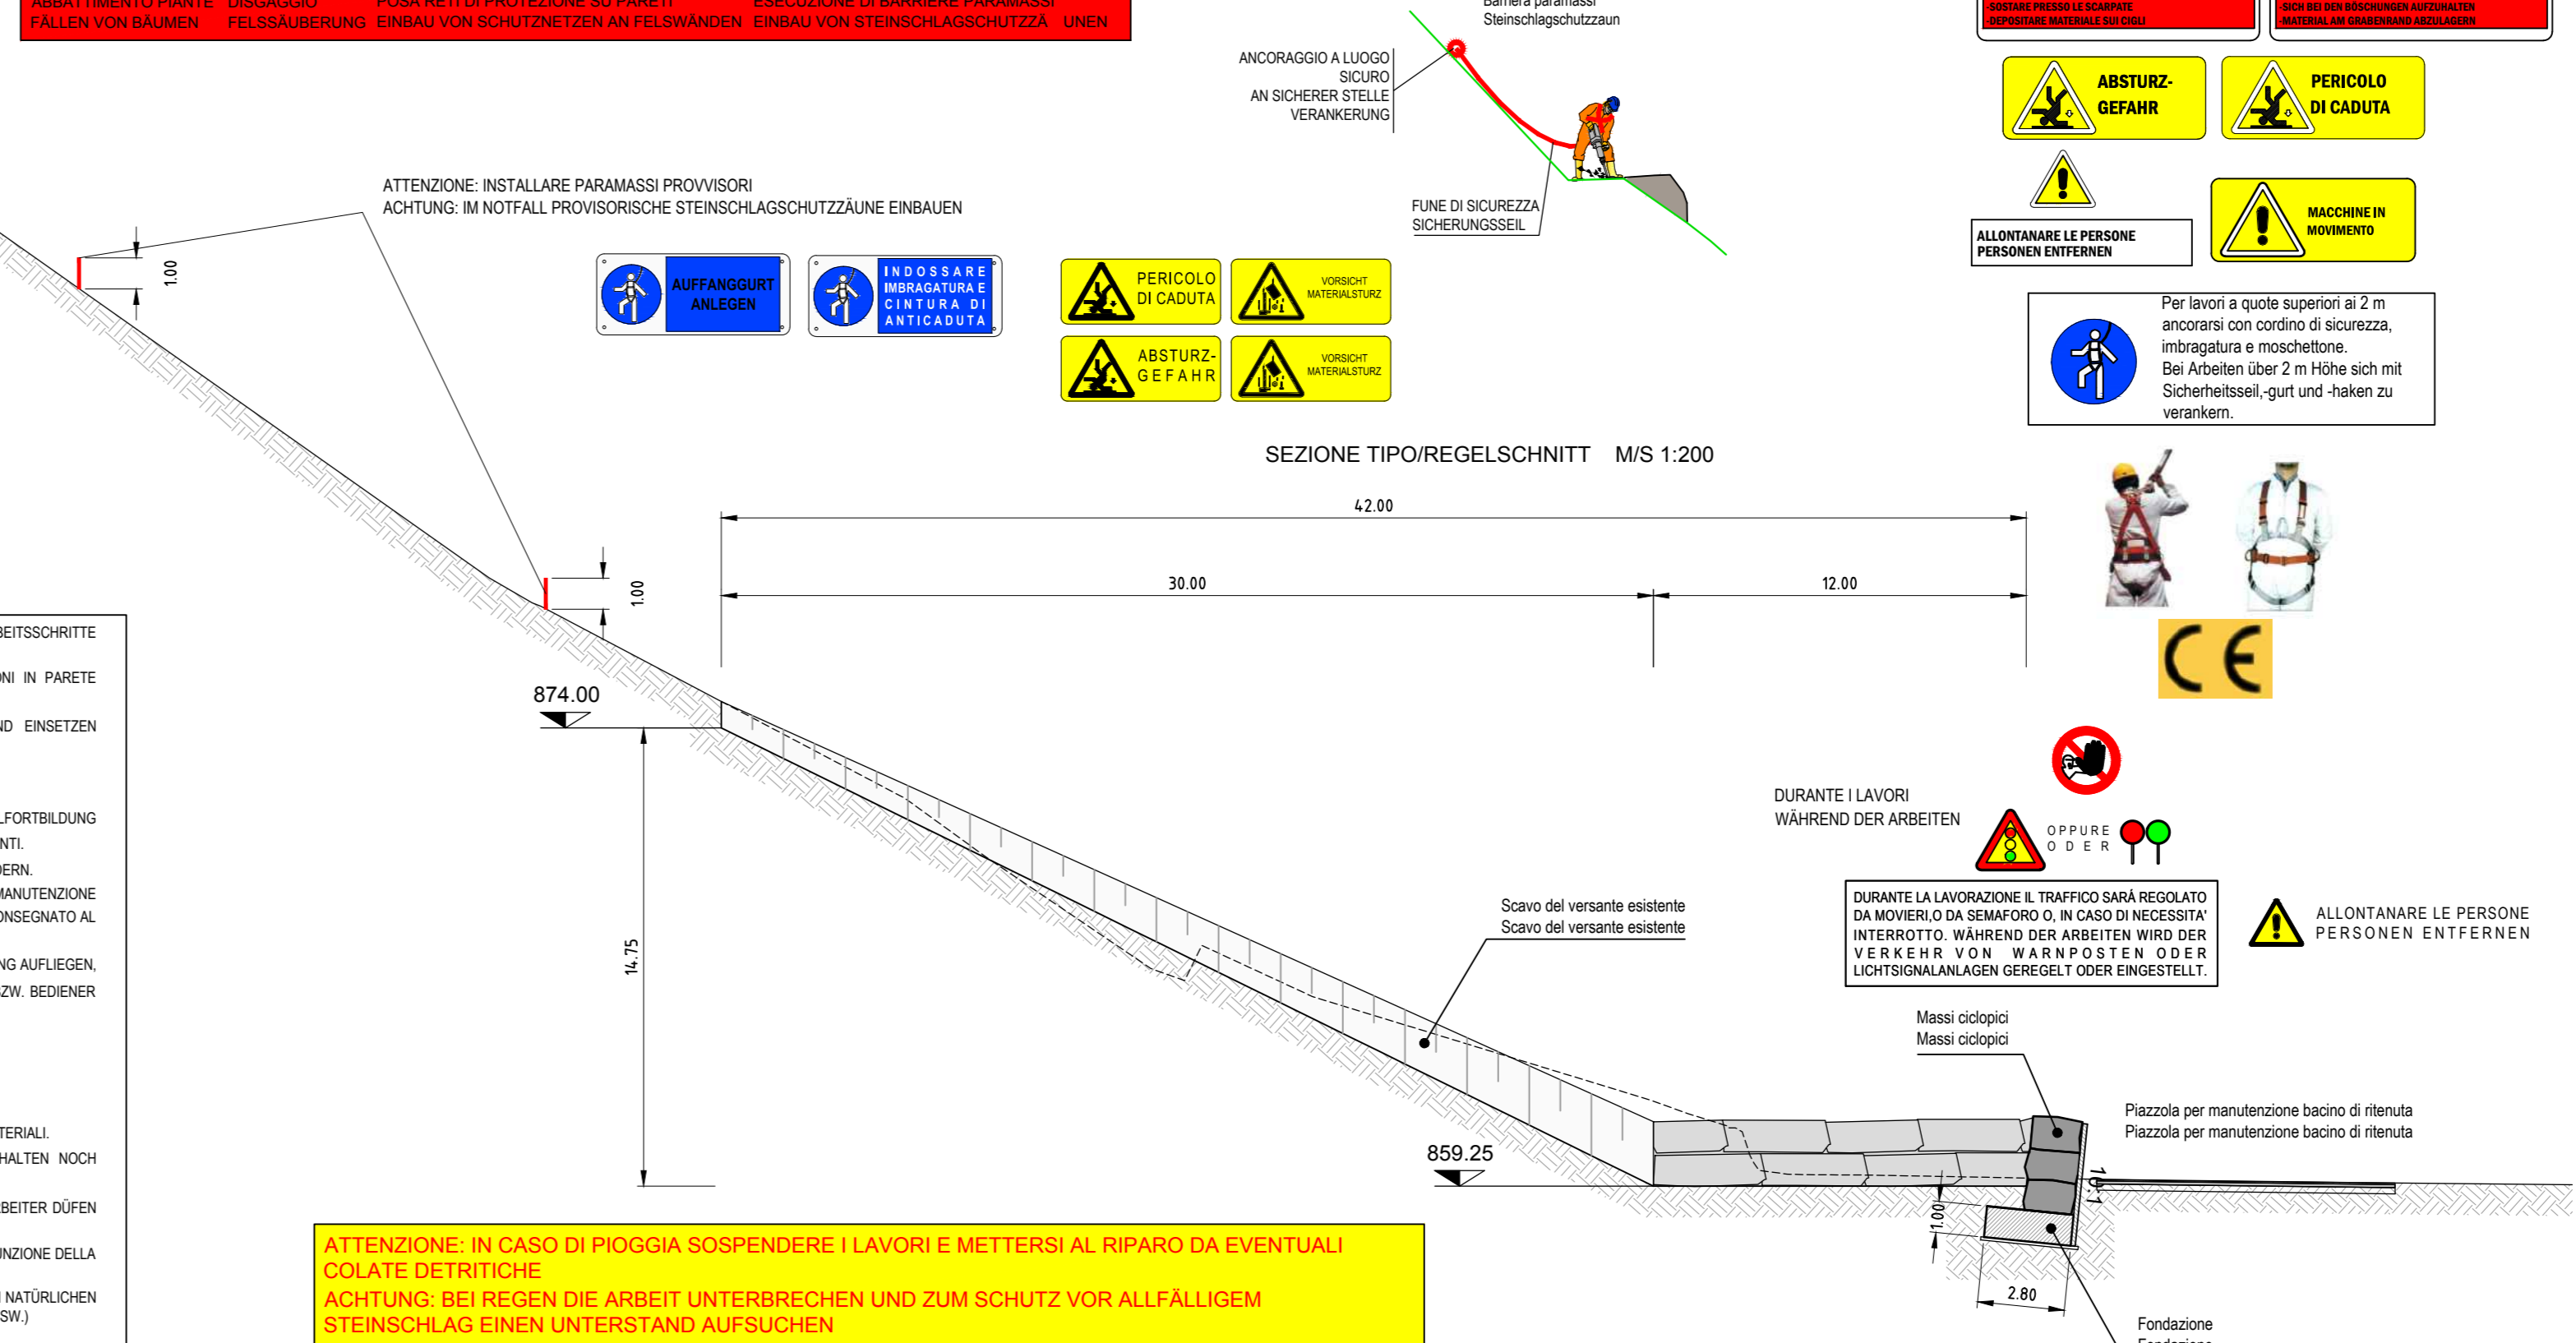

**Ausbau Eisenbahnstrecke München-Vernon
BRENNER BASISTUNNEL
Ausführungslösung**

Potenzialstudie ausse ferroviario Monaco - Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
Projektion exekutiva

D0700: Becken Mauz 2-3	D0700: Lotto Mauz 2-3
Projektarbeit	WBS
Sicherheit	Sicherheit
Documentent	Typo document
SI-Ge-Plan	Elaborator grafico PSC
Titel	Titel
SI-Ge - Bauwerke im Freien - Baustelle Genauen 2	CSP - Opere all'aperto - Cantiere Genauen 2
Bauphasentageplan Murbecken	Planimetria fasi costruttive bacino ritenuta

RT4P
PRQ
POYRY
BBT

Projekt: un/ta: 32-2488
Autor: ba/a: SA-D-15
Charakter: projekt
Datum: 30.01.2015
Ursprung: ba/a: 1
Charakter: projekt
Datum: 30.01.2015
Ursprung: ba/a: 1

Name / Nome: R. Zurlo
Name / Nome: K. Bergmeister

Scale: 1:1.000 - 1:200

02 H61 SI 550 KSI D0700 44020 21
