




**MACROFASE 1 - DURATA: 27 MESI**

1)	Allestimento cantieri
2)	Realizzazione impianto di depurazione acque
3)	Realizzazione argine di contenimento provvisorio, piattaforme temporanee jet-grouting, ture, setti in jet-grouting, protezione fondo alveo
4)	Realizzazione pozzi PO-BPN, PO-BDN, PO-BPS, PO-BDS
5)	Consolidamento da p.c.: GBBPN, GA-BPS1, GA-BDS1; GBBPS (da pk 55+018 a pk 55+058); GBIPS (da pk 1+849,21 a pk 2+025); GABY2
6)	Scavo gallerie: GN-IPS (da pk 2+197 a pk 1+850); cunicolo di soccorso NA4 e cunicolo integrativo NA4: GN-BDS1 (da pk 55+060 a pk 55+140); GNBYS; GN-BPN (da pk 54+988,85 a pk 54+510); GN-BPI; GN-IP1 (consolidamento)
7)	Realizzazione gallerie artificiali: GA-BDS1; GA-BPS1
8)	Spostamento linea storica: scavo trincea, realizzazione opere di sostegno e sottopasso ferroviario
9)	Realizzazione interventi di protezione dei versanti


**LEGENDA / LEGENDE**

- Scavo all'aperto o in sotterraneo
- Consolidamento con Jet-grouting
- Opera completata nelle fasi precedenti
- Consolidamento completato nelle fasi precedenti
- Spostamento linea storica
- Spostamento linea storica completato nelle fasi precedenti
- Ritombamenti
- Ripristini aree di cantiere - Riconfigurazione morfologica
- ➔ Direzione di avanzamento scavo



**Bearbeitungsstand**  
**Stato di elaborazione**

Revisione	Revisioni	Aλλαγungen / Modifiche	Verantwortlicher Änderung / Responsabile modifica	Datum / Data
00	Entwurf / Prima Versione		N. Tondis	31.07.2015
01	aktualisierung / Aggiornamento		N. Tondis	06.08.2015
02	Anmerkungen BBT / Osservazioni BBT		N. Tondis	30.11.2015
03	Anmerkungen BBT vom 15.12.2015 / Osservazioni BBT del 15.12.2015		N. Tondis	14.01.2016
04				
05				

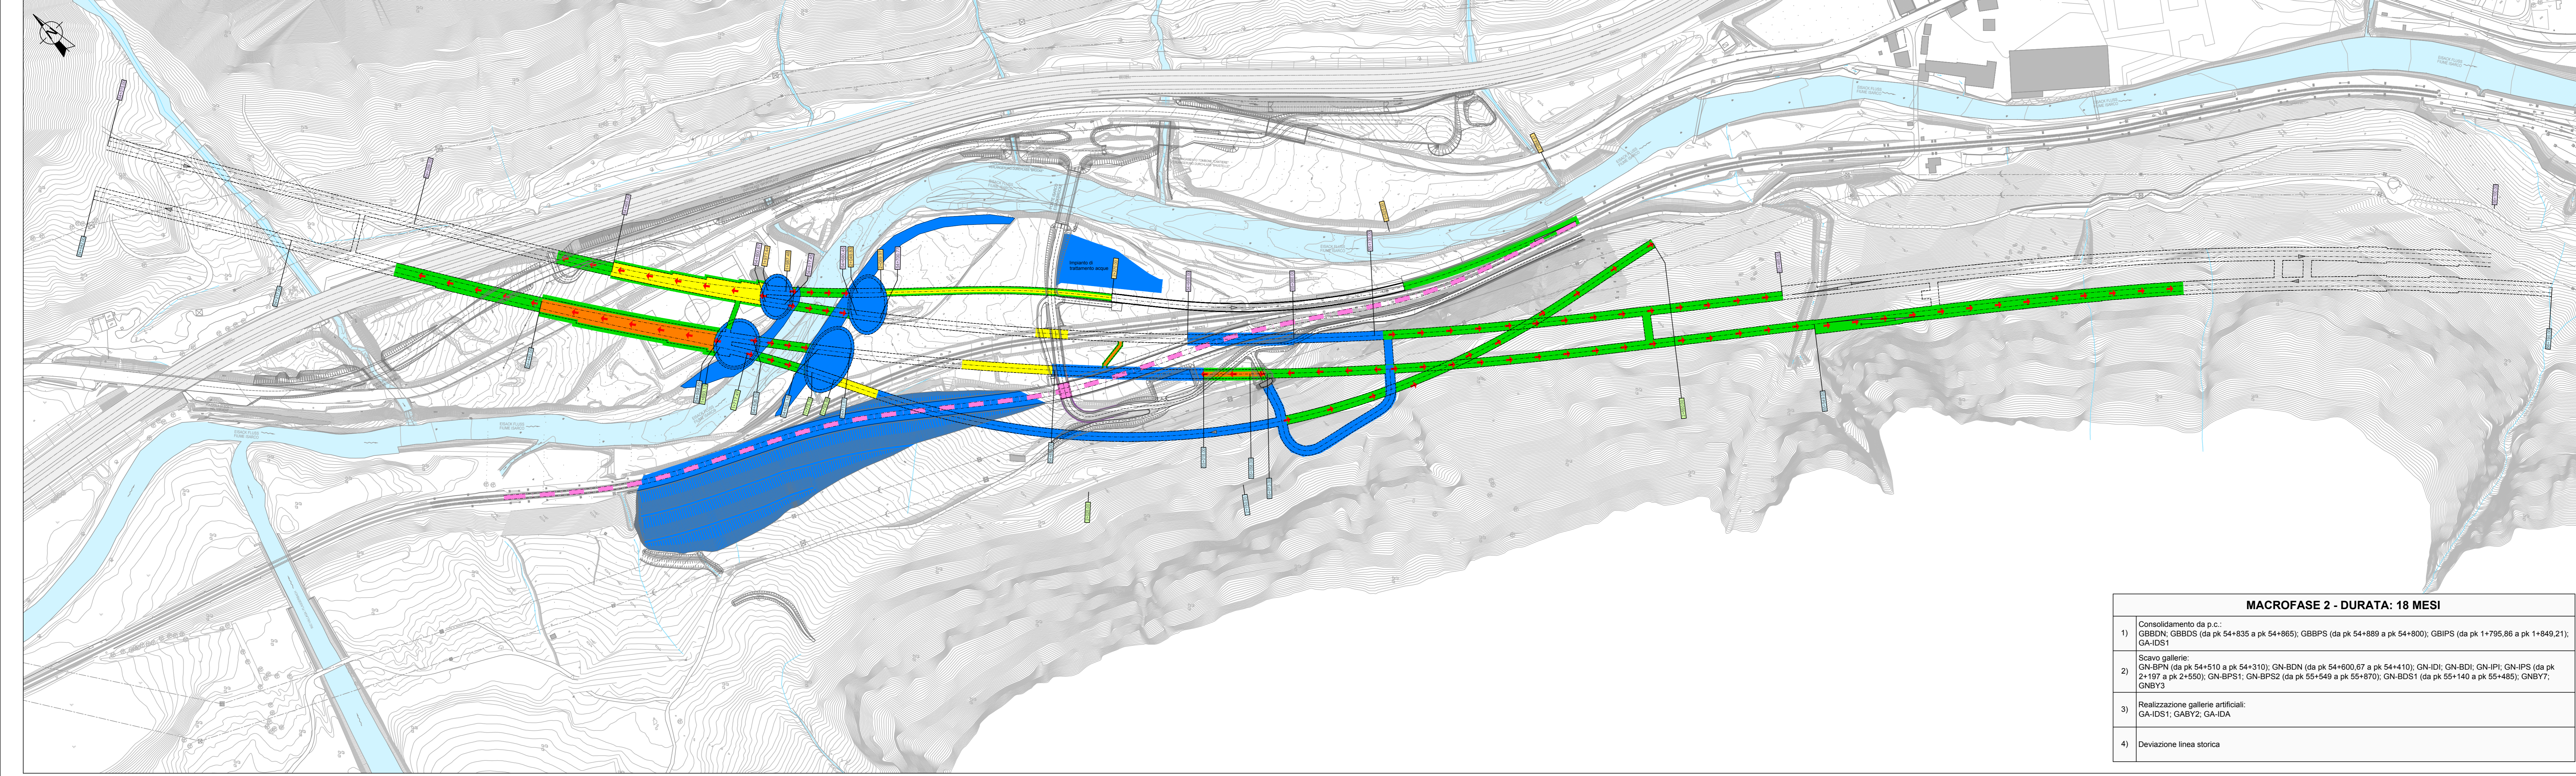

**MACROFASE 2 - DURATA: 18 MESI**

1)	Consolidamento da p.c.: GBBDN; GBBDS (da pk 54+835 a pk 54+865); GBBPS (da pk 54+889 a pk 54+900); GBIPS (da pk 1+795,86 a pk 1+849,21); GA-ID51
2)	Scavo gallerie: GN-BPN (da pk 54+510 a pk 54+310); GN-BDN (da pk 54+600,87 a pk 54+410); GN-IDI; GN-BDI; GN-IP1; GN-IPS (da pk 2+197 a pk 2+550); GN-BPS1; GN-BPS2 (da pk 55+549 a pk 55+870); GN-BDS1 (da pk 55+140 a pk 55+485); GNBYS; GNBYS3
3)	Realizzazione gallerie artificiali: GA-ID51; GABY2; GA-IDA
4)	Deviazione linea storica

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transnationalen Verkehrsinfrastruktur

**Ausbau Eisenbahnstrecke München-Verona**  
**BRENNER BASISTUNNEL**  
Ausführungsprojekt

*Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona*  
**GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO**  
Progetto esecutivo

---

**Sub-Baulos Hauptbauwerke Eisackunterquerung**  
**Sublotto di costruzione Opere Principali Sottoattraversamento Isarco**

Fachbereich	Seltore
10 - Baulegistik	10 - Logistica di cantiere
Thema	Tema
Baustelleneinrichtung	Area di cantiere
Dokumententyp	Planimetria
Lageplan	Planimetria
Titel	Titolo
Hauptbauphasen 1 und 2	Macrofasi costruttive 1 e 2

---

	Bearbeitung des Dokument / Elaborazione del documento Datum / Data 14.01.2016	Geprüft / Verificato Datum / Data 14.01.2016
Bearbeiter / Elaborata Datum / Data 14.01.2016	Geprüft / Verificato Datum / Data 14.01.2016	Geprüft / Verificato Datum / Data 14.01.2016

---

Projekt / km	von / da	54+015	Bau / km	von / da	55+100	Status / Documento / Stato	1:2.000
Chilometro / miglio	km / a	55+100	Chilometro / miglio	km / a	55+100	1:2.000	

---

Blatt / foglio	02	Lot / lotto	H71	Exemplar / numero	AF	002	Fachbereich / settore	10	Thema / tema	02	ID / numero	013.01	Vertrag / contratto	B0115	Numero / numero	00581	Objekt / oggetto	1A6	Rev. / rev.	03
----------------	----	-------------	-----	-------------------	----	-----	-----------------------	----	--------------	----	-------------	--------	---------------------	-------	-----------------	-------	------------------	-----	-------------	----
