


ID	Nome attività	Durata	28 set 15			12 ott 15			26 ott 15			09 nov 15			23 nov 15					
			D	G	L	V	M	S	M	D	G	L	V	M	S	M	D	G	L	V
1	MURO TERRA RINFORZATA TR22	39 g																		
2	scavo	1 g																		
3	posa di materiale per bonifica piano di posa	2 g																		
4	posa drenaggi	1 g																		
5	rinterro	35 g																		
6																				
7	MURO PREFABBRICATO MU25	13 g																		
8	scavo fondazione	1 g																		
9	getto magrone	1 g																		
10	posa pannelli	1 g																		
11	armatura fondazioni	1 g																		
12	getto fondazioni	1 g																		
13	posa drenaggi	1 g																		
14	rinterro	7 g																		

Progetto: 16.02.08 cronoprogram Data: mar 09/02/16	Attività		Riepilogo progetto		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Scadenza	
	Divisione		Attività esterne		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Avanzamento	
	Cardine		Cardine esterno		Attività manuale		Solo inizio			
	Riepilogo		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine			

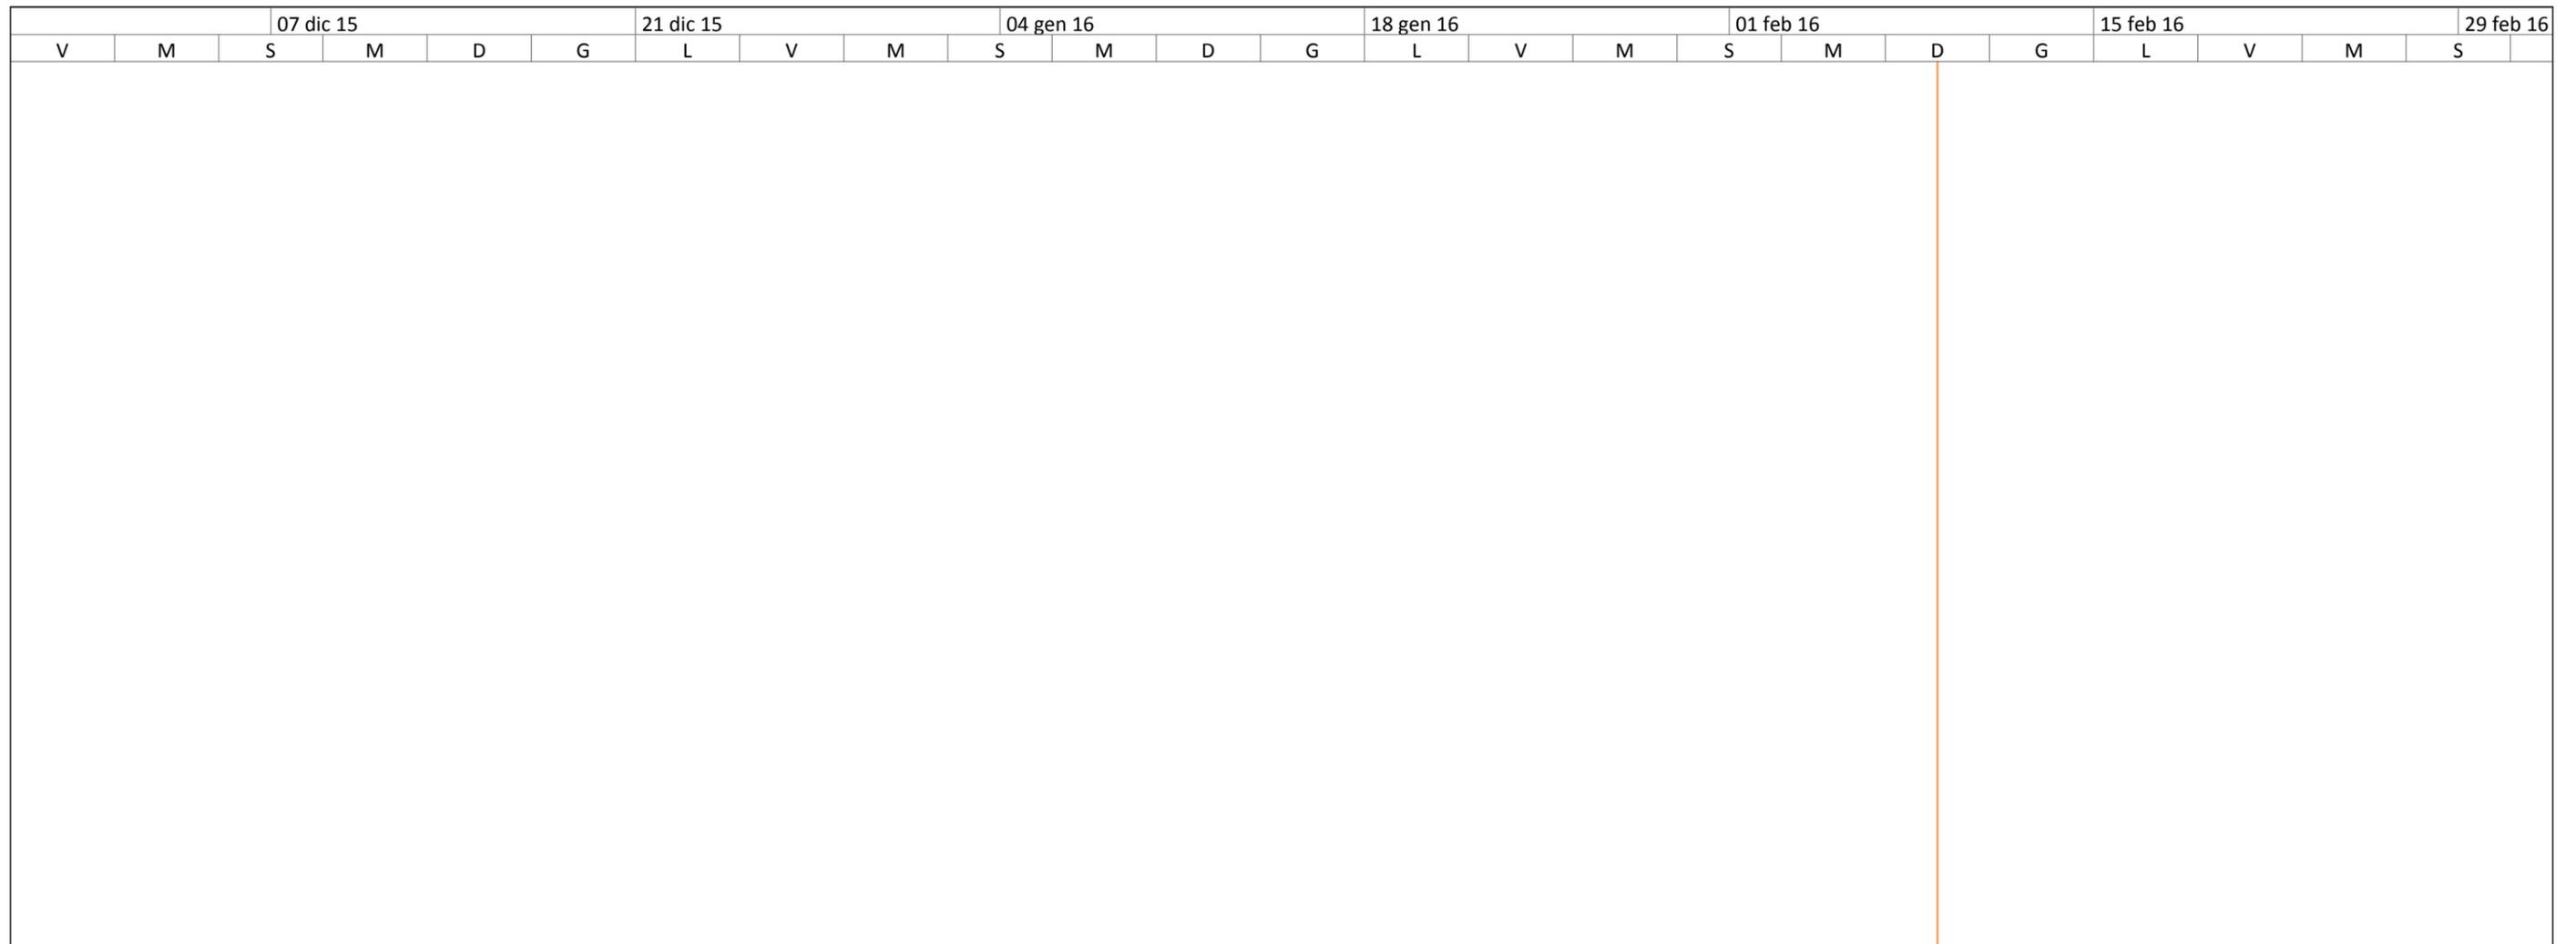

Progetto: 16.02.08 cronoprogram Data: mar 09/02/16	Attività		Riepilogo progetto		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Scadenza	
	Divisione		Attività esterne		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Avanzamento	
	Cardine		Cardine esterno		Attività manuale		Solo inizio			
	Riepilogo		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine			
