


AREA DI CANTIERIZZAZIONE 5: 1° FASE  
Scala: 1:500

**1° FASE:**

- 1) CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA VERDI DALL'IMBOCCATURA A NORD-EST DEL SOTTOPASSO A VIA E. RAGGI. DEVIAZIONE DEL TRAFFICO STRADALE AL SOTTOPASSO DI VIA MAZZINI
- 2) INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE DI CANTIERE VERTICALE. INDICAZIONE PERCORSO ALTERNATIVO PASSAGGIO SOTTOPASSO DI VIA MAZZINI.
- 3) POSIZIONAMENTO DI BARRIERE NEW JERSEY E RECINZIONE DI CANTIERE.
- 4) PREPARAZIONE AREA DI CANTIERE.
- 5) REALIZZAZIONE PALI TRIVELLATI Ø 600 mm.
- 6) REALIZZAZIONE FONDAZIONI E MANUFATTO IN ELEVAZIONE ALL'INTERNO DELL' AREA DI CANTIERE.

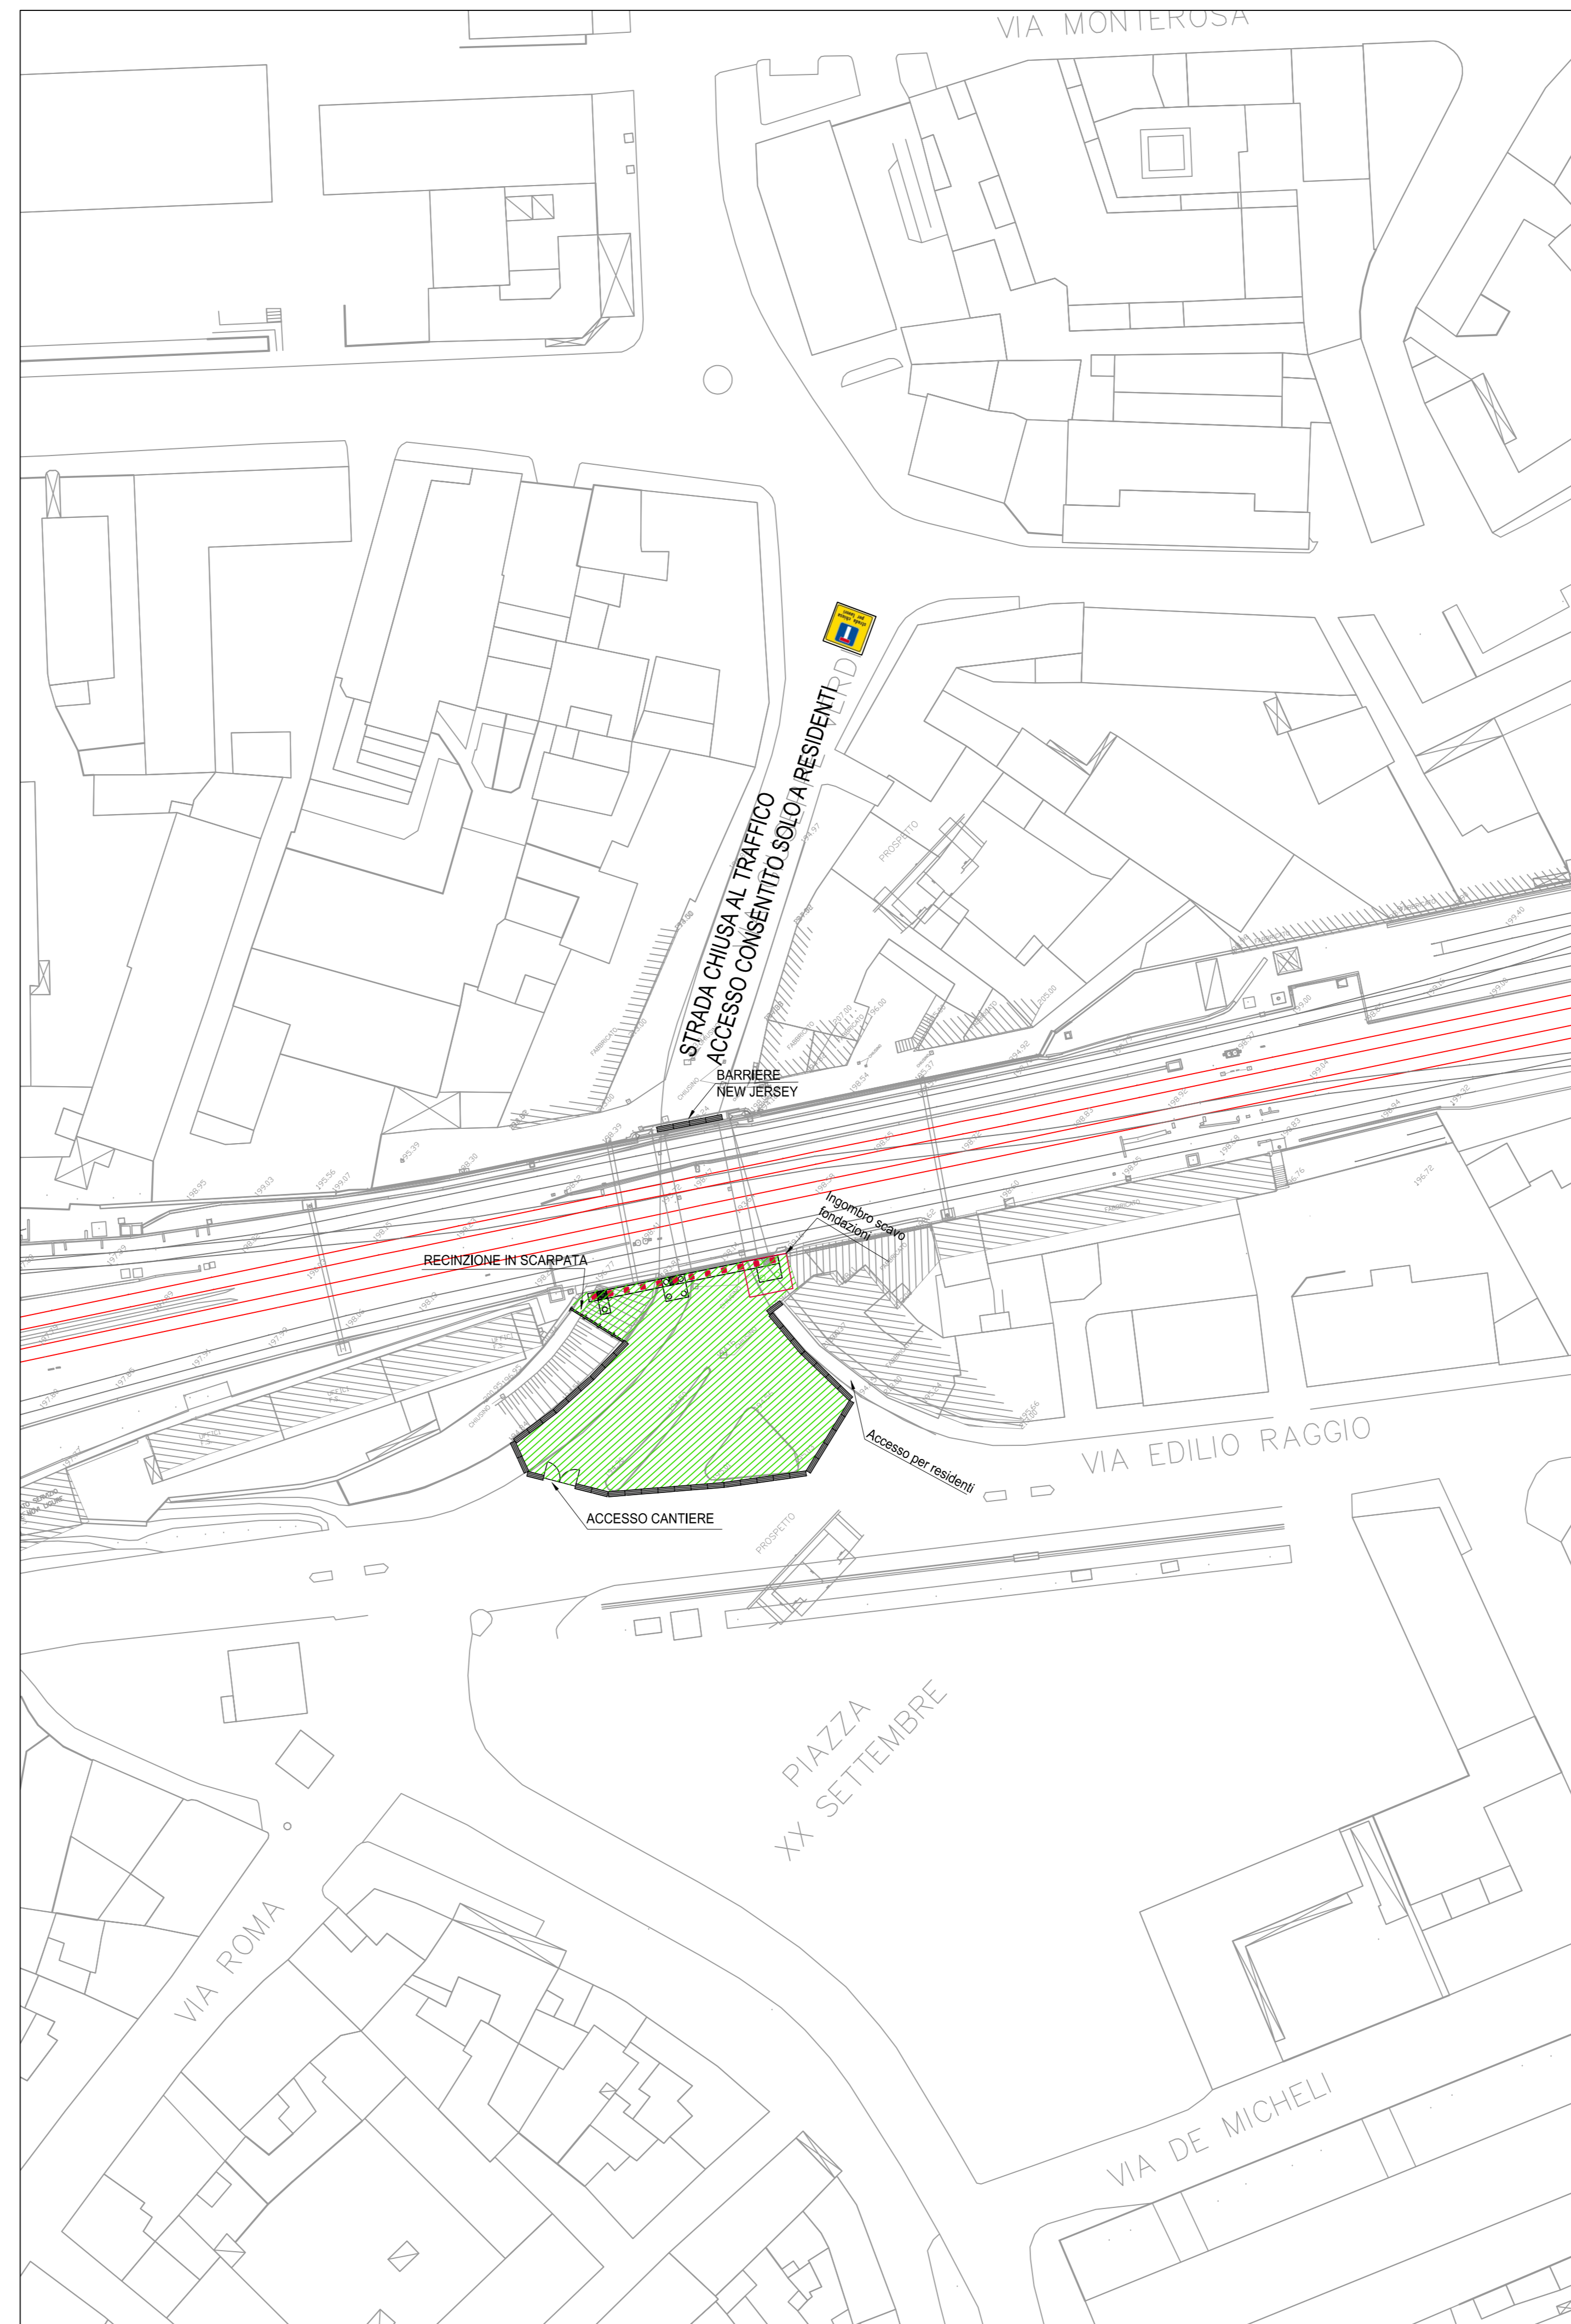

AREA DI CANTIERIZZAZIONE 5: 2° FASE  
Scala: 1:500

**2° FASE:**

- 1) RIPOSIZIONAMENTO DI BARRIERE NEW JERSEY E RECINZIONE DI CANTIERE NEL LATO SUD.
  - 2) PREPARAZIONE NUOVA PORZIONE DI CANTIERE.
  - 3) REALIZZAZIONE PALI TRIVELLATI Ø 600 mm.
  - 4) REALIZZAZIONE FONDAZIONI E MANUFATTO IN ELEVAZIONE ALL'INTERNO DELL' AREA DI CANTIERE.
  - 5) POSA DELLE BARRIERE ANTIRUMORE.
  - 6) SMANTELLAMENTO AREA DI CANTIERE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI.
  - 7) RIAPERTURA AL TRAFFICO DI VIA VERDI.
- DURATA MASSIMA PREVISTA: 1 MESE

**PERCORSO ALTERNATIVO**

Scala: 1:2000



**LEGENDA**

- FASE 1
- FASE 2
- STRADA CHIUSA AL TRAFFICO DURANTE I LAVORI
- PERCORSO ALTERNATIVO DURANTE I LAVORI

COMMITTENTE: **RFI**  
RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA: **ITFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR: **COCIV**  
Consorzio Costruttori Integrati Valchi

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI  
PROGETTO DEFINITIVO

INTERCONNESSIONE DI NOVI LIGURE ALTERNATIVA ALLO SHUNT  
BARRIERE ANTIRUMORE NUOVA INTERCONNESSIONE LINEA STORICA DA PK 106+689 A PK 113+687.220  
CANTIERIZZAZIONE  
AREA DI CANTIERE 5

GENERAL CONTRACTOR		DIRETTORE LAVORI		SCALA:				
Consorzio <b>Cociv</b> Ing. E. Pignatelli				1:500				
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAZIONE			
A301	00	D	CV	P8	BAVC00			
PROGR.	REV.							
004	A							
PROGETTAZIONE								
Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista	Data	IL PROGETTISTA
ADD	Prima emissione	AE	27/07/2016	COCV	27/07/2016	A. Mancarella	27/07/2016	
						Dip. Imp. e Qualità C/O Imp. e Qualità n. 6271 R		

N. Em: \_\_\_\_\_ Nota File: X31-000-CV16-BAC-00-004-00  
CUP: F81H600000000000
