

# AEROPORTO LEONARDO DA VINCI DI FIUMICINO - ROMA

## Progetto di completamento Fiumicino Sud



### Procedura di Verifica di ottemperanza al Decreto n° 236/13 Fase Stralcio Secondo

Progetto 19 - Sistema aerostazioni lato est - Opere di completamento delle infrastrutture landside e airside del sottosistema lato Est: lotto 1 secondo e terzo stralcio strutture, involucro, finiture ed impianti Area Imbarco A ed Avancorpo del Terminal 1

## STUDIO DEGLI IMPATTI DI CANTIERE

### RELAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DI CANTIERE

#### IL PROGETTISTA SPECIALISTICO

Ing. Luisa Bazzicalupo  
Ord. Ingg. ROMA n. 22685

#### IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Luisa Bazzicalupo  
Ord. Ingg. ROMA n. 22685

CAPO PROGETTO

#### IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Maurizio Torresi  
Ord. Ingg. Milano N.16492

RESP. COORDINAMENTO TECNICO E PROGETTI

RIFERIMENTO PROGETTO										RIFERIMENTO DIRETTORIO										RIFERIMENTO ELABORATO				Ordinatore:			
Codice	Commessa	Lotto, Sub-Prog. Cod. Appalto	Fase	Capitolo	Paragrafo	WBS tipologia	WBS progressivo	PARTE D'OPERA			Tip.	Disciplina	Progressivo	Rev.													
A	783T8			D	G	G	E											R	G	E	N	0	7	0	5	1	—
														SCALA:				—									

 <b>gruppo Atlantia</b>	RESPONSABILE DIVISIONE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI: <b>Arch. Maurizio Martignago</b>		RESPONSABILE UNITA' PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE DI VOLO <b>Ing. Gregorio Ulini</b>		SUPPORTO SPECIALISTICO: —		REVISIONE	
	n.		data					
	0		APRILE 2017					
	1		GIUGNO 2017					
	2							
3								
4								
REDATTO:				VERIFICATO:				

Visto del Committente: <b>Aeroporti di Roma S.p.A.</b>		RIFERIMENTI COMMITTENTE: rif. WBS: DSA.011/14.A8   rif. Incarico: 9/6/2016 U0012640	
IL RESPONSABILE DELL'INIZIATIVA  Ing. Giorgio Gregori DIREZIONE SVILUPPO INFRASTRUTTURE	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  —	IL POST HOLDER PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E SISTEMI Ing. Paolo Cambula	



## INDICE

<b>1</b>	<b>STRUTTURA DEL DOCUMENTO</b>	<b>4</b>
<b>SEZIONE I METODOLOGIA UNITARIA PER L'ANALISI DELLA CANTIERIZZAZIONE</b>		
<b>2</b>	<b>INTRODUZIONE</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>L'OPPORTUNITA' DI UNA METODOLOGIA UNITARIA</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>GLI OBIETTIVI E LA METODOLOGIA DI LAVORO</b>	<b>6</b>
4.1	GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE	6
4.2	METODOLOGIA DI LAVORO	7
4.3	LA STRUTTURA	8
4.3.1	<i>Aspetti generali</i>	8
4.3.2	<i>Le schede progettuali</i>	10
4.3.3	<i>Lo screening ambientale generale</i>	12
4.3.4	<i>Le schede ambientali</i>	13
<b>SEZIONE II METODOLOGIA SPECIFICA ED ANALISI DEGLI IMPATTI DELLA CANTIERIZZAZIONE DEL SISTEMA AEROSTAZIONI LATO EST -OPERE DI COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LAND SIDE ED AIR SIDE, LOTTO 1 – SECONDO E TERZO STRALCIO STRUTTURE, INVOLUCRO, FINITURE ED IMPIANTI AREA IMBARCO A ED AVANCORPO DEL TERMINAL 1</b>		
<b>5</b>	<b>INTRODUZIONE</b>	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>LA FASE DI DEFINIZIONE</b>	<b>16</b>
6.1	ASPETTI PROGETTUALI	16
6.1.1	<i>Individuazione delle lavorazioni</i>	16
6.1.2	<i>Le schede progettuali</i>	18
6.2	SCREENING AMBIENTALE	39
6.2.1	<i>Lo screening ambientale specifico</i>	38
6.2.2	<i>Le schede ambientali</i>	39
6.2.3	<i>Sintesi dello screening ambientale specifico</i>	77
<b>7</b>	<b>L'ANALISI DEGLI EFFETTI</b>	<b>78</b>
7.1	ATMOSFERA	78
7.1.1	<i>Introduzione e metodologia</i>	78
7.1.2	<i>Il software utilizzato: Aermod View</i>	79
7.1.3	<i>Gli input territoriali</i>	82
7.1.4	<i>Gli input progettuali</i>	86
7.1.5	<i>Risultati delle simulazioni</i>	91
7.1.6	<i>Conclusioni</i>	93
7.2	RUMORE	94
7.2.1	<i>Introduzione e metodologia</i>	94
7.2.2	<i>Il software di simulazione soundplan</i>	95
7.2.3	<i>I limiti normativi</i>	97
7.2.4	<i>I parametri territoriali</i>	97
7.2.5	<i>I parametri progettuali</i>	98
7.2.6	<i>Definizione degli scenari più significativi</i>	99
7.2.7	<i>Risultati delle simulazioni</i>	101
7.2.8	<i>Conclusioni</i>	103
7.3	VIBRAZIONI	104
7.4	AMBIENTE IDRICO	104

7.5 SUOLO..... 105

## **1 STRUTTURA DEL DOCUMENTO**

La presente relazione è finalizzata all'analisi degli impatti sull'ambiente indotti dalla realizzazione dell'intervento "Sistema aerostazioni lato Est – Lotto 1 – Secondo e Terzo stralcio – Strutture, Involucro, Finiture ed Impianti - Area di imbarco A; Avancorpo T1" previsto nell'ambito del Progetto di completamento di Fiumicino Sud.

Da tale analisi discende la valutazione circa l'eventuale necessità di prevedere opere di mitigazione.

Il metodo di lavoro utilizzato è suddiviso in due diversi livelli di approfondimento a cui corrispondono le due sezioni di analisi, rispettivamente Sezione I Metodologia unitaria per l'analisi della cantierizzazione e Sezione II Metodologia specifica ed analisi degli impatti della cantierizzazione delle opere di progetto.

Nello specifico pertanto la Sezione I definisce un riferimento unitario sulle attività di cantierizzazione al fine di poter avere una linea guida metodologica applicabile nelle analisi degli stralci progettuali.

La Sezione II è volta all'analisi specifica degli effetti indotti dalla cantierizzazione, ovvero dalla realizzazione delle opere di progetto.

**SEZIONE I  
METODOLOGIA UNITARIA PER L'ANALISI DELLA  
CANTIERIZZAZIONE**

## **2 INTRODUZIONE**

Obiettivo della presente sezione è quello di fornire un riferimento unitario metodologico sulle attività di cantierizzazione e sulle analisi ambientali ad essa relative.

Verranno quindi forniti gli elementi generali di strutturazione delle analisi che saranno dettagliate, specificatamente per nella realizzazione delle opere di progetto nell'ambito degli interventi di completamento delle infrastrutture land side ed air side del sottosistema aerostazioni lato est, nella sezione successiva.

## **3 L'OPPORTUNITA' DI UNA METODOLOGIA UNITARIA**

Nel DM 236 dell'8 agosto 2013, con cui è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni sul Progetto di completamento di Fiumicino sud, sono inserite alcune prescrizioni relative alla cantierizzazione e agli impatti ad essa connessi e specificatamente queste prescrizioni fanno riferimento al punto A3.

All'interno dell'ampia tematica, che comprende molteplici aspetti che vanno dal bilancio dei materiali, alla gestione degli stessi, si vuole in questa sede fare specifico riferimento ai potenziali impatti ambientali che la realizzazione delle opere può indurre.

In particolare nel citato decreto, alla prescrizione A3, è indicato che *“il proponente dovrà redigere prima dell'inizio dei lavori di ciascun lotto una relazione di aggiornamento sui sistemi di cantierizzazione, riguardante tutte le fasi dei lavori e da porre in verifica di ottemperanza al MATTM che, oltre a confermare l'adozione delle misure operative a minor impatto ambientale, definisca in modo particolare:*

*a. Approfondimenti puntuali di tutte le misure di mitigazione ambientale previste nello SIA, (...).”*

Sebbene si proceda come indicato, e cioè impostando la progettazione esecutiva per lotti funzionali e considerando quindi che anche la cantierizzazione sia affrontata allo stesso modo, appare utile inquadrare alcuni aspetti di carattere generale in via preliminare in quanto costituenti il riferimento generale al quale i singoli interventi si attengono.

## **4 GLI OBIETTIVI E LA METODOLOGIA DI LAVORO**

### **4.1 GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE**

Il completamento di Fiumicino Sud è l'insieme di una molteplicità di interventi la cui realizzazione avviene in più momenti differenti articolati nel tempo.

A tale fasizzazione, si aggiunge il giudizio di compatibilità ambientale del Decreto VIA 236 del 2013, unitamente ad una serie di prescrizioni che inducono un processo di verifica di ottemperanza per i lotti funzionali tale da ripetersi “n” volte.

Data la necessità quindi di procedere con la progettazione esecutiva delle opere in esame per lotti funzionali e che i singoli progetti sono predisposti nel tempo in momenti diversi, appare quanto mai opportuno definire un quadro di riferimento per guidare le successive attività in un’ottica di generale coerenza.

Il processo logico consta nello strutturare le analisi ambientali in maniera unitaria, partendo dai lotti funzionali al fine di poter individuare la metodologia per l’analisi delle lavorazioni in essi previste.

Sulla base di tali schemi logico/concettuali è possibile effettuare un primo screening ambientale delle lavorazioni, desunto da quanto effettuato per lo SIA, che è poi tarato, di volta in volta, per singolo lotto funzionale.

In termini generali pertanto per ogni “lotto funzionale” si possono inquadrare i cantieri che sono dettagliati per singolo intervento ai fini della realizzazione delle opere.

Ad ogni cantiere sono associate delle lavorazioni elementari, la cui somma definirà il totale delle lavorazioni presenti all’interno del cantiere stesso.

L’esemplificazione di tale metodologia è riportata in Figura 4-1.

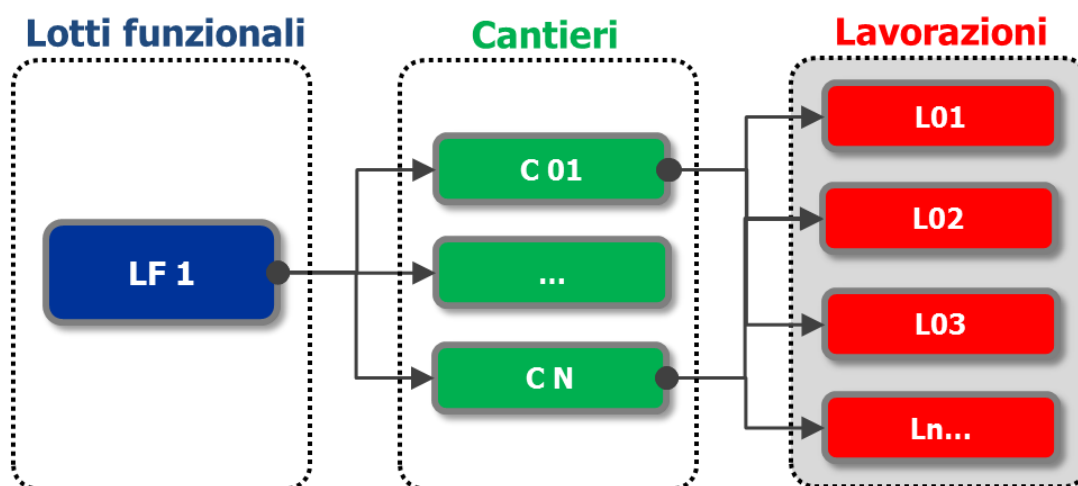


Figura 4-1 Struttura della metodologia generale

## 4.2 METODOLOGIA DI LAVORO

Entrando nello specifico del processo logico accennato nel paragrafo precedente si rappresenta di seguito la metodologia di lavoro generale che si è adottata.



La metodologia che prevede lo smembramento delle attività di cantiere fino alla individuazione di lavorazioni che possono essere definite elementari e delle loro possibili interferenze sull'ambiente, decontestualizzandole, in prima battuta, rispetto alla specifica area di lavorazione.

Posto che ogni lavorazione elementare può generare sull'ambiente specifici effetti è possibile individuare preliminarmente le possibili interferenze da essa indotti.

Procedendo a ritroso nell'analisi secondo quanto definito nel paragrafo precedente, è possibile definire, a livello metodologico, il processo che porta all'analisi delle interferenze dei cantieri, e, pertanto, alla definizione degli impatti, generati nella realizzazione dei singoli lotti funzionali.

Quanto sin qui esposto può essere sintetizzato nel diagramma a blocchi di Figura 4-2.

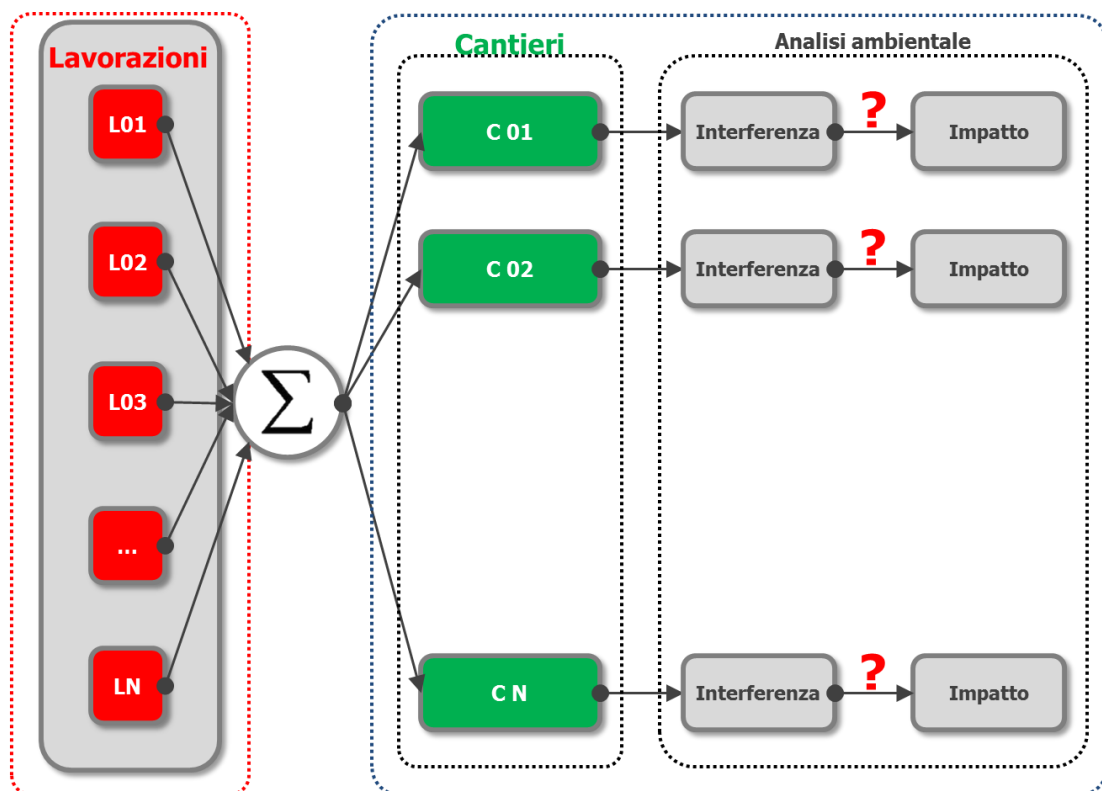


Figura 4-2 Metodologia di lavoro

### 4.3 LA STRUTTURA

#### 4.3.1 ASPETTI GENERALI

Stante gli obiettivi delineati, nonché la metodologia di lavoro definita, la struttura unitaria posta come "linea guida" delle analisi ambientali relative ai diversi lotti funzionali, è

costituita da una prima parte contenente gli aspetti progettuali di ciascuna lavorazione ed una seconda invece che tiene conto degli aspetti ambientali ad esse connesse.

Lo schema della struttura è rappresentato nella Figura 4-3.

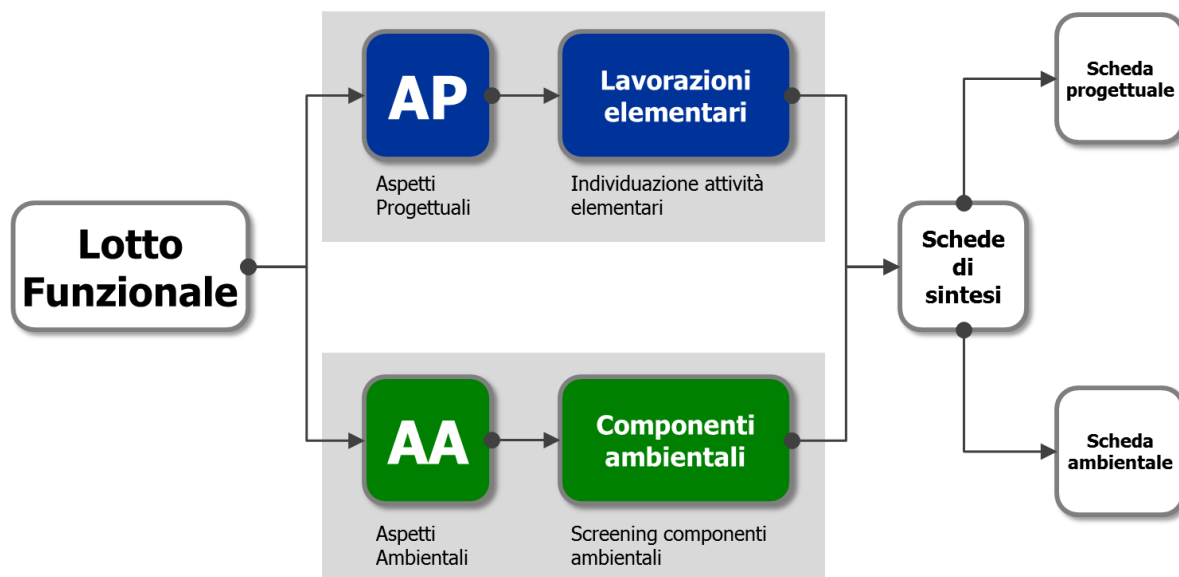


Figura 4-3 Struttura della metodologia unitaria

Con riferimento agli aspetti progettuali, per ogni attività di cantiere si procede, nel momento della definizione dell'attività specifica, a determinarne gli aspetti tecnici al fine di individuare tutte le lavorazioni da porre in essere.

Ogni lavorazione è qualificata attraverso l'individuazione di una o più attività elementari che la compongono.

Relativamente agli aspetti ambientali è effettuata una selezione delle componenti ambientali potenzialmente interessate dal progetto di completamento di Fiumicino sud (screening specifico), a valle di un primo screening ambientale di tipo generale, che prende in considerazione le risultanze delle analisi contenute nello SIA.

Gli elementi così identificabili sono approfonditi e le caratteristiche di interesse per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente capitolo sono rappresentate attraverso schede di sintesi, definite rispettivamente schede progettuali e schede ambientali.

Nella successiva sezione si forniscono maggiori indicazioni circa gli aspetti progettuali e ambientali indagati, per poi rimandare alle schede per l'analisi di dettaglio di ciascun aspetto.

### 4.3.2 LE SCHEDE PROGETTUALI

Come esposto nel paragrafo precedente, attraverso la predisposizione di schede descrittive sono definite per ogni lavorazione le finalità, le singole attività costituenti la lavorazione stessa, i principali aspetti concernenti la tecnica esecutiva, la tipologia di macchinari impiegati con le relative percentuali di funzionamento, nonché i flussi attratti e generati in un periodo di riferimento temporale pari ad 1 ora.

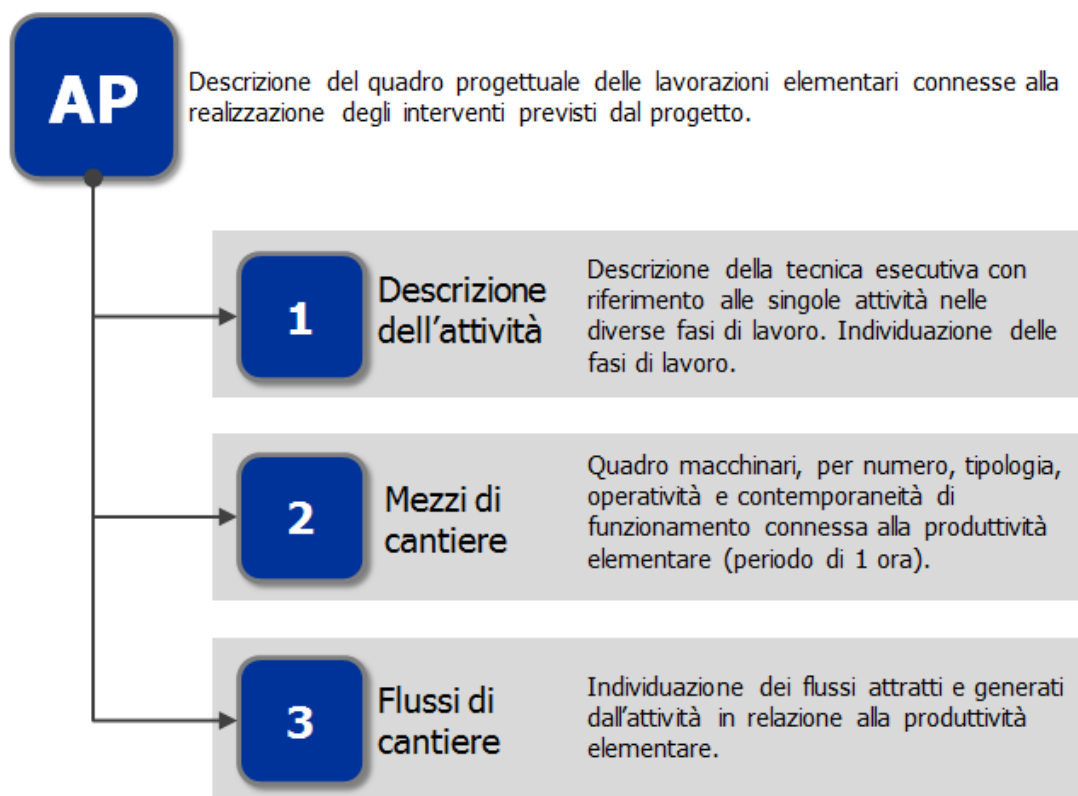


Figura 4-4 Aspetti progettuali contenuti nelle schede descrittive delle lavorazioni

Di seguito si riporta a titolo esemplificativo una “scheda tipo” per gli aspetti progettuali che è dettagliata nello specifico in ogni stralcio funzionale per ogni lavorazione.

## LXX – scheda tipo

### *Informazioni progettuali*

#### **DESCRIZIONE**

In questa sezione vengono descritte in maniera sintetica le attività eseguite nella realizzazione dell'attività di progetto specifica.

#### **ATTREZZATURE E MACCHINARI**

In questa sezione vengono descritti i macchinari utilizzati al fine di eseguire le lavorazioni descritte nella sezione precedente.

Vengono quindi descritti tutti i mezzi ad eccezione degli autocarri che vengono trattati specificatamente nella sezione successiva.

Le informazioni relative ai macchinari fanno riferimento a:

- Tipologia di macchinario;
- Numero di macchinari utilizzati;
- Operatività del macchinario specifico;
- Contemporaneità di utilizzo del macchinario rispetto agli altri descritti in tabella;

Per ciascun mezzo l'operatività è riferita all'intervallo orario.

#### **FLUSSI ORARI ATTRATTI E GENERATI**

In questa sezione vengono descritti il numero **massimo** di autocarri generati/attratti dall'attività specifica, tenendo in considerazione dell'operatività dei macchinari descritti nella task precedente.

Tabella 4-1 Scheda Tipo degli aspetti progettuali

### 4.3.3 LO SCREENING AMBIENTALE GENERALE

Nella fase che ha preceduto l'individuazione delle interferenze ambientali indotte dalle lavorazioni elementari, si è provveduto ad effettuare uno screening volto all'individuazione delle componenti che a priori possono essere ritenute non interferite data la tipologia di azione connessa alla realizzazione delle opere e il quadro conoscitivo ambientale dell'area interessata dal progetto, così come definito nello SIA.

Gli esiti di questa analisi preliminare, volta alla selezione delle componenti ambientali rispetto alle quali è approfondito l'esame nelle schede, sono rappresentati in Figura 4-5.

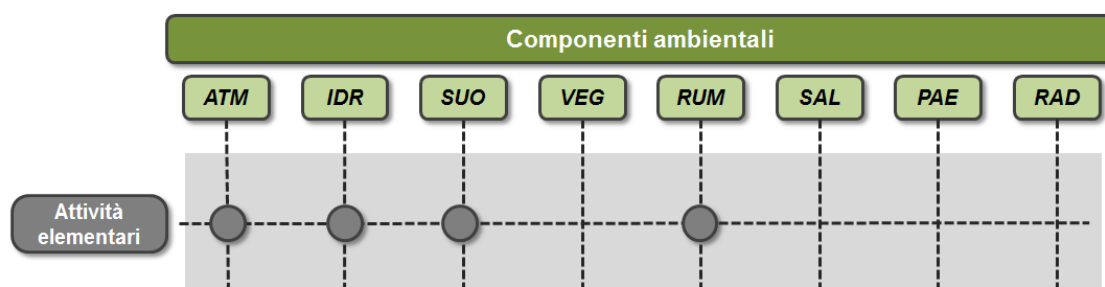


Figura 4-5 Componenti ambientali potenzialmente interessate dalla cantierizzazione

L'immagine individua 4 componenti ritenute non interferite dalle attività di cantiere, che sono:

- vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi ("VEG"),
- salute pubblica ("SAL"),
- paesaggio ("PAE"),
- radiazioni ionizzanti e non ionizzanti ("RAD"),

e 4 potenzialmente interferite:

- atmosfera ("ATM"),
- ambiente idrico ("IDR"),
- suolo e sottosuolo ("SUO"),
- rumore e vibrazioni ("RUM").

Di seguito si riportano le considerazioni che attengono alle componenti ritenute non interferite.

In considerazione della forte antropizzazione dell'area e della destinazione agricola dei suoli circostanti, si ritiene che non vi siano interferenze con l'assetto vegetazionale e la distribuzione dei popolamenti faunistici.

Le interferenze delle azioni di cantiere sulla salute pubblica sono trattate in termini di inquinamento acustico ed atmosferico e pertanto si fa riferimento a quanto individuato nelle componenti "Rumore" ed "Atmosfera".

Per quanto riguarda la percezione visiva si può affermare che le varie tipologie di interventi previste non creano interferenze sulla visuale.

Per quanto concerne le radiazioni ionizzanti e non, si evidenzia che tale componente non è stata presa in considerazione in quanto durante la fase di cantierizzazione non sono presenti sorgenti di impatto.

Inoltre, occorre specificare che per quanto riguarda la componente "ambiente idrico", si evidenzia che l'aeroporto di Fiumicino non ricade in zone di pericolosità idraulica.

Per quanto riguarda invece la componente "atmosfera", le attività legate alla cantierizzazione interessano principalmente la produzione di polveri, generate a seguito della movimentazione di materiale polverulento derivante dall'esecuzione delle attività stesse.

A tale scopo pertanto si fa riferimento ai fattori di emissione di PM<sub>10</sub>, così come definiti dal documento Emissions Factors & AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors sviluppato dall'Environmental Protection Agency.

Per quanto riguarda l'attività correlata al trasporto di materiale, ovvero all'incremento del traffico pesante ad essa correlata, oltre al PM<sub>10</sub>, è necessario valutare anche gli ossidi di azoto e il monossido di carbonio, inquinanti principali correlabili al traffico veicolare "su gomma".

#### **4.3.4 LE SCHEDE AMBIENTALI**

Come detto, le informazioni rappresentate per descrivere le lavorazioni indicate al precedente paragrafo sono state scelte, oltre che per delineare la cantierizzazione del progetto in esame nel suo complesso, anche perché ritenute utili per indagare gli aspetti ambientali ad essa connessi. Tali aspetti ambientali sono anch'essi forniti attraverso schede di sintesi, ciascuna relativa ad ogni singola lavorazione.

Nello specifico, per ogni lavorazione, sono individuate tra le componenti precedentemente citate, attraverso lo screening specifico, quelle interferite, potenzialmente interferite o non interferite dalle azioni di cantiere.

Successivamente si procede ad una analisi specifica per ciascuna componente volta alla caratterizzazione qualitativa dell'interferenza indicando la sorgente dell'effetto.

Gli aspetti contenutistici delle schede ambientali che sono realizzate per ogni lotto funzionale sono indicati sinteticamente nella Figura 4-6.

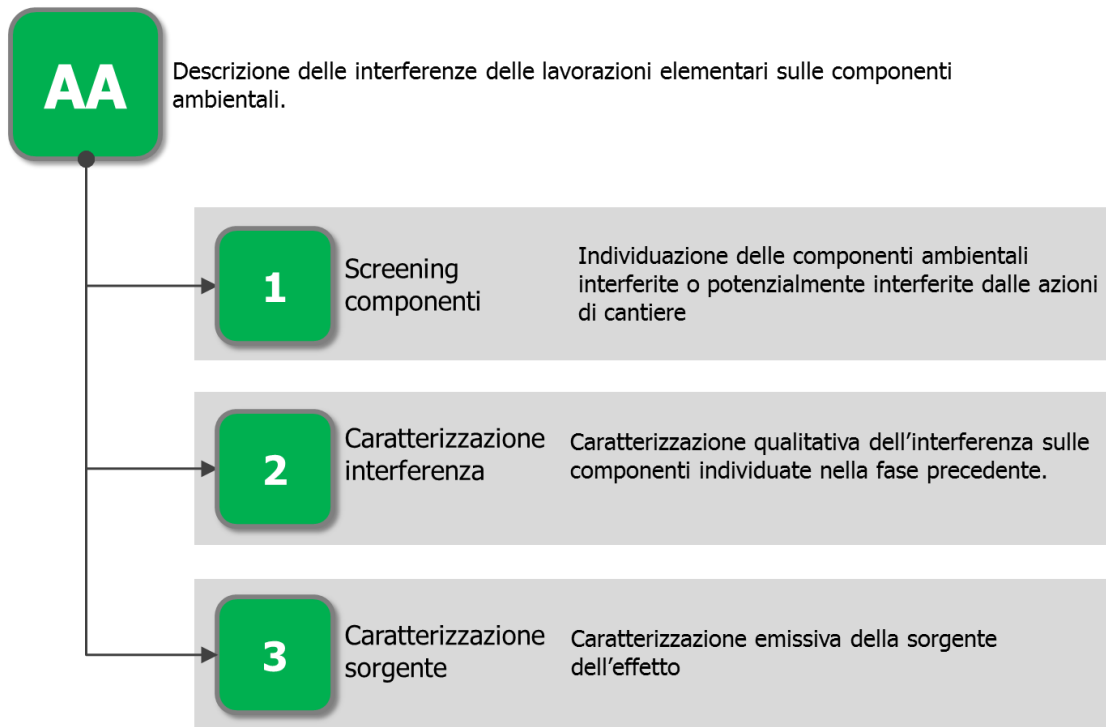


Figura 4-6 Aspetti ambientali contenuti nelle schede descrittive

L'analisi degli impatti delle attività di costruzione dell'opera è effettuata per lotti funzionali, rendendo possibile:

- descrivere il singolo cantiere attraverso la combinazione delle lavorazioni, e quindi delle attività, precedentemente descritte,
- selezionare di conseguenza le interferenze ambientali connesse con le attività,
- "calare" tutto ciò nell'ambito territoriale che lo ospita in modo da verificare il reale impatto indotto.

**SEZIONE II**  
**METODOLOGIA SPECIFICA ED ANALISI DEGLI IMPATTI DELLA**  
**CANTIERIZZAZIONE DEL SISTEMA AEROSTAZIONI LATO EST -**  
**OPERE DI COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LAND SIDE**  
**ED AIR SIDE, LOTTO 1 – SECONDO E TERZO STRALCIO STRUTTURE,**  
**INVOLUCRO, FINITURE ED IMPIANTI AREA IMBARCO A ED**  
**AVANCORPO DEL TERMINAL 1**



## **5 INTRODUZIONE**

La presente sezione è finalizzata all'analisi degli impatti sull'ambiente indotti dalla realizzazione delle opere di completamento per le infrastrutture land side ed air side del sottosistema aerostazioni lato est, con particolare riferimento alle attività per la realizzazione delle strutture, involucro, finiture ed impianti dell'Area di imbarco A e dell'Avancorpo T1 previsti nell'ambito del progetto di completamento di Fiumicino Sud.

Da tale analisi, come già anticipato precedentemente, discende la valutazione circa la necessità di prevedere eventuali opere di mitigazione.

Il metodo di lavoro utilizzato è quello di specializzare ed approfondire per il singolo intervento in esame le considerazioni di carattere generale esposte nella sezione precedente.

## **6 LA FASE DI DEFINIZIONE**

### **6.1 ASPETTI PROGETTUALI**

#### **6.1.1 INDIVIDUAZIONE DELLE LAVORAZIONI**

Posto che i progetti si inseriscono in un quadro di interventi organici descritto nella Relazione di ottemperanza (A783T8DGGGERGEN701), a cui si rimanda per approfondimenti, il progetto prevede la realizzazione di tutte le opere (strutture, involucro esterno, opere di finitura e impianti tecnologici) e il completamento delle opere interrato delle aree tecniche necessarie alla continuità delle operazioni di smistamento bagagli.

Complessivamente per la realizzazione delle opere sono state individuate tredici attività lavorative.

In questa sede si individuano le lavorazioni che vengono effettuate all'interno del cantiere operativo al fine di poter dettagliare, in termini specifici, quanto definito nel Par.4.3 della Sezione I in termini generali.

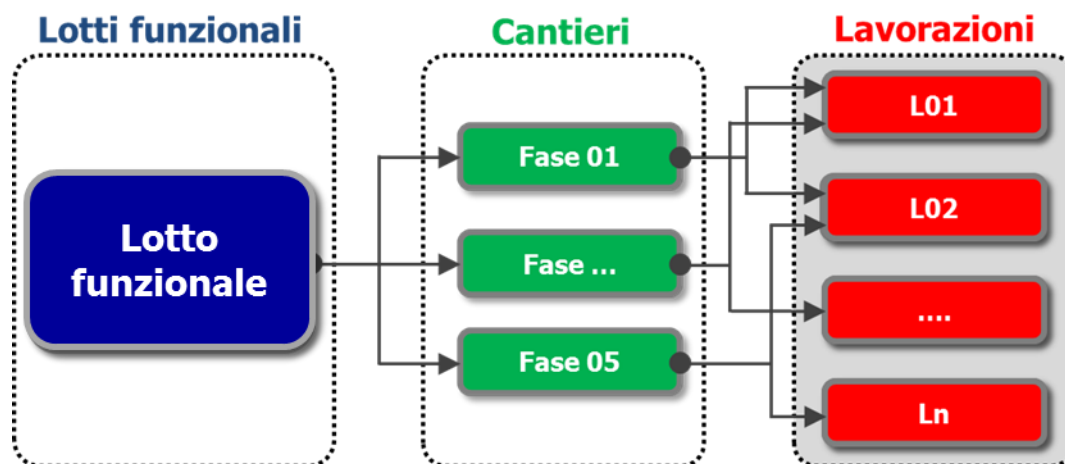


Figura 6-1 Schema logico delle attività lavorative declinato rispetto al caso specifico

In considerazione della tipologia di manufatto ed in considerazione delle lavorazioni e dei progetti esecutivi definiti è possibile individuare le attività elementari che si implementeranno in fase di realizzazione (cfr. Tabella 6-1).

Cod.	Attività elementare
L01	Scavo di sbancamento
L02	Scavo di sbancamento con aggotamento acque
L03	Palificazioni
L04	Realizzazione fondazioni
L05	Rinterri
L06	Realizzazione di elementi strutturali in elevazione gettati in opera
L07	Posa in opera di elementi prefabbricati
L08	Trasporto materiali
L09	Demolizione manufatti edilizi con tecnica tradizionale
L10	Demolizione manufatti edilizi con tecnica controllata
L11	Stoccaggio materiali provenienti dalle demolizioni
L12	Demolizione pavimentazione in conglomerato cementizio
L13	Demolizione pavimentazione in conglomerato bituminoso

Tabella 6-1 Attività elementari svolte nella realizzazione dell'intervento

Per le successive analisi sono quindi prese in considerazione unicamente le lavorazioni individuate.

Le attività descritte nelle schede fanno riferimento alle produttività teoriche massime applicabili per singola attività elementare.

Con specifico riferimento ai flussi attratti e generati, tale caratteristica, si traduce nella definizione dei volumi massimi di autocarri, ovvero di movimentazioni massime teoriche che si possono verificare nell'esecuzione dell'attività elementare.

## 6.1.2 LE SCHEDE PROGETTUALI

### L01 Scavo di sbancamento




#### Informazioni progettuali

<b>DESCRIZIONE</b>	<p>La lavorazione consiste nello scavo di terreno nel sottosuolo (scavi di fondazione, scavi in sezione, etc.) o nel soprasuolo (scavi di sbancamento, spianamento, etc.) e carico dei materiali su mezzi adibiti al trasporto terre.</p> <p>L'attività si esplica su quote di lavoro al di sopra del livello di falda pertanto non sono necessarie operazioni di aggotamento di acque.</p> <p>La lavorazione è composta da due attività elementari non contemporanee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scavo di terreno mediante escavatore</li> <li>• Carico dei materiali di risulta su mezzi</li> </ul>																											
<b>ATTREZZATURE E MACCHINARI</b>	<p>Tipologia e numero di mezzi d'opera impiegati nella attività sono specificati nella tabella che segue. I dati sono riferiti alla squadra elementare, intesa come il numero minimo di mezzi necessari. Per ciascun mezzo si indicano inoltre le percentuali di funzionamento nel periodo temporale di riferimento pari ad 1 ora</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Numero</th> <th colspan="5">Operatività%</th> <th>Contemp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  Escavatore                 </td> <td>1</td> <td>20</td> <td>40</td> <td>60</td> <td>80</td> <td>90</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>  ala gommata                 </td> <td>1</td> <td>20</td> <td>40</td> <td>60</td> <td>80</td> <td>90</td> <td>SI</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Numero	Operatività%					Contemp	 Escavatore	1	20	40	60	80	90	SI	 ala gommata	1	20	40	60	80	90	SI			
Tipo	Numero	Operatività%					Contemp																					
 Escavatore	1	20	40	60	80	90	SI																					
 ala gommata	1	20	40	60	80	90	SI																					
<b>FLUSSI ORARI ATTRATTI E GENERATI</b>	<p>In base all'operatività delle macchine sopracitate, ed in considerazione di una produttività teorica massima oraria di circa 115 m<sup>3</sup>, i flussi attratti e generati per l'attività di scavo per sbancamento risultano pari a:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Attività</th> <th colspan="4">Flussi Generati</th> <th colspan="4">Flussi Attratti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Scavo di sbancamento</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Attività	Flussi Generati				Flussi Attratti				Scavo di sbancamento																	
Attività	Flussi Generati				Flussi Attratti																							
Scavo di sbancamento																												
																												



## L02 Scavo di sbancamento con aggotamento acque






### Informazioni progettuali

**DESCRIZIONE** La lavorazione consiste nello scavo di terreno nel sottosuolo (scavi di fondazione, scavi in sezione, etc.) con quote di lavoro al di sotto del livello di falda una volta infissi gli elementi di confinamento dell'area di scavo necessari per l'abbassamento del livello della superficie piezometrica. La lavorazione è composta da due attività elementari non contemporanee:

- Scavo di terreno mediante escavatore,
- Aggotamento delle acque
- Carico dei materiali di risulta su mezzi.

**ATTREZZATURE E MACCHINARI** Tipologia e numero di mezzi d'opera impiegati nella attività sono specificati nella tabella che segue. I dati sono riferiti alla squadra elementare, intesa come il numero minimo di mezzi necessari. Per ciascun mezzo si indicano inoltre le percentuali di funzionamento nel periodo temporale di riferimento pari ad 1 ora.

Tipo	Numero	Operatività%					Contemp
Escavatore 	1	20	40	60	80	90	SI
ala gommata 	1	20	40	60	80	90	SI
Pompa 	1	20	40	50			SI

**FLUSSI ORARI ATTRATTI E GENERATI** In base all'operatività delle macchine sopracitate, ed in considerazione di una produttività teorica massima oraria di circa 100 m<sup>3</sup>, i flussi attratti e generati per l'attività di scavo per sbancamento risultano pari a:

Attività	Flussi Generati	Flussi Attratti
----------	-----------------	-----------------

Scavo di  
sbancamento



## L03 Palificazioni

### Informazioni progettuali



#### DESCRIZIONE

L'attività consiste nella realizzazione di fondazioni profonde attraverso pali C.F.A. (Continuos Flight Auger). La realizzazione del palo è costituita da tre attività elementari che si susseguono temporalmente: trivellazione, getto del calcestruzzo e posa in opera dell'armatura.






- Trivellazione mediante utensile di perforazione ad elica continua (conclea)
- Getto del calcestruzzo mediante pompa di getto collegata alla conclea
- Posa in opera dell'armatura a getto ultimato secondo le dimensioni previste dal progetto.

Profondità e diametro del palo variano in funzione dell'opera da realizzare. Complessivamente si hanno diametri compresi fra 250-1000 mm e profondità di 30-32 metri.

•

#### ATTREZZATURE E MACCHINARI













Tipologia e numero di mezzi d'opera impiegati nella attività sono specificati nella tabella che segue. I dati sono riferiti alla squadra elementare, intesa come il numero minimo di mezzi necessari. Per ciascun mezzo si indicano inoltre le percentuali di funzionamento nel periodo temporale di riferimento pari ad 1 ora.

	<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Operatività%</b>	<b>Contemp.</b>
	Palificatrice 	1	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px 5px;">20</div> <div style="background-color: #C8E6C9; padding: 2px 5px;">40</div> <div style="background-color: #FFF9C4; padding: 2px 5px;">60</div> <div style="background-color: #FFCC99; padding: 2px 5px;">80</div> <div style="background-color: #FF0000; padding: 2px 5px;">90</div> </div>	NO
	Pompa CIs 	1	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px 5px;">20</div> <div style="background-color: #C8E6C9; padding: 2px 5px;">40</div> <div style="background-color: #FFF9C4; padding: 2px 5px;">60</div> <div style="background-color: #FFCC99; padding: 2px 5px;">80</div> <div style="background-color: #FF0000; padding: 2px 5px;">85</div> </div>	NO
	Autogru 	1	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px 5px;">20</div> <div style="background-color: #C8E6C9; padding: 2px 5px;">40</div> <div style="background-color: #FFF9C4; padding: 2px 5px;">60</div> </div>	NO
<b>FLUSSI ORARI ATTRATTI E GENERATI</b>	In base all'operatività delle macchine sopracitate i flussi attratti e generati per la realizzazione di palificazioni mediante tecnica CFA risultano:			
	<b>Attività</b>	<b>Flussi Generati</b>	<b>Flussi Attratti</b>	
	<i>Palificazioni</i>			

## L04 Realizzazione fondazioni



### Informazioni progettuali
















<b>DESCRIZIONE</b>	<p>L'attività consiste nella realizzazione di fondazioni gettate in opera. Il ferro d'armatura prelaborato viene sollevato attraverso una gru dal camion necessario per il trasporto e posizionato sul sito.</p> <p>Nella fase successiva viene gettato in opera il cls dalle autobetoniere con una poma di getto secondo le specifiche di progetto.</p> <p>La lavorazione è composta quindi da due attività elementari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• scarico del ferro d'armatura prelaborato e posa in opera,</li> <li>• getto in cls.</li> </ul>												
<b>ATTREZZATURE E MACCHINARI</b>	<p>Tipologia e numero di mezzi d'opera impiegati nella attività sono specificati nella tabella che segue.</p> <p>I dati sono riferiti alla squadra elementare, intesa come il numero minimo di mezzi necessari. Per ciascun mezzo si indicano inoltre le percentuali di funzionamento nel periodo temporale di riferimento pari ad 1 ora.</p> <table border="1" data-bbox="440 1232 1372 1624"> <thead> <tr> <th data-bbox="440 1232 686 1265">Tipo</th> <th data-bbox="686 1232 829 1265">Numero</th> <th data-bbox="829 1232 1228 1265">Operatività%</th> <th data-bbox="1228 1232 1372 1265">Conten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="440 1265 686 1467">  </td> <td data-bbox="686 1265 829 1467">1</td> <td data-bbox="829 1265 1228 1467">  </td> <td data-bbox="1228 1265 1372 1467">NO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="440 1467 686 1624">  </td> <td data-bbox="686 1467 829 1624">1</td> <td data-bbox="829 1467 1228 1624">  </td> <td data-bbox="1228 1467 1372 1624">NO</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Numero	Operatività%	Conten		1		NO		1		NO
Tipo	Numero	Operatività%	Conten										
	1		NO										
	1		NO										
<b>FLUSSI ORARI ATTRATTI E GENERATI</b>	<p>Per tale attività la stima dei flussi attratti e generati dipende sia dal quantitativo che dalle dimensioni degli elementi da realizzare.</p> <p>Tale fattore risulta di difficile stima in quanto dipende da parametri strettamente connessi alle dimensioni e alla tipologia delle opere da realizzare (struttura, dimensione, etc.).</p>												



## L05 Rinterri









### Informazioni progettuali

<b>DESCRIZIONE</b>	<p>La lavorazione consiste nella chiusura di scavi eseguiti con materiali inerti e/o materiali di risulta provenienti da scavo fino alla sistemazione del piano secondo progetto.</p> <p>La lavorazione è composta da una singola attività elementare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Messa in opera e stesa del materiale mediante escavatore</li> </ul>																
<b>ATTREZZATURE E MACCHINARI</b>	<p>Tipologia e numero di mezzi d'opera impiegati nella attività sono specificati nella tabella che segue. I dati sono riferiti alla squadra elementare, intesa come il numero minimo di mezzi necessari. Per ciascun mezzo si indicano inoltre le percentuali di funzionamento nel periodo temporale di riferimento pari ad 1 ora.</p> <table border="1" data-bbox="422 952 1370 1176"> <thead> <tr> <th data-bbox="422 952 638 996">Tipo</th> <th data-bbox="638 952 798 996">Numero</th> <th colspan="5" data-bbox="798 952 1149 996">Operatività%</th> <th data-bbox="1149 952 1370 996">Contemp.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="422 996 638 1176">                     Escavatore   </td> <td data-bbox="638 996 798 1176">1</td> <td data-bbox="798 1041 869 1108">20</td> <td data-bbox="869 1041 949 1108">40</td> <td data-bbox="949 1041 1029 1108">60</td> <td data-bbox="1029 1041 1109 1108">80</td> <td data-bbox="1109 1041 1149 1108">90</td> <td data-bbox="1149 996 1370 1176">-</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Numero	Operatività%					Contemp.	Escavatore 	1	20	40	60	80	90	-
Tipo	Numero	Operatività%					Contemp.										
Escavatore 	1	20	40	60	80	90	-										
<b>FLUSSI ORARI ATTRATTI E GENERATI</b>	<p>In base all'operatività delle macchine sopracitate, ed in considerazione di una produttività teorica massima oraria di circa 115 m<sup>3</sup>, i flussi attratti e generati per l'attività di rinterro sono pari a:</p> <table border="1" data-bbox="486 1321 1292 1532"> <thead> <tr> <th data-bbox="486 1321 702 1366">Attività</th> <th colspan="4" data-bbox="702 1321 997 1366">Flussi Generati</th> <th colspan="4" data-bbox="997 1321 1292 1366">Flussi Attratti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="486 1366 702 1532"><i>Rinterro</i></td> <td data-bbox="702 1366 997 1532">    </td> <td data-bbox="997 1366 1292 1532">    </td> </tr> </tbody> </table>	Attività	Flussi Generati				Flussi Attratti				<i>Rinterro</i>	 	 				
Attività	Flussi Generati				Flussi Attratti												
<i>Rinterro</i>	 	 															

## L06 Realizzazione di elementi strutturali in elevazione gettati in opera



### Informazioni progettuali

<b>DESCRIZIONE</b>	<p>L'attività consiste nella realizzazione di elementi strutturali in elevazione gettati in opera. Il ferro d'armatura prelaborato viene sollevato attraverso una gru dal camion necessario per il trasporto e posizionato sul sito. Nella fase successiva viene gettato in opera il cls dalle autobetoniere con una poma di getto secondo le specifiche di progetto.</p> <p>La lavorazione è composta quindi da due attività elementari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarico del ferro d'armatura prelaborato e posa in opera;</li> <li>• Getto in cls.</li> </ul>																																			
<b>ATTREZZATURE E MACCHINARI</b>	<p>Tipologia e numero di mezzi d'opera impiegati nella attività sono specificati nella tabella che segue. I dati sono riferiti alla squadra elementare, intesa come il numero minimo di mezzi necessari.</p> <p>Per ciascun mezzo si indicano inoltre le percentuali di funzionamento nel periodo temporale di riferimento pari ad 1 ora.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Tipo</th> <th style="text-align: center;">Numero</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">Operatività%</th> <th style="text-align: center;">Contem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Autogru</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pompa Cls</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Numero	Operatività%				Contem	Autogru								1	20	40	60	70	NO	Pompa Cls								1	20	40	60	80	NO
Tipo	Numero	Operatività%				Contem																														
Autogru																																				
	1	20	40	60	70	NO																														
Pompa Cls																																				
	1	20	40	60	80	NO																														
<b>FLUSSI ORARI ATTRATTI E GENERATI</b>	<p>Per tale attività la stima dei flussi attratti e generati dipende sia dal quantitativo che dalle dimensioni degli elementi da realizzare. Tale fattore risulta di difficile stima in quanto dipende da parametri strettamente connessi alle dimensioni e alla tipologia delle opere da realizzare (struttura, dimensione, etc.) nonché dalla tipologia di gru impiegata (autogru o gru a torre).</p>																																			

## L07 Posa in opera di elementi prefabbricati




### Informazioni progettuali

**DESCRIZIONE** L'attività consiste nella posa in opera di elementi prefabbricati all'interno delle aree di cantiere. Gli elementi vengono portati in sito su camion e messi in opera con l'ausilio di gru.

La lavorazione è costituita da un'unica azione quale quella di movimentazione con l'ausilio di una gru di tipologia dipendente dalle dimensioni dell'elemento prefabbricato.

**ATTREZZATURE E MACCHINARI** Tipologia e numero di mezzi d'opera impiegati nella attività sono specificati nella tabella che segue. I dati sono riferiti alla squadra elementare, intesa come il numero minimo di mezzi necessari.

Per ciascun mezzo si indicano inoltre le percentuali di funzionamento nel periodo temporale di riferimento pari ad 1 ora.













Tipo	Numero	Operatività%	Contem
Autogru			
	1	20 40	NO

**FLUSSI ORARI ATTRATTI E GENERATI** Per la posa in opera di elementi prefabbricati, la stima dei flussi attratti e generati dipende sia dal quantitativo che dalle dimensioni degli elementi. Tale fattore risulta di difficile stima in quanto dipende da parametri strettamente connessi alle dimensioni e alla tipologia delle opere da realizzare (struttura, dimensione, etc.) nonché dalla tipologia di gru impiegata (autogru o gru a torre).

## L08 Trasporto dei materiali



### Informazioni progettuali

<b>DESCRIZIONE</b>	<p>L'attività consiste nel trasporto dei materiali necessari per la realizzazione delle opere o di terre o inerti derivanti dalle operazioni di scavo o demolizione.</p> <p>In tale attività è contemplato anche il trasporto del cls con autobetoniere necessario per la realizzazione degli elementi strutturali gettati in opera.</p> <p>Il trasporto avverrà su percorsi di cantiere individuati per ciascuna opera in parte ricadenti all'interno del sedime aeroportuale e in parte all'esterno lungo la rete di accessibilità all'aeroporto.</p>										
<b>ATTREZZATURE E MACCHINARI</b>	<p>La tipologia di mezzi d'opera impiegati nella attività sono specificati nella tabella che segue:</p> <table border="1" data-bbox="568 936 1281 1630"> <thead> <tr> <th data-bbox="568 936 890 969">Tipo</th> <th data-bbox="890 936 1281 969">Materiale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="568 969 890 1122">  </td> <td data-bbox="890 969 1281 1122">Terre, inerti e Clb</td> </tr> <tr> <td data-bbox="568 1122 890 1285">  </td> <td data-bbox="890 1122 1281 1285">Cls</td> </tr> <tr> <td data-bbox="568 1285 890 1462">  </td> <td data-bbox="890 1285 1281 1462">Elementi prefabbricati</td> </tr> <tr> <td data-bbox="568 1462 890 1630">  </td> <td data-bbox="890 1462 1281 1630">Liquidi</td> </tr> </tbody> </table> <p>I mezzi necessari per il trasporto dipendono dal tipo di materiale da movimentare. Il numero di mezzi impiegati è strettamente correlato ai quantitativi di materiale previsto per ciascun progetto.</p>	Tipo	Materiale		Terre, inerti e Clb		Cls		Elementi prefabbricati		Liquidi
Tipo	Materiale										
	Terre, inerti e Clb										
	Cls										
	Elementi prefabbricati										
	Liquidi										
<b>FLUSSI ORARI ATTRATTI E GENERATI</b>	<p>I flussi generati e attratti dipendono strettamente dalle singole lavorazioni. Per quanto riguarda quindi il numero di veicoli connessi nel periodo di riferimento pari ad 1 ora si rimanda a quanto specificato in ciascuna scheda relativa alle attività di cantiere prese a riferimento.</p>										

## L09 Demolizione manufatti edilizi con tecnica tradizionale



### *Informazioni progettuali*

<b>DESCRIZIONE</b>	<p>La lavorazione consiste nella demolizione/scomposizione di strutture di manufatti, compreso il carico delle macerie per l'allontanamento.</p> <p>La demolizione comprende le strutture di fondazione, portanti, orizzontali, i tamponamenti, le coperture e i rivestimenti. Saranno altresì elementi da demolire gli impianti tecnologici.</p> <p>L'attività comprende anche il carico delle macerie derivanti su mezzi per l'allontanamento del materiale di risulta dal sito di cantiere.</p> <p>La lavorazione è composta da tre attività elementari non contemporanee:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nebulizzazione per contenimento dispersione polveri,</li><li>• Demolizione di strutture e componenti,</li><li>• Asportazione degli elementi demoliti e carico su mezzi per allontanamento materiale.</li></ul> <p><u>Demolizione/rimozione di amianto</u></p> <p>Nell'ambito delle attività di demolizione/rimozione di elementi in amianto, le procedure operative e le misure di sicurezza da adottare durante gli interventi, dovranno rispettare quanto indicato dal DM 6/9/1994 e dal Titolo IX, capo III del D.Lgs 81/2008.</p> <p>Tali lavori saranno eseguiti da imprese specializzate iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali art. 212 D.Lgs. 152/06 con dipendenti provvisti di patentino di abilitazione per coordinatori ed operatori addetti alla bonifica.</p> <p>In generale l'attività lavorativa prevede le seguenti fasi operative:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• rilevamento della quantità del materiale da rimuovere;</li><li>• prelievo di campioni da sottoporre ad analisi;</li><li>• elaborazione del Piano di Lavoro da presentare all'A.S.L. di competenza;</li><li>• spruzzatura lastre sulle superfici a vista con liquido inglobante colorato, per evitare la dispersione delle fibre di amianto nell'aria;</li><li>• taglio dei sistemi di ancoraggio esclusivamente con attrezzi manuali (forbici, cesoie, ecc.) non con smerigliatrici e simili;</li><li>• rimozione delle lastre effettuata manualmente da due operatori e accatastamento su bancali in sicurezza, cercando di non romperle;</li><li>• a terra le stesse dovranno essere trattate con inglobante colorato sulle superfici dove non è stato possibile farlo prima;</li></ul>
--------------------	--




- protezione delle lastre su bancali con telo trasparente neutro (cellophane);
- fissaggio dei teli cellophane di protezione delle lastre con nastro adesivo ed etichettatura prevista dalla legge per la segnalazione del materiale contenente amianto;
- carico dei bancali su automezzo e trasporto delle lastre in discarica autorizzata;
- dopo la rimozione l'area di lavoro deve essere adeguatamente pulita mediante aspiratori a filtro assoluto e i materiali di consumo utilizzati andranno irrorati con il preparato incapsulante. Tutta l'area interessata deve essere priva di amianto.

Bagnatura delle strutture mediante impianto di nebulizzazione mobile

Nell'ambito delle operazioni di demolizione è prevista la bagnatura delle strutture durante le attività di demolizione/rimozione mediante impianto di nebulizzazione mobile che verrà di volta in volta spostato sulle aree di lavoro. Le eventuali acque di ruscellamento saranno intercettate dalle canalette di raccolta acque e inviate al pozzetto per essere recapitate all'impianto di trattamento costituito da sedimentazione e disoleatore prima dell'immissione nelle fognature esistenti.







**ATTREZZATURE  
E  
MACCHINARI**

Tipologia e numero di mezzi d'opera impiegati nella attività sono specificati nella tabella che segue. I dati sono riferiti alla squadra elementare, intesa come il numero minimo di mezzi necessari. Per ciascun mezzo si indicano inoltre le percentuali di funzionamento nel periodo temporale di riferimento pari ad 1 ora.

Tipo	Numero	Operatività%	Contem
 Demolitore	1	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px 5px;">20</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px 5px;">40</div> <div style="background-color: #FFFF00; padding: 2px 5px;">60</div> <div style="background-color: #FFD700; padding: 2px 5px;">80</div> <div style="background-color: #FF0000; padding: 2px 5px;">90</div> </div>	NO
 Escavatore	1	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px 5px;">20</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px 5px;">36</div> </div>	NO
 Autobotte	1	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px 5px;">20</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px 5px;">40</div> </div>	NO

Per quanto riguarda l'attività di rimozione dei materiali contenenti amianto, le attrezzature e macchinari impiegati sono:

- utensili manuali di uso comune,

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• utensili elettrici portatili,</li> <li>• idropulitrice ad alta pressione,</li> <li>• pompa a bassa pressione,</li> <li>• spruzzatrice airless,</li> <li>• cestelli elevatori o ponte sviluppabile su carro.</li> </ul>						
<b>FLUSSI ORARI ATTRATTI E GENERATI</b>	<p>In base all'operatività delle macchine sopracitate, ed in considerazione di una produttività media oraria di circa 30 m<sup>3</sup>, i flussi attratti e generati per l'attività di demolizione delle lastre in cls risulta pari a:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Attività</th> <th style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Flussi Generati</th> <th style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Flussi Attratti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>Demolizione manufatti edilizi</i></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>	Attività	Flussi Generati	Flussi Attratti	<i>Demolizione manufatti edilizi</i>		
Attività	Flussi Generati	Flussi Attratti					
<i>Demolizione manufatti edilizi</i>							

## L10 Demolizione manufatti edilizi con tecnica controllata



### Informazioni progettuali

<b>DESCRIZIONE</b>	<p>La lavorazione consiste nella rimozione “per smontaggio” delle strutture/elementi di manufatti compreso il carico per l’allontanamento. La tecnica si avvale di tutti gli strumenti di lavoro che permettono azioni precise e rapide per lo smontaggio di tutti gli elementi in assenza di polveri e vibrazioni (pinza idraulica, ponteggi, apparecchi di sollevamento, seghe, etc.).</p> <p>L’attività comprende anche il sollevamento attraverso una autogru dei materiali estratti e il carico su mezzi nella fase successiva a quella del taglio.</p> <p>La lavorazione è composta da quattro attività elementari non contemporanee:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nebulizzazione per contenimento dispersione polveri,</li><li>• Rimozione “per smontaggio” delle strutture/elementi,</li><li>• Taglio elementi per riduzione ingombro mediante escavatore con pinza idraulica,</li><li>• Asportazione degli elementi e carico su mezzi per allontanamento materiale mediante autogru.</li></ul> <p><u>Demolizione/rimozione di amianto</u></p> <p>Nell’ambito delle attività di demolizione/rimozione di elementi in amianto, le procedure operative e le misure di sicurezza da adottare durante gli interventi, dovranno rispettare quanto indicato dal DM 6/9/1994 e dal Titolo IX, capo III del D.Lgs 81/2008.</p> <p>Tali lavori saranno eseguiti da imprese specializzate iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali art. 212 D.Lgs. 152/06 con dipendenti provvisti di patentino di abilitazione per coordinatori ed operatori addetti alla bonifica.</p> <p>In generale l’attività lavorativa prevede le seguenti fasi operative:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• rilevamento della quantità del materiale da rimuovere;</li><li>• prelievo di campioni da sottoporre ad analisi;</li><li>• elaborazione del Piano di Lavoro da presentare all’A.S.L. di competenza;</li><li>• spruzzatura lastre sulle superfici a vista con liquido inglobante colorato, per evitare la dispersione delle fibre di amianto nell’aria;</li><li>• taglio dei sistemi di ancoraggio esclusivamente con attrezzi manuali (forbici, cesoie, ecc.) non con smerigliatrici e simili;</li></ul>
--------------------	--






- rimozione delle lastre effettuata manualmente da due operatori e accatastamento su bancali in sicurezza, cercando di non romperle;
- a terra le stesse dovranno essere trattate con inglobante colorato sulle superfici dove non è stato possibile farlo prima;
- protezione delle lastre su bancali con telo trasparente neutro (cellophane);
- fissaggio dei teli cellophane di protezione delle lastre con nastro adesivo ed etichettatura prevista dalla legge per la segnalazione del materiale contenente amianto;
- carico dei bancali su automezzo e trasporto delle lastre in discarica autorizzata;
- dopo la rimozione l'area di lavoro deve essere adeguatamente pulita mediante aspiratori a filtro assoluto e i materiali di consumo utilizzati andranno irrorati con il preparato incapsulante. Tutta l'area interessata deve essere priva di amianto.








Bagnatura delle strutture mediante impianto di nebulizzazione mobile

Nell'ambito delle operazioni di demolizione è prevista la bagnatura delle strutture durante le attività di demolizione/rimozione mediante impianto di nebulizzazione mobile che verrà di volta in volta spostato sulle aree di lavoro. Le eventuali acque di ruscellamento saranno intercettate dalle canalette di raccolta acque e inviate al pozzetto per essere recapitate all'impianto di trattamento costituito da sedimentazione e disoleatore prima dell'immissione nelle fognature esistenti.

**ATTREZZATURE  
E  
MACCHINARI**

Tipologia e numero di mezzi d'opera impiegati nella attività sono specificati nella tabella che segue. I dati sono riferiti alla squadra elementare, intesa come il numero minimo di mezzi necessari. Per ciascun mezzo si indicano inoltre le percentuali di funzionamento nel periodo temporale di riferimento pari ad 1 ora.




Tipo	Numero	Operatività%		Contem
 Pinza idraulica	1	20	40	NO
 Jtensili per il taglio	1	20	40	NO
 Autobotte	1	20	40	NO

	<p>Autogru</p>  <p>1 <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">20</span> <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">40</span> NO</p> <p>Per quanto riguarda l'attività di rimozione dei materiali contenenti amianto, le attrezzature e macchinari impiegati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utensili manuali di uso comune,</li> <li>• utensili elettrici portatili,</li> <li>• idropulitrice ad alta pressione,</li> <li>• pompa a bassa pressione,</li> <li>• spruzzatrice airless,</li> <li>• cestelli elevatori o ponte sviluppabile su carro.</li> <li>•</li> </ul>						
<p><b>FLUSSI ORARI ATTRATTI E GENERATI</b></p>	<p>In base all'operatività delle macchine sopracitate, ed in considerazione di una produttività media oraria di circa 30 m<sup>3</sup>, i flussi attratti e generati per l'attività di demolizione delle lastre in cls risulta pari a:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Attività</th> <th style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Flussi Generati</th> <th style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Flussi Attratt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>Demolizione manufatti edilizi</i></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>	Attività	Flussi Generati	Flussi Attratt	<i>Demolizione manufatti edilizi</i>		
Attività	Flussi Generati	Flussi Attratt					
<i>Demolizione manufatti edilizi</i>							

## L11 Stoccaggio materiali provenienti dalle demolizioni



### Informazioni progettuali

<b>DESCRIZIONE</b>	<p>La lavorazione consiste nelle operazioni di stoccaggio e deposito dei materiali provenienti dalle demolizioni di edifici e pavimentazioni (rigide e flessibili).</p> <p>La lavorazione è composta da una singola attività elementare quale la movimentazione e l'accumulo del materiale all'interno dell'area di deposito mediante escavatore.</p>																
<b>ATTREZZATURE E MACCHINARI</b>	<p>Tipologia e numero di mezzi d'opera impiegati nella attività sono specificati nella tabella che segue. I dati sono riferiti alla squadra elementare, intesa come il numero minimo di mezzi necessari. Per ciascun mezzo si indicano inoltre le percentuali di funzionamento nel periodo temporale di riferimento pari ad 1 ora.</p> <table border="1" data-bbox="440 1003 1367 1211"> <thead> <tr> <th data-bbox="440 1003 655 1043">Tipo</th> <th data-bbox="655 1003 815 1043">Numero</th> <th colspan="5" data-bbox="815 1003 1198 1043">Operatività%</th> <th data-bbox="1198 1003 1367 1043">Contemp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="440 1043 655 1211">  Escavatore                 </td> <td data-bbox="655 1043 815 1211">1</td> <td data-bbox="815 1084 895 1151">20</td> <td data-bbox="895 1084 975 1151">40</td> <td data-bbox="975 1084 1054 1151">60</td> <td data-bbox="1054 1084 1134 1151">80</td> <td data-bbox="1134 1084 1198 1151">90</td> <td data-bbox="1198 1043 1367 1211">-</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Numero	Operatività%					Contemp	 Escavatore	1	20	40	60	80	90	-
Tipo	Numero	Operatività%					Contemp										
 Escavatore	1	20	40	60	80	90	-										
<b>FLUSSI ORARI ATTRATTI E GENERATI</b>	<p>Per lo stoccaggio dei materiali all'interno dell'area di deposito, la stima dei flussi attratti e generati dipende direttamente dal quantitativo di materiale demolito all'interno dei singoli cantieri.</p> <p>Tale fattore risulta di difficile stima in quanto dipende da parametri strettamente connessi alle dimensioni e alla tipologia delle opere da demolire (struttura, dimensione, etc.), nonché dall'organizzazione dei singoli cantieri.</p>																

## L12 Demolizione pavimentazioni in conglomerato cementizio



### Informazioni progettuali

#### DESCRIZIONE

La lavorazione consiste nella demolizione della pavimentazione in conglomerato cementizio compresa la sottofondazione fino ad una profondità massima di 2 metri. L'attività comprende anche il carico delle macerie derivanti su mezzi per l'allontanamento del materiale di risulta.

La lavorazione è composta da tre attività elementari:

- Demolizione degli strati superficiali in cls,
- Demolizione degli strati di base e di fondazione in misto cementato e di sottofondazione,
- Asportazione materiale e carico mezzi per allontanamento
- che si esplicano in due fasi temporali distinte:

#### **Fase 1**

- Demolizione degli strati superficiali in cls,
- Asportazione materiale e carico mezzi per allontanamento

#### **Fase 2**





- Demolizione strati di base e di fondazione in misto cementato e di sottofondazione.
- Asportazione materiale e carico mezzi per allontanamento

Per quanto riguarda la fase 2, questa è assimilabile per tipologia e metodo di lavorazione ad un'azione di scavo pertanto si rimanda alla relativa scheda di dettaglio

**ATTREZZATURE  
E  
MACCHINARI**

Tipologia e numero di mezzi d'opera impiegati nella attività sono specificati nella tabella che segue. I dati sono riferiti alla squadra elementare, intesa come il numero minimo di mezzi necessari. Per ciascun mezzo si indicano inoltre le percentuali di funzionamento nel periodo temporale di riferimento pari ad 1 ora.

**Fase 1**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Operatività%</b>	<b>Contemp.</b>
Demolitore 	1		NO
Terna 	1		NO

**Fase 2**

La tipologia, il numero e l'operatività dei mezzi impiegati per la demolizione e l'asportazione degli strati di base, fondazione e sottofondazione è assimilabile ad un'attività di scavo pertanto si rimanda alla relativa scheda di dettaglio.

**FLUSSI  
ATTRATTI  
E  
GENERATI**

In base all'operatività delle macchine sopracitate i flussi attratti e generati per l'attività di demolizione delle lastre in cls risulta pari a:

<b>Attività</b>	<b>Flussi Generati</b>	<b>Flussi Attratti</b>
Demolizione lastre cls		

## L13 Demolizione pavimentazioni in conglomerato Bituminoso



### Informazioni progettuali

#### DESCRIZIONE

La lavorazione consiste nella demolizione ed asportazione dello strato di usura e di quelli successivi in conglomerato bituminoso fino ad una profondità massia d 1 metro. L'attività comprende anche il carico delle macerie derivanti su mezzi per l'allontanamento del materiale di risulta.

La lavorazione è composta da tre attività elementari che si esplicano in due fasi temporali distinte:

#### Fase 1

- Demolizione dello strato di usura e binder
- Asportazione del materiale e carico mezzi per allontanamento.

#### Fase 2


- Demolizione strati di base e di sottofondazione
- Asportazione del materiale e carico mezzi per allontanamento

Per quanto riguarda la fase 2, questa è assimilabile per tipologia e metodo di lavorazione ad un'azione di scavo pertanto si rimanda alla relativa scheda di dettaglio.

#### ATTREZZATURE E MACCHINARI

Tipologia e numero di mezzi d'opera impiegati nella attività sono specificati nella tabella che segue. I dati sono riferiti alla squadra elementare, intesa come il numero minimo di mezzi necessari. Per ciascun mezzo si indicano inoltre le percentuali di funzionamento nel periodo temporale di riferimento pari ad 1 ora.

#### Fase 1



Tipo	Numero	Operatività%					Conten
	1	20	40	60	80	90	NO

#### Fase 2

La tipologia, il numero e l'operatività dei mezzi impiegati per la demolizione e l'asportazione degli strati di base, fondazione e sottofondazione è assimilabile ad un'attività di scavo pertanto si rimanda alla relativa scheda di dettaglio.

**FLUSSI  
ATTRATTI  
E  
GENERATI**

In base all'operatività delle macchine sopraccitate i flussi attratti e generati per l'attività di demolizione delle lastre in clb risulta pari a:

Attività	Flussi Generati	Flussi Attr
<i>Demolizione lastre clb</i>		

## **6.2 SCREENING AMBIENTALE**

### **6.2.1 LO SCREENING AMBIENTALE SPECIFICO**

Con riferimento a quanto esplicitato nella metodologia generale nella Sezione II, e specificatamente a quanto delineato nei paragrafi 4.3.1 e 4.3.3 si è reso necessario effettuare uno screening ambientale specifico, a partire da quanto già effettuato in termini generali, che tenesse conto delle specificità delle lavorazioni così come definite all'interno del par. 6.1.1.

A tale scopo sono state redatte delle specifiche schede ambientali di analisi delle lavorazioni con riferimento alle seguenti componenti ambientali:

- Atmosfera,
- Ambiente Idrico sotterraneo,
- Suolo e Sottosuolo,
- Rumore e Vibrazioni.

Nel paragrafo seguente si riportano le schede complete, che, per chiarezza espositiva vengono riassunte nel Par 6.2.3.

In coerenza alle schede progettuali, la sezione di "Aspetti Specifici" delle schede ambientali è tarata in funzione delle caratteristiche di valenza generale evidenziate per le schede progettuali stesse, pertanto, i singoli valori emissivi verranno dettagliati e calati ai singoli casi specifici così come definito nel Par. 7.




## 6.2.2 LE SCHEDE AMBIENTALI

### L01 Scavo di sbancamento



#### Informazioni ambientali

#### SCREENING DELLE COMPONENTI

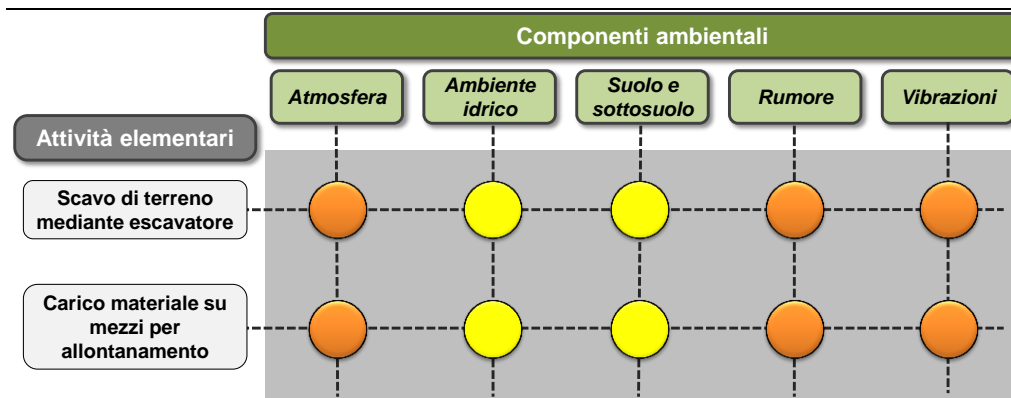

<input type="radio"/>	Componente non interessata dall'attività
<input checked="" type="radio"/>	Componente potenzialmente interessata dall'attività
<input checked="" type="radio"/>	Componente interessata

#### ASPETTI SPECIFICI




Per quanto riguarda il fenomeno delle emissioni di PM10 si fa riferimento ai dati dell'AP-42 Fifth edition Volume I è possibile attribuire un fattore di emissione all'attività specifica analizzata. In particolare, come previsto dalla metodologia, è necessario fare riferimento ad un fattore di emissione associabile o assimilabile per analogia di produzione di polveri alle attività sopradescritte. A tale scopo è possibile fare riferimento alla seguente formula valida per la movimentazione e lo stoccaggio di aggregati:

$$E = k(0.0016) \frac{\left(\frac{U}{2.2}\right)^{1.3}}{\left(\frac{M}{2}\right)^{1.4}} [kg/t]$$


Dall'applicazione della formula, in coerenza con i parametri utilizzati nello SIA, e conoscendo il numero di movimenti generati dall'attività, ovvero le tonnellate

ora trasportate, è possibile determinare l'emissione totale oraria correlata a tale attività pari a 7,2 grammi/ora.

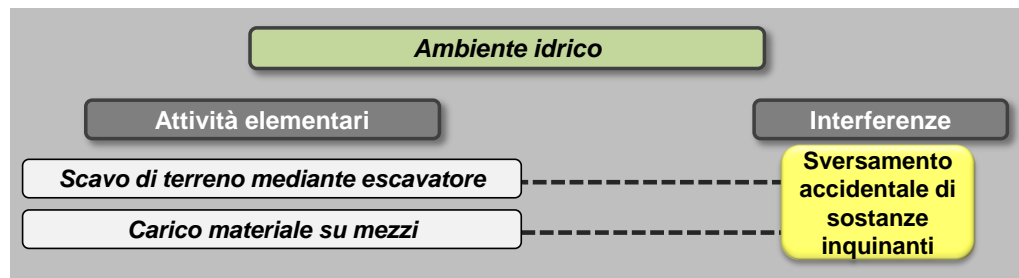


L'impiego di mezzi meccanici sia per l'attività di scavo che il successivo carico potrebbe comportare l'eventuale sversamento accidentale di sostanze nocive che, infiltrandosi nel terreno, potrebbero modificare la qualità delle acque sotterranee.

Il livello della falda presente all'interno del sedime aeroportuale complessivamente risulta prossimo al piano campagna, con quote variabili tra un minimo di 0,5 m s.l.m. ed un massimo di circa - 4 m s.l.m.

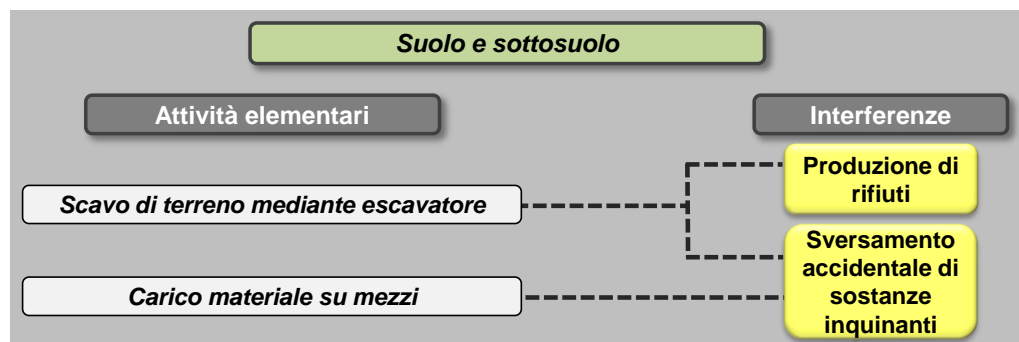

L'esecuzione dello scavo potrà comportare la produzione di rifiuti che eventualmente potranno essere recuperati e riutilizzati per la realizzazione di altre attività.

L'impiego di mezzi meccanici sia per l'attività di scavo che il successivo asporto e carico potrebbe comportare l'eventuale sversamento accidentale di sostanze nocive a terra e il conseguente inquinamento degli strati del suolo sia superficiali che profondi.

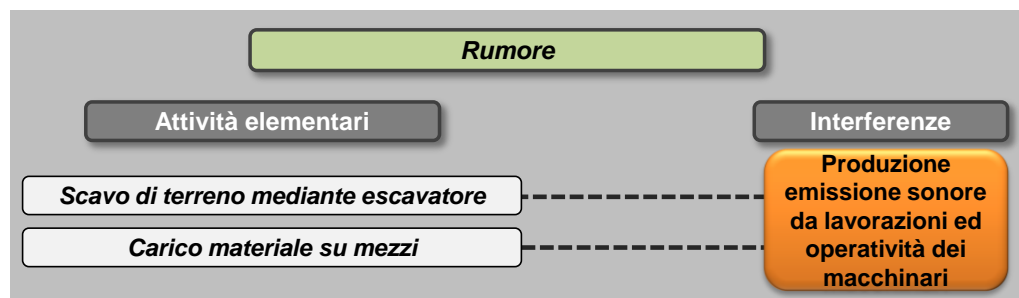

In funzione delle attività elementari individuate nella scheda progettuale relativa all'attività di scavo del terreno, i mezzi di cantiere impiegati sono l'escavatore per le azioni di scavo e la pala gommata per quelle di asportazione e carico su camion.

Sulla base delle specifiche della Direttiva 2000/14/EC per le principali macchine in uso durante i lavori di costruzione, i livelli di potenza sonora associati a ciascuna tipologia di macchinario risultano essere i seguenti:

<b>Tipologia di macchinario</b>	<b>Potenza Sonora <math>L_w</math> [dB(A)]</b>
<i>Escavatore</i>	103
<i>Pala gommata</i>	101

Le azioni elementari si svolgeranno in parallelo pertanto in fase di analisi dell'interferenza dovrà essere considerata anche la sovrapposizione degli eventi sonori.



In ognuna delle attività elementari sopra definite è previsto l'utilizzo di mezzi di cantiere. Per ciascun mezzo di cantiere si identificano i valori delle accelerazioni in funzione della frequenza.

Ai fini dello studio della componente Vibrazioni sono prese in riferimento le accelerazioni verticali associate ai singoli macchinari misurate a 5 metri dai macchinari stessi durante il loro esercizio.


	<b>Frequenza [Hz]</b>																			
	1	1,25	1,6	2	2,5	3,15	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40	50	63	80
<b>Pala gom. [mm/s<sup>2</sup>]</b>	0,7	0,5	0,6	0,6	0,6	0,4	0,3	1	4,9	3,9	2,4	2,7	1,6	3,1	20	27	34	35	38	39
<b>Escavatore [mm/s<sup>2</sup>]</b>	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,8	1,6	9,1	13	17	12	11	30	49	6,5

## L02 Scavo di sbancamento con aggotamento acque



### Informazioni ambientali


#### SCREENING DELLE COMPONENTI

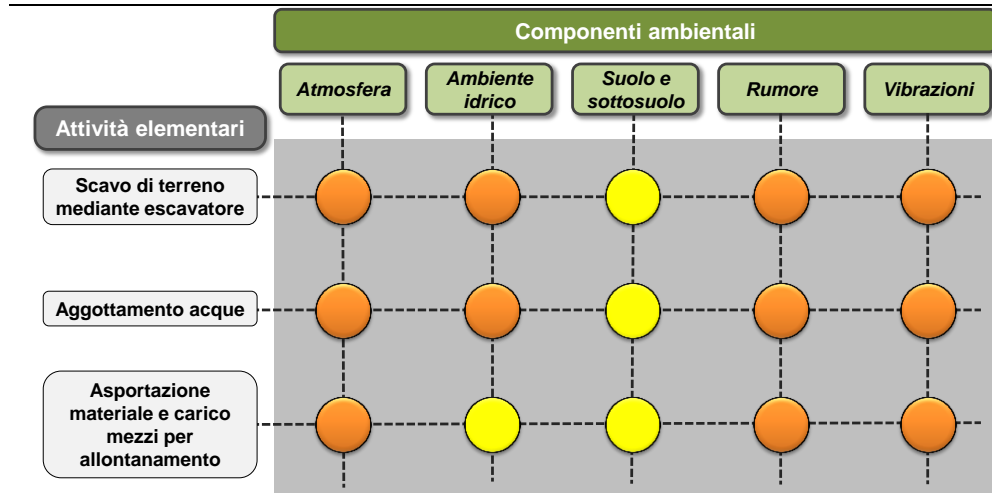

- Componente non interessata dall'attività
- Componente potenzialmente interessata dall'attività
- Componente interessata

Nota. Per tale attività la fase preliminare di preparazione dell'area di scavo non è stata considerata in quanto costituita da tre distinte lavorazioni trattate in specifiche schede: scavo, posa in opera degli elementi di confinamento e Rinterri.


#### ASPETTI SPECIFICI

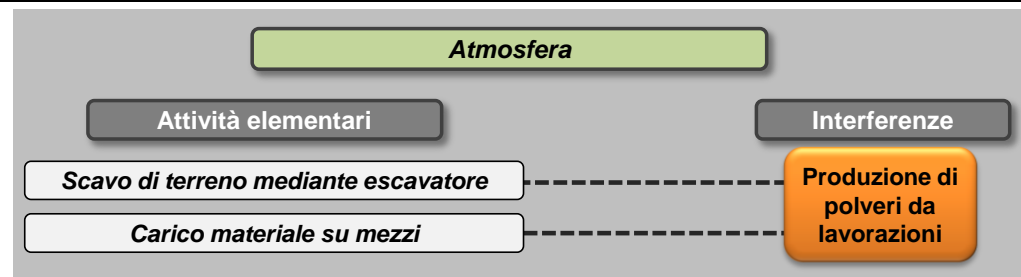

Per quanto riguarda il fenomeno delle emissioni di PM10 si fa riferimento ai dati dell'AP-42 Fifth edition Volume I è possibile attribuire un fattore di emissione all'attività specifica analizzata. In particolare, come previsto dalla metodologia, è necessario fare riferimento ad un fattore di emissione associabile o assimilabile per analogia di produzione di polveri alle attività sopradescritte. A tale scopo è possibile fare riferimento alla seguente formula valida per la movimentazione e lo stoccaggio di aggregati:

$$E = k(0.0016) \frac{\left(\frac{U}{2.2}\right)^{1.3}}{\left(\frac{M}{2}\right)^{1.4}} [kg/t]$$


Dall'applicazione della formula, in coerenza con i parametri utilizzati nello SIA, e conoscendo il numero di movimenti generati dall'attività, ovvero le tonnellate ora trasportate, è possibile determinare l'emissione totale oraria correlata a tale attività pari a 7,2 grammi/ora.

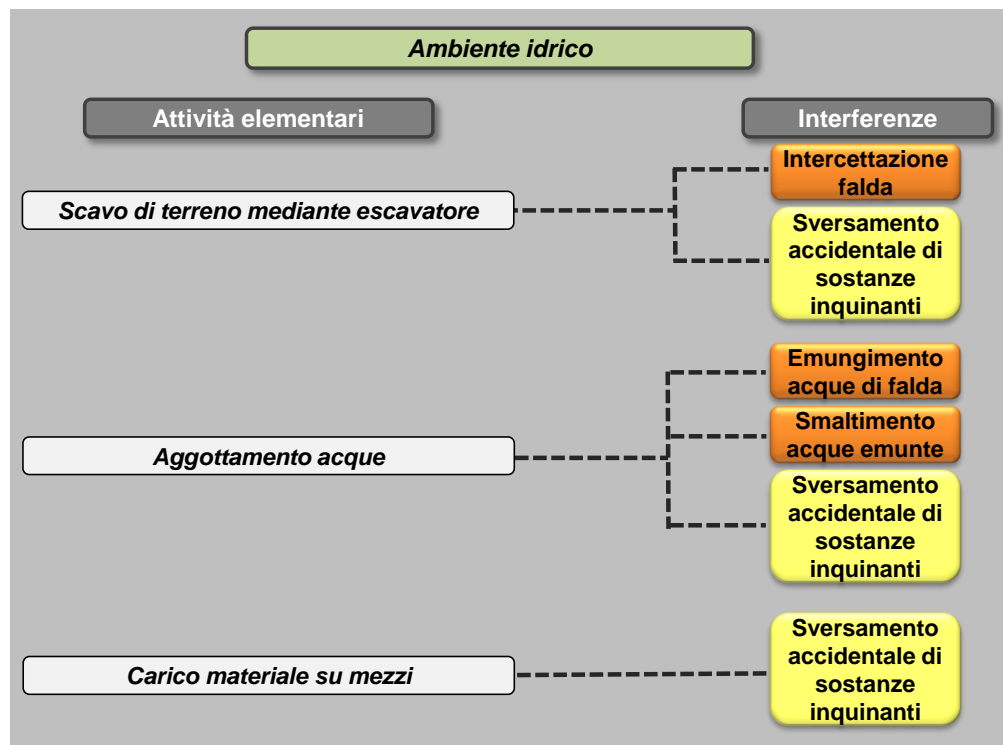

Il livello della falda presente all'interno del sedime aeroportuale complessivamente risulta prossimo al piano campagna, con quote variabili tra un minimo di 0,5 m s.l.m. ed un massimo di circa - 4 m s.l.m.


Nei casi in cui il piano di posa della fondazione si trovi al di sotto del livello di falda, sarà necessario mantenere il livello della superficie piezometrica almeno 50 cm al di sotto del piano di posa stesso; per tale attività potrà essere utilizzato un sistema "well-point" o di "trincee drenanti", che comporterà il prelievo delle acque sotterranee presenti nell'area e il loro smaltimento mediante recapito dai well point sino al corpo ricettore.

L'impiego di mezzi meccanici per lo svolgimento delle attività potrebbe comportare l'eventuale sversamento accidentale di sostanze nocive che, infiltrandosi nel terreno, potrebbero modificare la qualità delle acque sotterranee.

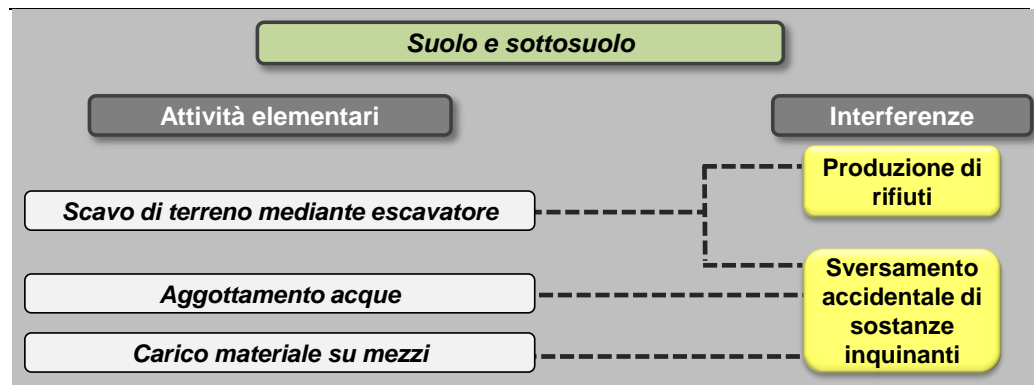

L'esecuzione dello scavo potrà comportare la produzione di rifiuti che eventualmente potranno essere recuperati e riutilizzati per la realizzazione di altre attività.

L'impiego di mezzi meccanici sia per l'attività di scavo che il successivo asporto e carico potrebbe comportare l'eventuale sversamento accidentale di sostanze nocive a terra e il conseguente inquinamento degli strati del suolo sia superficiali che profondi.

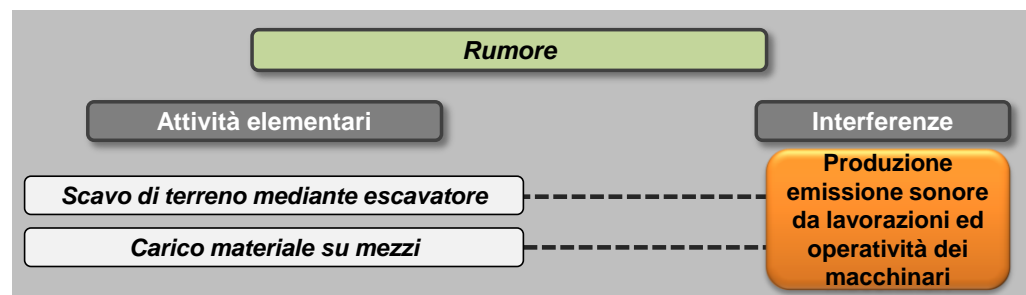

In funzione delle attività elementari individuate nella scheda progettuale relativa all'attività di scavo del terreno, i mezzi di cantiere impiegati sono l'escavatore per le azioni di scavo e la pala gommata per quelle di asportazione e carico su camion.

Sulla base delle specifiche della Direttiva 2000/14/EC per le principali macchine in uso durante i lavori di costruzione, i livelli di potenza sonora associati a ciascuna tipologia di macchinario risultano essere i seguenti:

Tipologia di macchinario	Potenza Sonora $L_w$ [dB(A)]
Escavatore	103
Pala gommata	101
Pompa	100

Le azioni elementari si svolgeranno in parallelo pertanto in fase di analisi dell'interferenza dovrà essere considerata anche la sovrapposizione degli eventi sonori.



In ognuna delle attività elementari sopra definite è previsto l'utilizzo di mezzi di cantiere. Per ciascun mezzo di cantiere si identificano i valori delle accelerazioni in funzione della frequenza.

Ai fini dello studio della componente Vibrazioni sono prese in riferimento le accelerazioni verticali associate ai singoli macchinari misurate a 5 metri dai macchinari stessi durante il loro esercizio.

	Frequenza [Hz]																			
	1	1,25	1,6	2	2,5	3,15	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40	50	63	80
<i>Pala gom. [mm/s<sup>2</sup>]</i>	0,7	0,5	0,6	0,6	0,6	0,4	0,3	1	4,9	3,9	2,4	2,7	1,6	3,1	20	27	34	35	38	39
<i>Escavatore [mm/s<sup>2</sup>]</i>	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,8	1,6	9,1	13	17	12	11	30	49	6,5

## L03 Palificazioni



### Informazioni ambientali

#### SCREENING DELLE COMPONENTI

Attività elementari	Componenti ambientali				
	Atmosfera	Ambiente idrico	Suolo e sottosuolo	Rumore	Vibrazioni
Trivellazione con utensile ad elica continua	○	●	●	●	○
Getto del calcestruzzo mediante pompa di getto collegata alla conchlea	○	●	●	●	○
Posa in opera dell'armatura a getto	○	●	●	●	○

○ Componente non interessata dall'attività  
 ● Componente potenzialmente interessata dall'attività  
 ● Componente interessata

#### ASPETTI SPECIFICI

##### Atmosfera

Le attività relative alla palificazione vengono svolte mediante l'utilizzo di eliche continue tali da indurre una drastica riduzione della quantità di terreno estratto, senza prevedere situazioni di scavo aperto.

##### Ambiente idrico

###### Attività elementari

Trivellazione con utensile ad elica continua

Getto del calcestruzzo

Posa in opera dell'armatura a getto


###### Interferenze

Sversamento accidentale di sostanze inquinanti

Le attività di palificazione vengono svolte senza l'utilizzo di fanghi bentonitici, polimeri o di tubi forma di rivestimento.




L'interferenza con l'ambiente idrico potrebbe aver luogo a causa dell'impiego di mezzi meccanici e di conseguenti sversamenti accidentali di sostanze nocive che, infiltrandosi nel terreno, potrebbero modificare la qualità delle acque sotterranee.

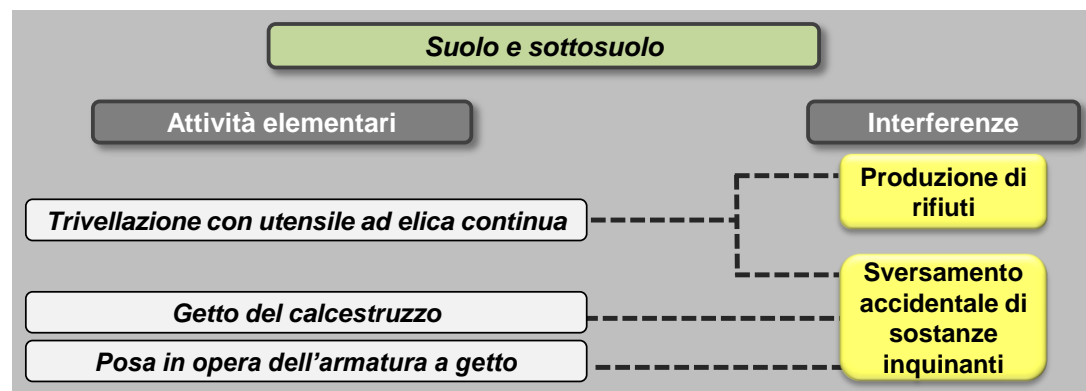

Le attività di palificazione vengono svolte senza l'utilizzo di fanghi bentonitici, polimeri o di tubi forma di rivestimento.

Dall'esecuzione della demolizione di strutture e delle componenti si avrà la produzione di rifiuti che eventualmente potranno essere recuperati e riutilizzati per la realizzazione di altre attività.

L'impiego di mezzi meccanici per l'attività di palificazione potrebbe comportare l'eventuale sversamento accidentale di sostanze nocive a terra e il conseguente inquinamento degli strati del suolo sia superficiali che profondi.

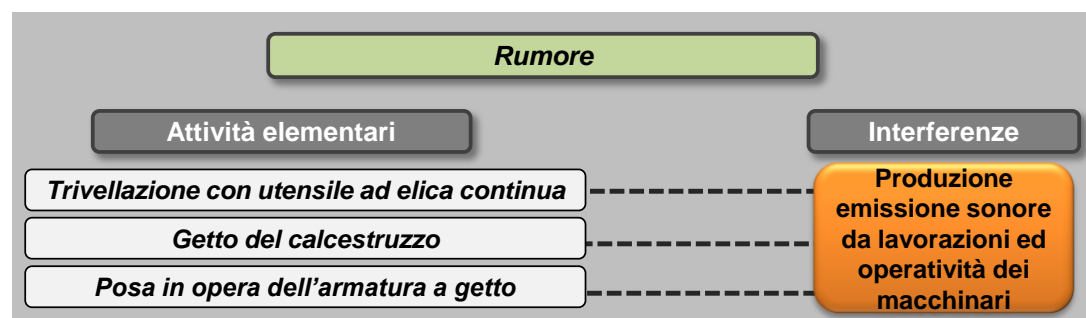

In funzione delle attività elementari individuate nella scheda progettuale relativa all'attività di palificazione, i mezzi di cantiere impiegati sono la trivellatrice per le azioni di scavo per la realizzazione di pali, la pompa necessaria per il getto di cls e l'autogru per la movimentazione delle armature.

Sulla base delle specifiche della Direttiva 2000/14/EC per le principali macchine in uso durante i lavori di costruzione, i livelli di potenza sonora associati a ciascuna tipologia di macchinario risultano i seguenti:

Tipologia di macchinario	Potenza Sonora $L_w$ [dB(A)]
Trivellatrice	105

<i>Pompa CLS</i>	100
<i>Autogru</i>	100

***Vibrazioni***


Data la tecnica impiegata di palificazione CFA, le interferenze vibrazionali possono essere considerate trascurabili

## L04 Realizzazione di fondazioni



### Informazioni ambientali

#### SCREENING DELLE COMPONENTI

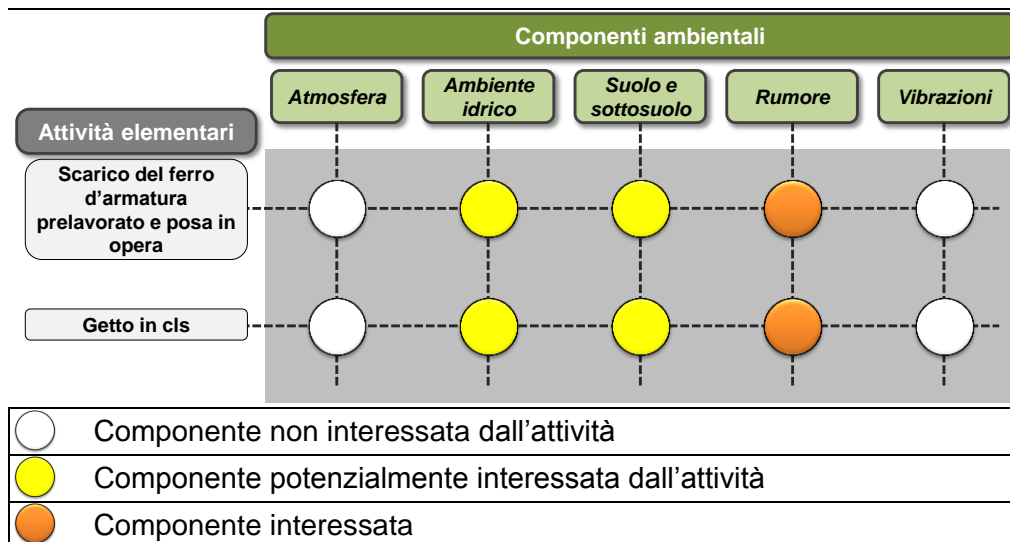


#### ASPETTI SPECIFICI


##### Atmosfera

La produzione di polveri durante lo svolgimento della realizzazione delle fondazioni può essere ritenuta trascurabile.


##### Ambiente idrico

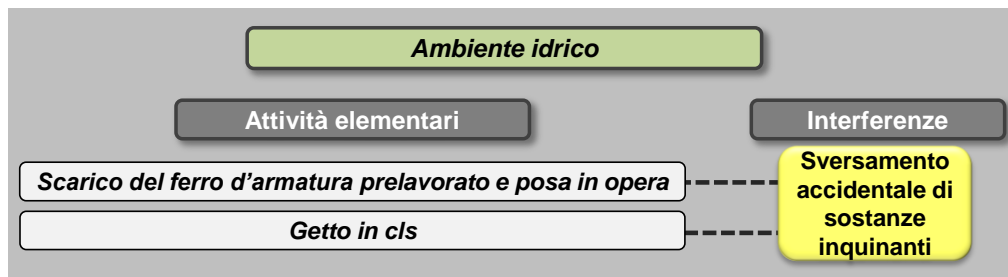

L'attività di realizzazione delle fondazioni prevede l'impiego di mezzi meccanici che potrebbe comportare l'eventuale sversamento accidentale di sostanze nocive che, infiltrandosi nel terreno, potrebbero modificare la qualità delle acque sotterranee.

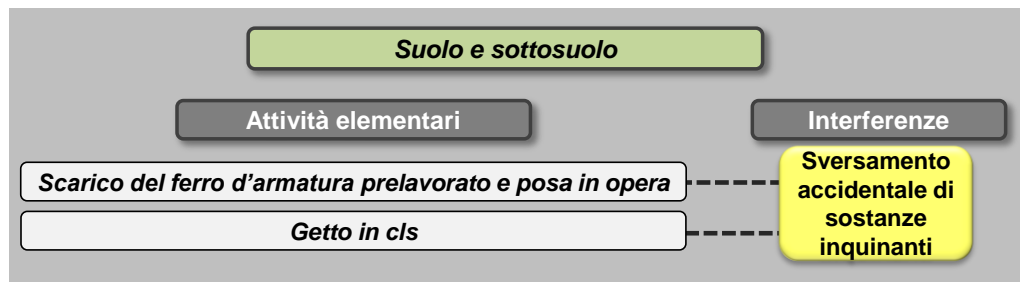

L'impiego di mezzi meccanici per l'attività di formazione delle fondazioni e potrebbe comportare l'eventuale sversamento accidentale di sostanze nocive a terra e il conseguente inquinamento degli strati del suolo sia superficiali che profondi.

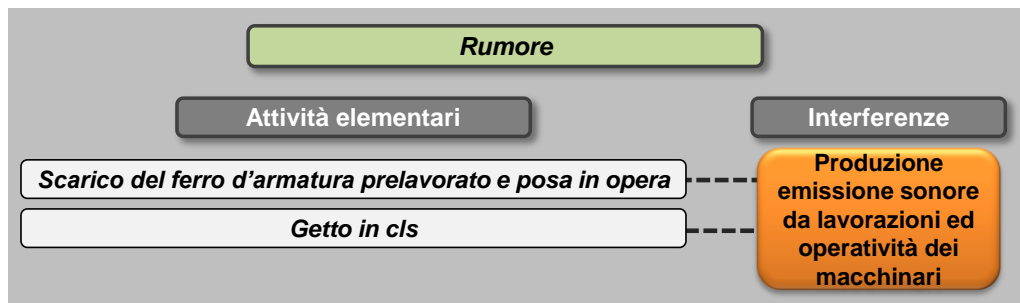

Per la movimentazione dei ferri d'armatura prelaborati verrà impiegata una gru a torre o una autogru in funzione delle dimensioni degli elementi. La scelta della tipologia di macchinario sarà oggetto di valutazioni specifiche durante l'analisi delle interferenze associate a ciascun cantiere. Il cls verrà altresì gettato attraverso opportune pompe.

Sulla base delle specifiche della Direttiva 2000/14/EC per le principali macchine in uso durante i lavori di costruzione, i livelli di potenza sonora associati a ciascuna tipologia di macchinario risultano i seguenti:

Tipologia di macchinario	Potenza Sonora $L_w$ [dB(A)]
Pompa CLS	100
Autogru	100

### Vibrazioni


Stante la tipologia di macchinari impiegati le interferenze vibrazionali possono essere in questo caso trascurabili.

## L05 Rinterri




### Informazioni ambientali

#### SCREENING DELLE COMPONENTI

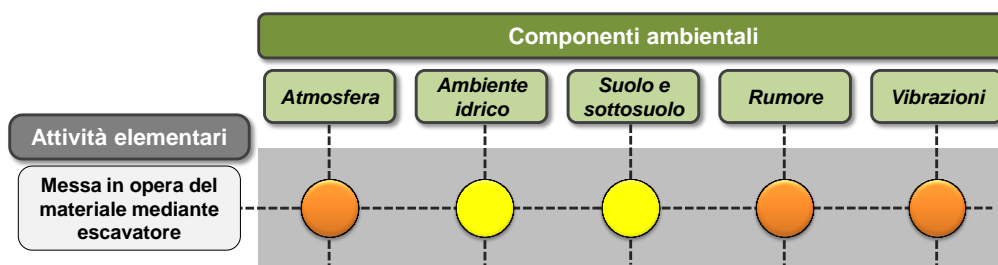

<input type="radio"/>	Componente non interessata dall'attività
<input checked="" type="radio"/>	Componente potenzialmente interessata dall'attività
<input checked="" type="radio"/>	Componente interessata


#### ASPETTI SPECIFICI

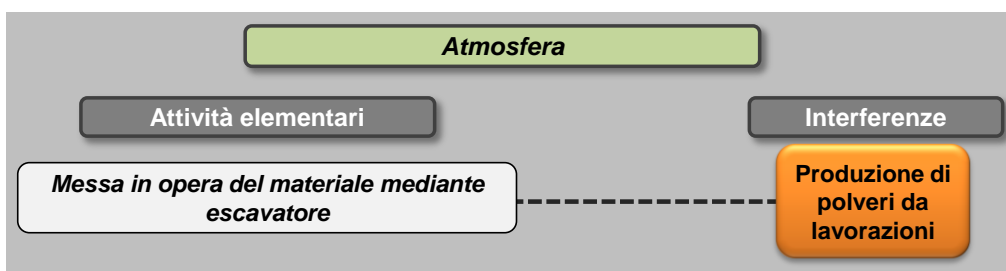


Per quanto riguarda il fenomeno delle emissioni di PM10 si fa riferimento ai dati dell'AP-42 Fifth edition Volume I è possibile attribuire un fattore di emissione all'attività specifica analizzata. In particolare, come previsto dalla metodologia, è necessario fare riferimento ad un fattore di emissione associabile o assimilabile per analogia di produzione di polveri alle attività sopradescritte. A tale scopo è possibile fare riferimento alla seguente formula valida per la movimentazione e lo stoccaggio di aggregati:

$$E = k(0.0016) \frac{\left(\frac{U}{2.2}\right)^{1.3}}{\left(\frac{M}{2}\right)^{1.4}} [kg/t]$$


Dall'applicazione della formula, in coerenza con i parametri utilizzati nello SIA, e conoscendo il numero di movimenti generati dall'attività, ovvero le tonnellate ora trasportate, è possibile determinare l'emissione totale oraria correlata a tale attività pari a 7,2 grammi/ora.

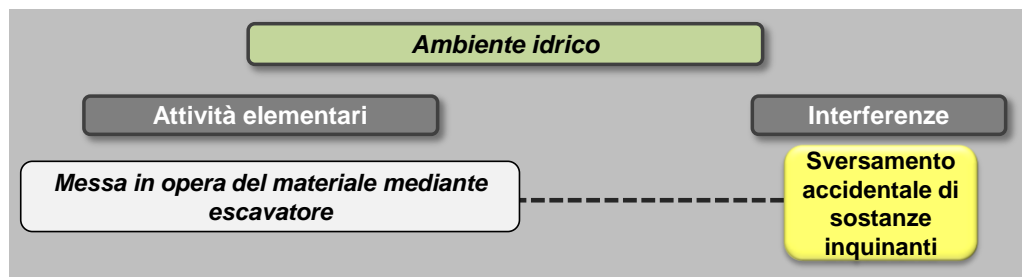

L'impiego di mezzi meccanici per la messa in opera del materiale potrebbe comportare l'eventuale sversamento accidentale di sostanze nocive che, infiltrandosi nel terreno, potrebbero modificare la qualità delle acque sotterranee.

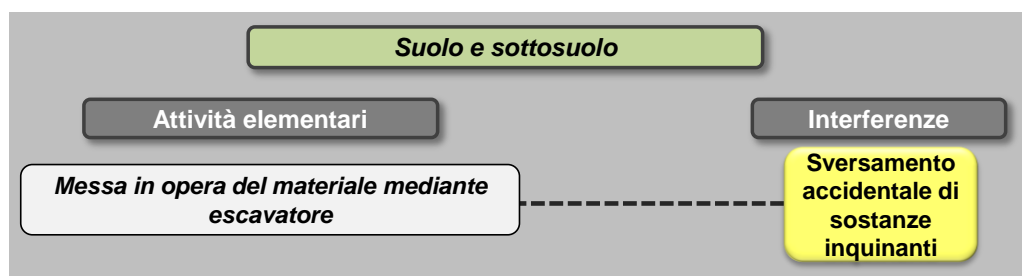


L'impiego di mezzi meccanici sia per la messa in opera del materiale potrebbe comportare l'eventuale sversamento accidentale di sostanze nocive a terra e il conseguente inquinamento degli strati del suolo sia superficiali che profondi.

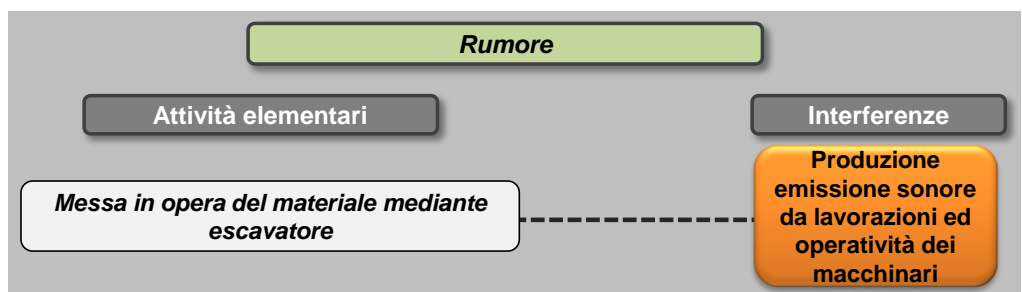

Per l'esecuzione dei rinterri, la messa in opera e la stesa del materiale verrà utilizzato l'escavatore.

Sulla base delle specifiche della Direttiva 2000/14/EC per le principali macchine in uso durante i lavori di costruzione, i livelli di potenza sonora associati a ciascuna tipologia di macchinario risultano essere i seguenti:

Tipologia di macchinario	Potenza Sonora $L_w$ [dB(A)]
Escavatore	103

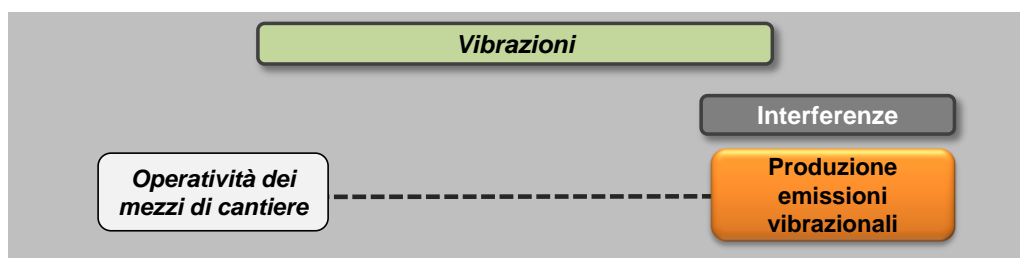

In ognuna delle attività elementari sopra definite è previsto l'utilizzo di mezzi di cantiere. Per ciascun mezzo di cantiere si identificano i valori delle accelerazioni in funzione della frequenza.

Ai fini dello studio della componente Vibrazioni sono prese in riferimento le accelerazioni verticali associate ai singoli macchinari misurate a 5 metri dai macchinari stessi durante il loro esercizio.


	Frequenza [Hz]																			
	1	1,25	1,6	2	2,5	3,15	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40	50	63	80
Escavatore [mm/s <sup>2</sup> ]	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,8	1,6	9,1	13	17	12	11	30	49	6,5

## L06 Realizzazione di elementi strutturali in elevazione gettati in opera



### Informazioni ambientali

#### SCREENING DELLE COMPONENTI

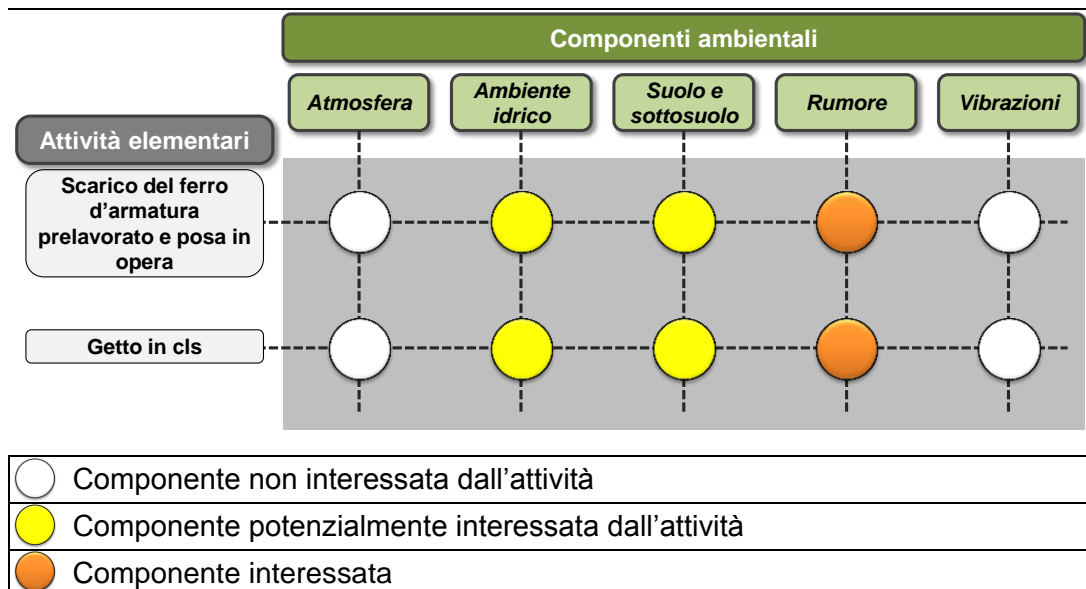

#### ASPETTI SPECIFICI

##### Atmosfera

La produzione di polveri durante lo svolgimento della realizzazione delle fondazioni può essere ritenuta trascurabile.

##### Ambiente idrico

###### Attività elementari

Scarico del ferro d'armatura prelaborato e posa in opera


Getto in cls

###### Interferenze


Sversamento accidentale di sostanze inquinanti

L'attività di realizzazione delle fondazioni prevede l'impiego di mezzi meccanici che potrebbe comportare l'eventuale sversamento accidentale di sostanze nocive che, infiltrandosi nel terreno, potrebbero modificare la qualità delle acque sotterranee.



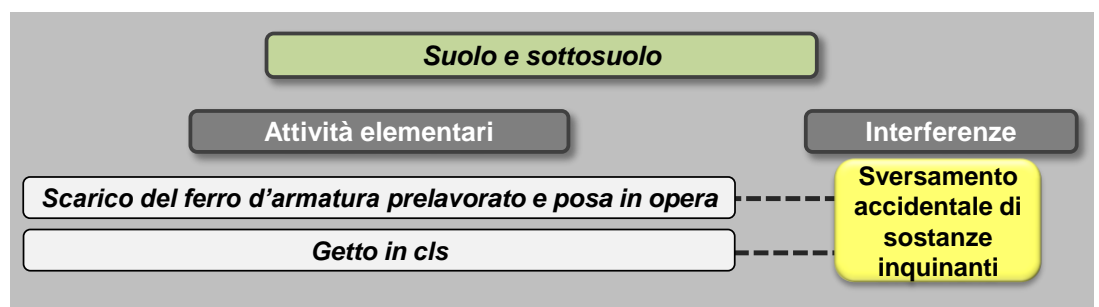

L'impiego di mezzi meccanici per l'attività di formazione delle fondazioni e potrebbe comportare l'eventuale sversamento accidentale di sostanze nocive a terra e il conseguente inquinamento degli strati del suolo sia superficiali che profondi.

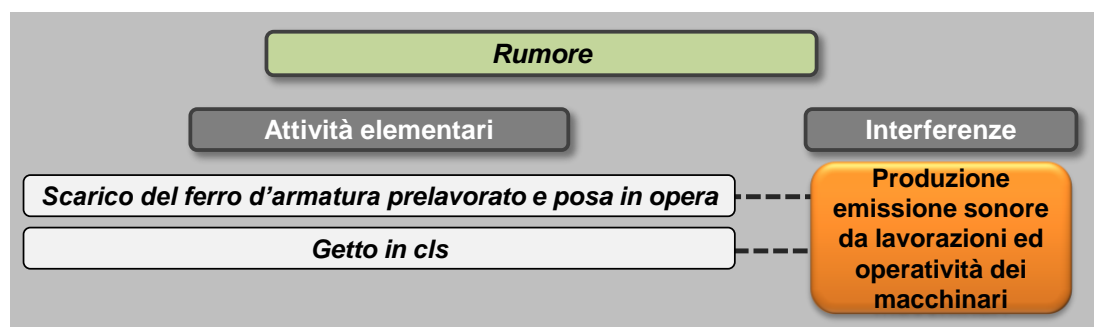

Per la movimentazione dei ferri d'armatura prelaborati verrà impiegata una gru a torre o una autogru in funzione delle dimensioni degli elementi. La scelta della tipologia di macchinario sarà oggetto di valutazioni specifiche durante l'analisi delle interferenze associate a ciascun cantiere. Il cls verrà altresì gettato attraverso opportune pompe.

Sulla base delle specifiche della Direttiva 2000/14/EC per le principali macchine in uso durante i lavori di costruzione, il livelli di potenza sonora associati a ciascuna tipologia di macchinario risultano i seguenti:

Tipologia di macchinario	Potenza Sonora $L_w$ [dB(A)]
Gru	101
Pompa CLS	100
Autogru	100

### Vibrazioni


Stante la tipologia di macchinari impiegati le interferenze vibrazionali possono essere considerate trascurabili.

## L07 Posa in opera elementi prefabbricati



### Informazioni ambientali

#### SCREENING DELLE COMPONENTI

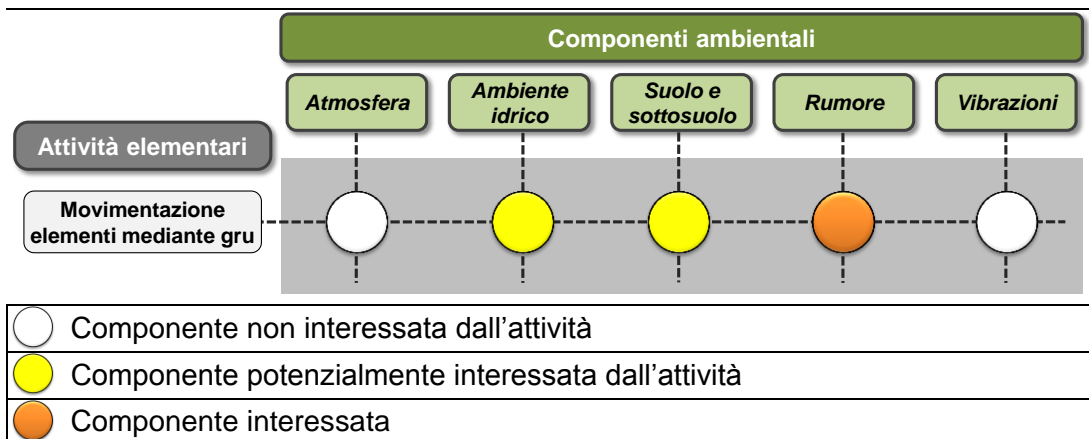

#### ASPETTI SPECIFICI

##### Atmosfera

Le interferenze sulla componente atmosfera possono essere considerate trascurabili, poiché l'attività in esame non comporta la produzione di polveri.

##### Ambiente idrico


###### Attività elementari

###### Interferenze


Movimentazione elementi mediante gru

Sversamento  
accidentale di  
sostanze  
inquinanti

L'impiego di mezzi meccanici per la posa in opera degli elementi prefabbricati potrebbe comportare l'eventuale sversamento accidentale di sostanze nocive che, infiltrandosi nel terreno, potrebbero modificare la qualità delle acque sotterranee.

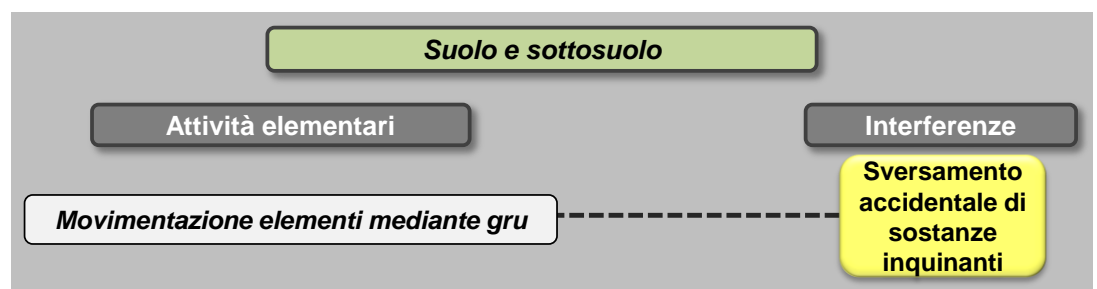

L'impiego di mezzi meccanici per la posa in opera degli elementi prefabbricati potrebbe comportare l'eventuale sversamento accidentale di sostanze nocive a terra e il conseguente inquinamento degli strati del suolo sia superficiali che profondi.

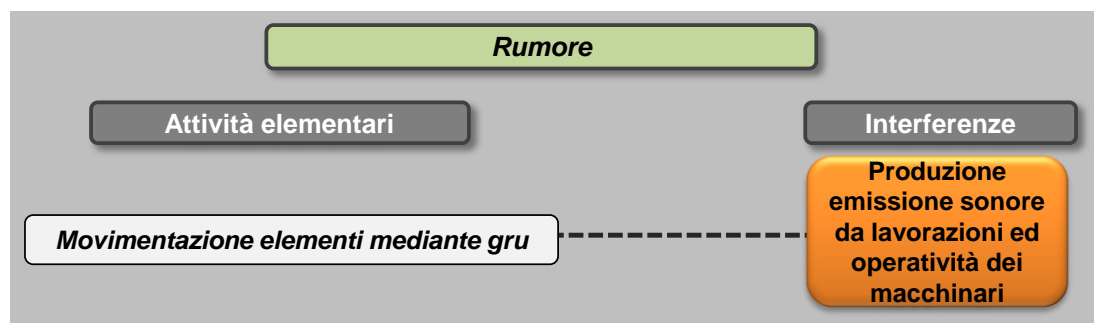

La posa in opera di elementi prefabbricati comporta l'utilizzo di gru a torre o autogru a seconda delle dimensioni e delle quantità dei materiali costituenti i fabbisogni.

Sulla base delle specifiche della Direttiva 2000/14/EC per le principali macchine in uso durante i lavori di costruzione, i livelli di potenza sonora associati a ciascuna tipologia di macchinario risultano essere i seguenti:

<b>Tipologia di macchinario</b>	<b>Potenza Sonora <math>L_w</math> [dB(A)]</b>
<i>Autogru</i>	100
<i>Gru a torre</i>	101

La scelta della tipologia di macchinario sarà oggetto di valutazioni specifiche durante l'analisi delle interferenze associate a ciascun cantiere.

### **Vibrazioni**


Stante la tipologia di macchinari impiegati le interferenze vibrazionali possono essere in questo caso trascurabili.

## L08 Trasporto dei materiali




### Informazioni ambientali

#### SCREENING DELLE COMPONENTI

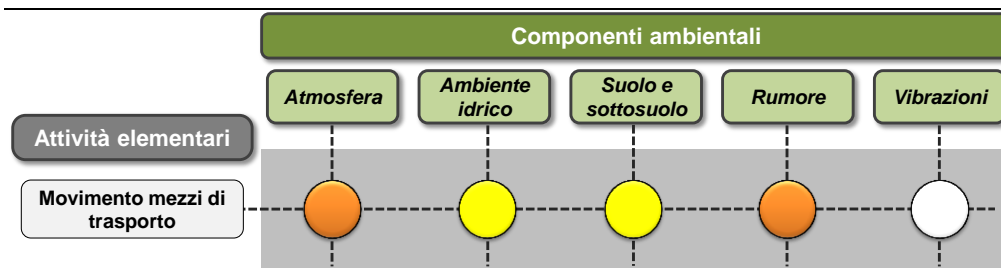

<input type="radio"/>	Componente non interessata dall'attività
<input checked="" type="radio"/>	Componente potenzialmente interessata dall'attività
<input checked="" type="radio"/>	Componente interessata

#### ASPETTI SPECIFICI

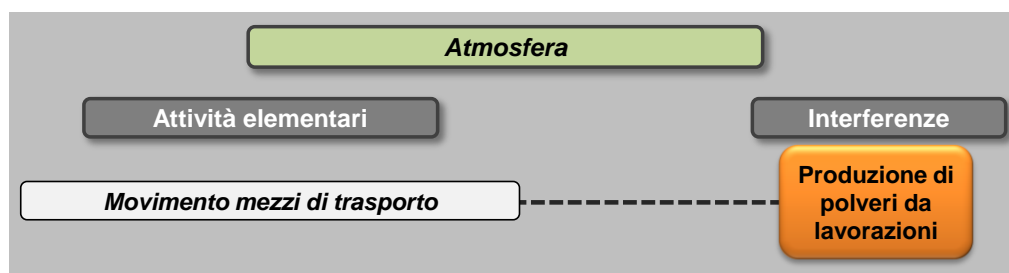

Con riferimento all'attività di movimentazione dei mezzi di trasporto dei materiali si deve fare riferimento non solo alla produzione delle polveri bensì all'intera gamma di inquinanti.


Per la determinazione dei fattori di emissione si è fatto riferimento al modello Copert IV considerando due velocità medie differenti per i percorsi interni e per i percorsi esterni, rispettivamente pari a 30 km/h e 60 km/h.

Per quanto riguarda la tipologia del mezzo si è fatto riferimento ad un autocarro classe tra le 20 e le 26 tonnellate, in due configurazioni differenti Euro IV e Euro V.


	NO <sub>x</sub>		PM <sub>10</sub>		CO	
	Euro IV [g/km]	Euro V [g/km]	Euro IV [g/km]	Euro V [g/km]	Euro IV [g/km]	Euro V [g/km]
Percorsi interni	5.529	6.545	0.045	0.047	1.112	1.889
Percorsi esterni	4.223	2.886	0.031	0.028	0.728	1.331

L'emissione oraria del singolo camion risulta pertanto pari a quanto riportato nella tabella sottostante.


	NOx		PM10		CO	
	Euro IV [g/km]	Euro V [g/km]	Euro IV [g/km]	Euro V [g/km]	Euro IV [g/km]	Euro V [g/km]
<i>Percorsi interni</i>	165.9	196.4	1.4	1.4	33.4	56.7
<i>Percorsi esterni</i>	126.7	86.6	0.9	0.8	21.8	39.9

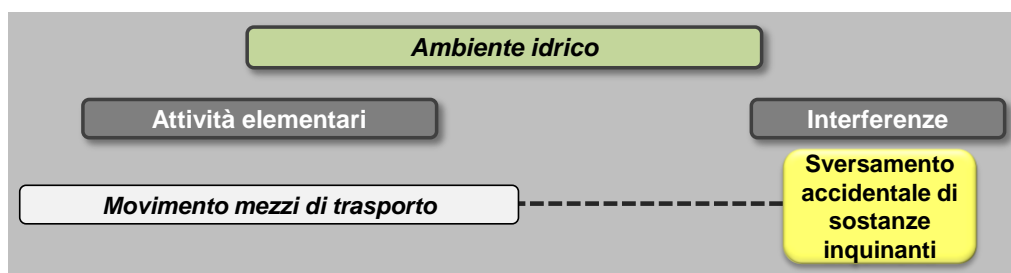

Il trasporto dei materiali prevede l'impiego di mezzi meccanici che potrebbe comportare l'eventuale sversamento accidentale di sostanze nocive che, infiltrandosi nel terreno, potrebbero modificare la qualità delle acque sotterranee.

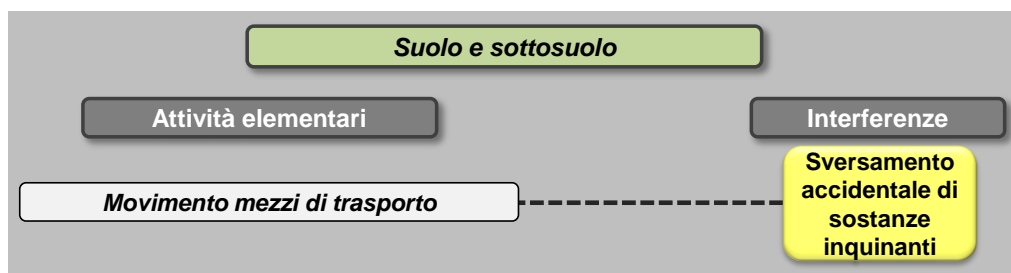

L'impiego di mezzi meccanici per il trasporto dei materiali potrebbe comportare l'eventuale sversamento accidentale di sostanze nocive a terra e il conseguente inquinamento degli strati del suolo sia superficiali che profondi.

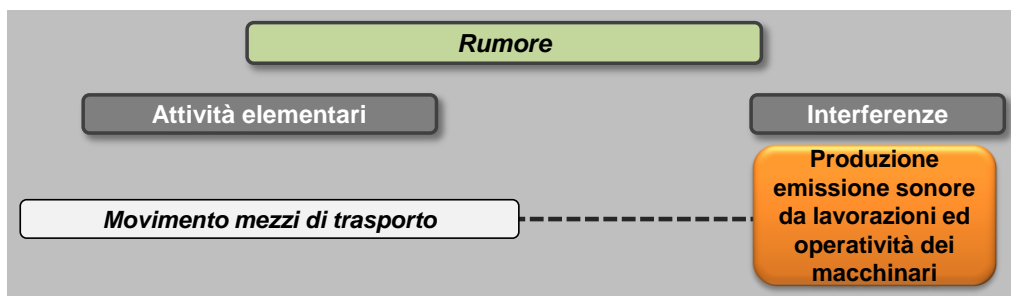

Le azioni connesse alla movimentazione dei materiali implicheranno flussi veicolari all'interno e all'esterno del sedime aeroportuale.

---

L'emissione sonora indotta dai veicoli è funzione della velocità di percorrenza, del tipo di asfalto, delle condizioni di funzionamento del motore.

Attraverso la metodologia NMPB Routes, utilizzata per la stima della rumorosità indotta da traffico veicolare, sono state individuate due potenze sonore associate ai mezzi pesanti a due velocità di percorrenza differenti (una caratteristica dei percorsi interni, l'altra invece a quelli esterni al sedime).

<b>Tipologia di macchinario</b>	<b>Velocità media</b>	<b>Potenza Sonora <math>L_w</math> [dB(A)]</b>
<i>Camion (percorsi esterni)</i>	60 km/h	53,15
<i>Camion (percorsi interni)</i>	30 km/h	50,76

La stima dei livelli di emissione complessivi dipenderà dal numero di movimenti associato a ciascuna lavorazione e dai percorsi effettivi in funzione dell'ubicazione dei cantieri.

### **Vibrazioni**

Stante la tipologia di macchinari impiegati le interferenze vibrazionali possono essere in questo caso trascurabili.


---

## L09 Demolizione manufatti edilizi con tecnica tradizionale




### Informazioni ambientali

#### SCREENING DELLE COMPONENTI

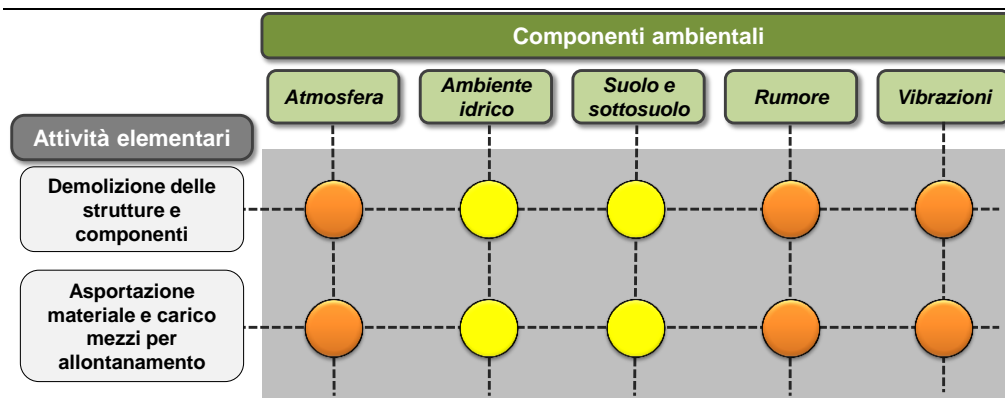

○	Componente non interessata dall'attività
●	Componente potenzialmente interessata dall'attività
●	Componente interessata

#### ASPETTI SPECIFICI

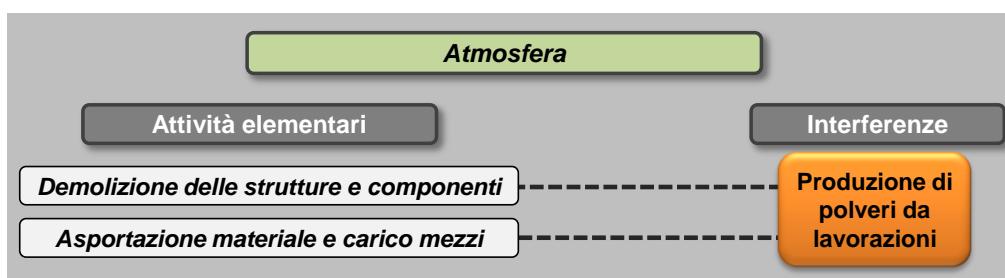

Per quanto riguarda il fenomeno delle emissioni di PM10 si fa riferimento ai dati dell'AP-42 Fifth edition Volume I è possibile attribuire un fattore di emissione all'attività specifica analizzata. In particolare, come previsto dalla metodologia, è necessario fare riferimento ad un fattore di emissione associabile o assimilabile per analogia di produzione di polveri alle attività sopradescritte.

A tale scopo è possibile fare riferimento alla seguente formula valida per la movimentazione e lo stoccaggio di aggregati:


$$E = k(0.0016) \frac{\left(\frac{U}{2.2}\right)^{1.3}}{\left(\frac{M}{2}\right)^{1.4}} [kg/t]$$

Dall'applicazione della formula, in coerenza con i parametri utilizzati nello SIA, e conoscendo il numero di movimenti generati dall'attività, ovvero le tonnellate

ora trasportate, è possibile determinare l'emissione totale oraria correlata a tale attività pari a 1.6 grammi/ora.

#### Bagnatura delle strutture mediante impianto di nebulizzazione mobile

Al fine di ridurre le emissioni di polveri, è prevista la bagnatura delle strutture mediante impianto di nebulizzazione mobile.

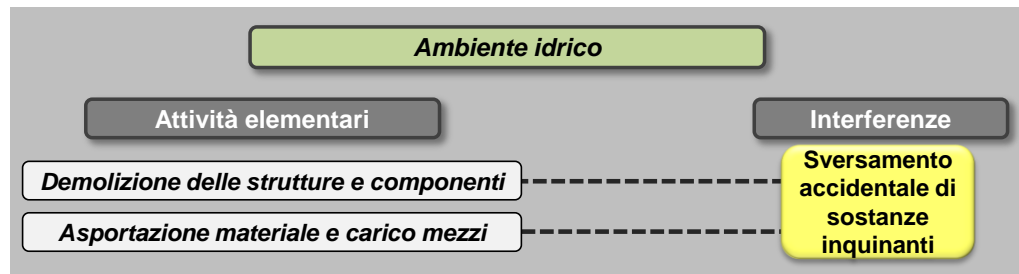


L'impiego di mezzi meccanici sia per l'attività di demolizione che il successivo asporto e carico potrebbe comportare l'eventuale sversamento accidentale di sostanze nocive che, infiltrandosi nel terreno, potrebbero modificare la qualità delle acque sotterranee.

Il livello della falda presente all'interno del sedime aeroportuale complessivamente risulta prossimo al piano campagna, con quote variabili tra un minimo di 0,5 m s.l.m. ed un massimo di circa – 4 m s.l.m.

La presente attività consiste nella sola demolizione/scomposizione delle strutture; qualora l'attività di demolizione preveda l'attività di scavo, e in particolare in zone con potenziale presenza di falda acquifera, si rimanda all'attività specifica *L06 Scavo di sbancamento con aggotamento acque*.


Per quanto riguarda le eventuali acque di ruscellamento prodotte dalle attività di bagnatura degli elementi da demolire/rimuovere, queste saranno intercettate dalle canalette di raccolta acque e inviate al pozzetto per essere recapitate all'impianto di trattamento costituito da sedimentazione e disoleatore prima dell'immissione nelle fognature esistenti.

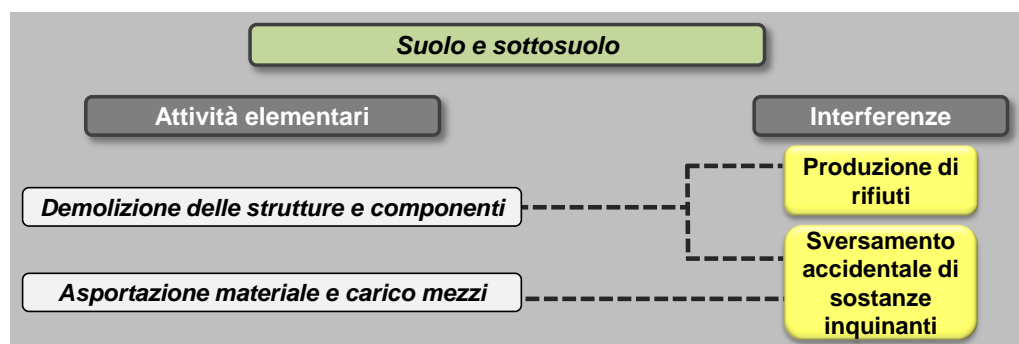



Dall'esecuzione della demolizione delle strutture si avrà la produzione di rifiuti che eventualmente potranno essere recuperati e riutilizzati per la realizzazione di altre attività.

L'impiego di mezzi meccanici sia per l'attività di demolizione che il successivo asporto e carico potrebbe comportare l'eventuale sversamento accidentale di sostanze nocive a terra e il conseguente inquinamento degli strati del suolo sia superficiali che profondi.

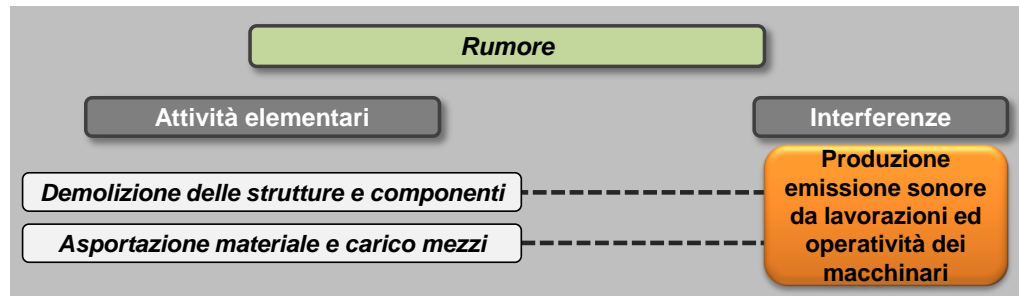

In funzione delle attività elementari individuate nella scheda progettuale relativa all'attività di demolizione, mezzi di cantiere impiegati sono il demolitore per lo smantellamento dei diversi elementi costituenti i manufatti e l'escavatore per l'asportazione degli inerti e successivo carico su camion. Sulla base delle specifiche della Direttiva 2000/14/EC per le principali macchine in uso durante i lavori di costruzione, i livelli di potenza sonora associati a ciascuna tipologia di macchinario risultano i seguenti:

<b>Tipologia di macchinario</b>	<b>Potenza Sonora <math>L_w</math> [dB(A)]</b>
<i>Demolitore</i>	105
<i>Escavatore</i>	103
<i>Autobotte</i>	95



In ognuna delle attività elementari sopra definite è previsto l'utilizzo di mezzi di cantiere. Per ciascun mezzo di cantiere si identificano i valori delle accelerazioni in funzione della frequenza. Per quanto riguarda l'autobotte le emissioni vibrazionali possono essere assimilate a quelle di un autocarro.

Ai fini dello studio della componente Vibrazioni sono prese in riferimento le accelerazioni verticali associate ai singoli macchinari misurate a 5 metri dai macchinari stessi durante il loro esercizio.


	Frequenza [Hz]																			
	1	1,25	1,6	2	2,5	3,15	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40	50	63	80
<i>Escavatore</i> [mm/s <sup>2</sup> ]	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,8	1,6	9,1	13	17	12	11	30	49	6,5
<i>Demolitore</i> [mm/s <sup>2</sup> ]	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	17	17	17	16	23	13	3	3,1	3,7	3,9	22	28	111	53
<i>Camion</i> [mm/s <sup>2</sup> ]	0,8	1,1	0,7	0,5	0,5	0,4	0,3	1,1	2	2	2,1	5,6	3,3	3,3	3,3	2,1	1,4	0,9	1,1	1,4

## L10 Demolizione manufatti edilizi con tecnica controllata



### Informazioni ambientali

#### SCREENING DELLE COMPONENTI

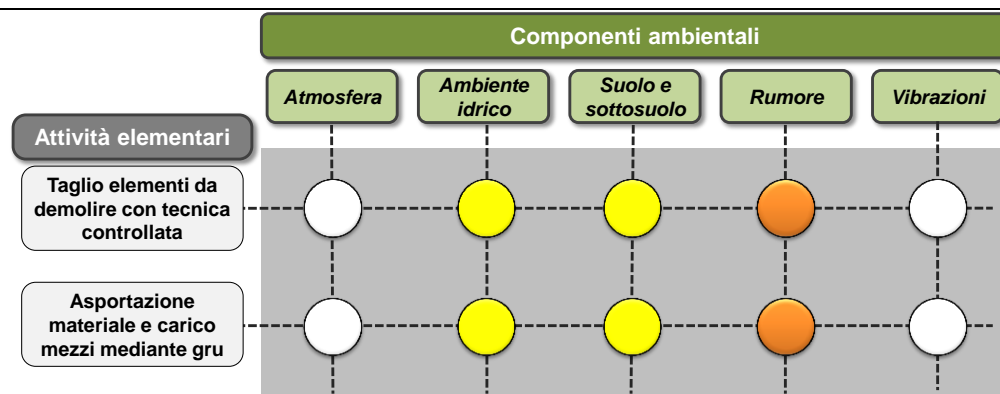

- Componente non interessata dall'attività
- Componente potenzialmente interessata dall'attività
- Componente interessata


#### ASPETTI SPECIFICI

##### Atmosfera

Nel caso specifico di attività di demolizione controllata, la componente atmosfera può essere trascurata in quanto tali tecniche di demolizione prevedono la rimozione "per smontaggio".

##### Bagnatura delle strutture mediante impianto di nebulizzazione mobile


Al fine di ridurre le emissioni di polveri, è prevista la bagnatura delle strutture mediante impianto di nebulizzazione mobile.

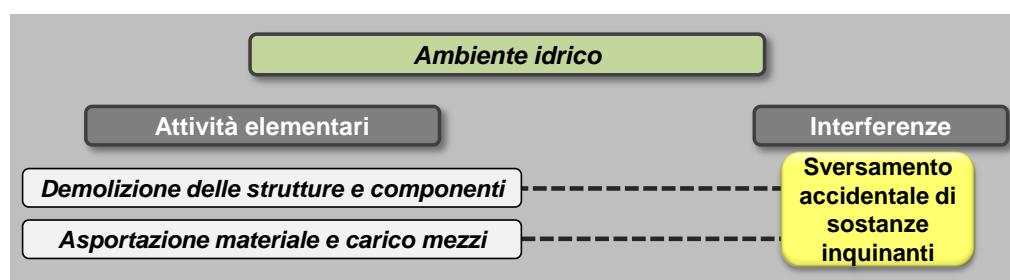


L'impiego di mezzi meccanici sia per l'attività di taglio degli elementi da demolire con tecnica controllata e il successivo asporto e carico potrebbe comportare l'eventuale sversamento accidentale di sostanze nocive che,

infiltrandosi nel terreno, potrebbero modificare la qualità delle acque sotterranee.

Per quanto riguarda le eventuali acque di ruscellamento prodotte dalle attività di bagnatura degli elementi da demolire/rimuovere, queste saranno intercettate dalle canalette di raccolta acque e inviate al pozzetto per essere recapitate all'impianto di trattamento costituito da sedimentazione e disoleatore prima dell'immissione nelle fognature esistenti.

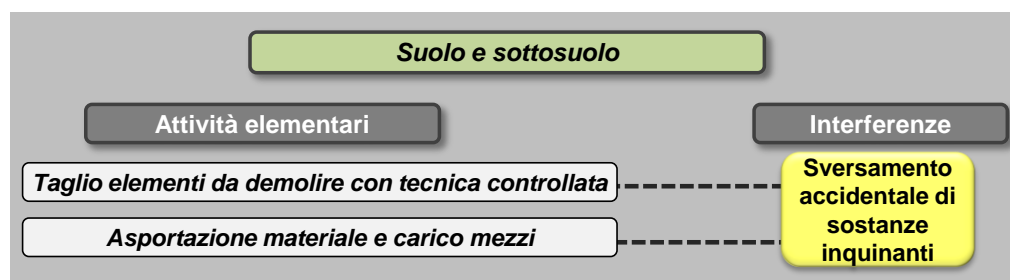

L'impiego di mezzi meccanici sia per l'attività di demolizione che il successivo asporto e carico potrebbe comportare l'eventuale sversamento accidentale di sostanze nocive a terra e il conseguente inquinamento degli strati del suolo sia superficiali che profondi.

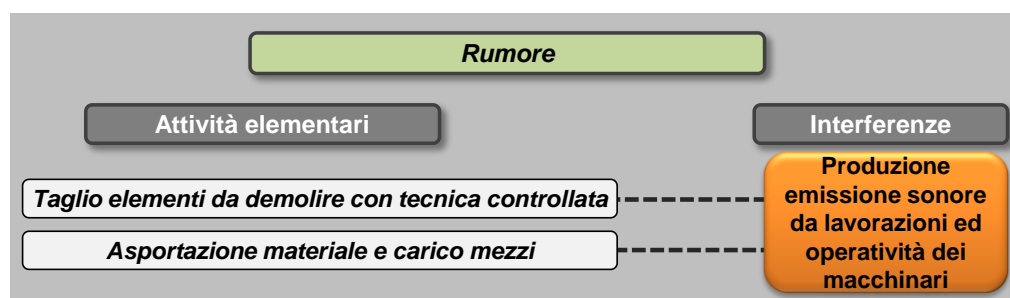

In funzione delle attività elementari individuate nella scheda progettuale relativa all'attività di demolizione di manufatti edilizi attraverso tecnica controllata, i mezzi di cantiere impiegati sono la sega a disco diamantato, la autogru, l'autobotte per la bagnatura degli elementi e l'escavatore con pinza idraulica per il successivo taglio per la riduzione degli ingombri.

Sulla base delle specifiche della Direttiva 2000/14/EC per le principali macchine in uso durante i lavori di costruzione, i livelli di potenza sonora associati a ciascuna tipologia di macchinario risultano i seguenti:

<b>Tipologia di macchinario</b>	<b>Potenza Sonora <math>L_w</math> [dB(A)]</b>
<i>Escavatore con pinza</i>	103
<i>Autobotte</i>	95
<i>Autogru</i>	100



In ognuna delle attività elementari sopra definite è previsto l'utilizzo di mezzi di cantiere. Per ciascun mezzo di cantiere si identificano i valori delle accelerazioni in funzione della frequenza. Per quanto riguarda l'autobotte e l'autogru le emissioni vibrazionali possono essere assimilate a quelle di un autocarro.

Ai fini dello studio della componente Vibrazioni sono prese in riferimento le accelerazioni verticali associate ai singoli macchinari misurate a 5 metri dai macchinari stessi durante il loro esercizio.


	Frequenza [Hz]																			
	1	1,25	1,6	2	2,5	3,15	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40	50	63	80
Escavatore [mm/s <sup>2</sup> ]	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,8	1,6	9,1	13	17	12	11	30	49	6,5
Camion [mm/s <sup>2</sup> ]	0,8	1,1	0,7	0,5	0,5	0,4	0,3	1,1	2	2	2,1	5,6	3,3	3,3	3,3	2,1	1,4	0,9	1,1	1,4

## L11 Stoccaggio materiali provenienti dalle demolizioni



### Informazioni ambientali


#### SCREENING DELLE COMPONENTI

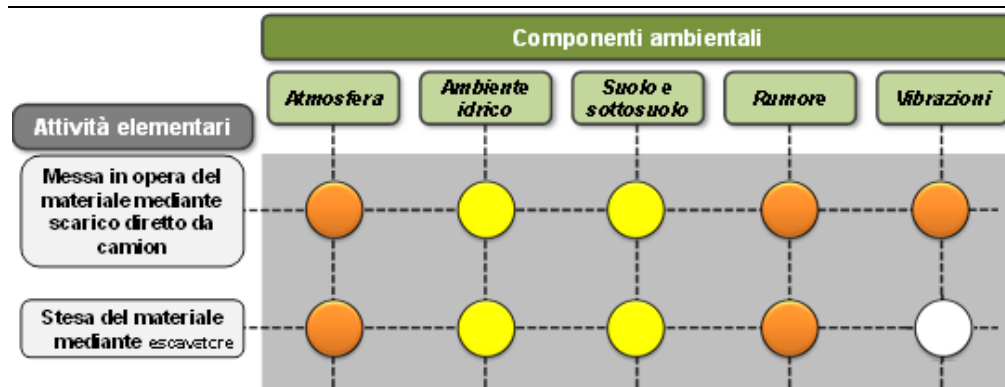

- Componente non interessata dall'attività
- Componente potenzialmente interessata dall'attività
- Componente interessata

<sup>(1)</sup> Per questa attività si rimanda alla scheda di dettaglio L09 Formazione delle sottofondazioni e fondazioni di pavimentazione.

#### ASPETTI SPECIFICI

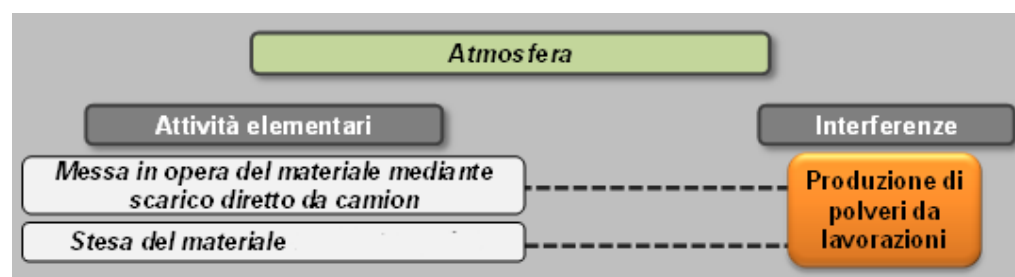


Per quanto riguarda il fenomeno delle emissioni di PM10 si fa riferimento ai dati dell'AP-42 Fifth edition Volume I è possibile attribuire un fattore di emissione all'attività specifica analizzata. In particolare, come previsto dalla metodologia, è necessario fare riferimento ad un fattore di emissione associabile o assimilabile per analogia di produzione di polveri alle attività sopradescritte. A tale scopo è possibile fare riferimento alla seguente formula valida per la movimentazione e lo stoccaggio di aggregati:

$$E = k(0.0016) \frac{\left(\frac{U}{2.2}\right)^{1.3}}{\left(\frac{M}{2}\right)^{1.4}} [kg/t]$$


Dall'applicazione della formula, in coerenza con i parametri utilizzati nello SIA, e conoscendo il numero di movimenti generati dall'attività, ovvero le tonnellate

ora trasportate, è possibile determinare l'emissione totale oraria correlata a tale attività pari a 7,2 grammi/ora.

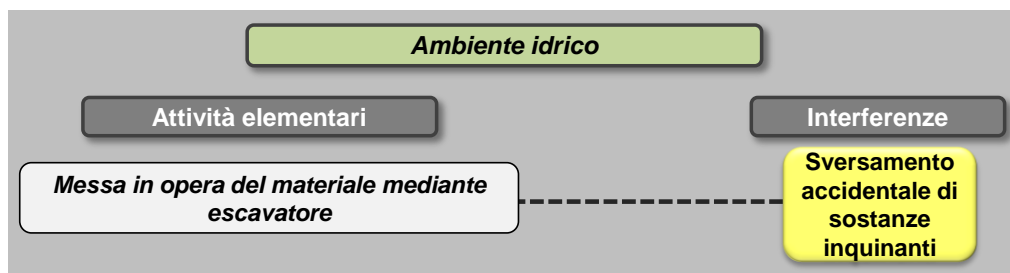


L'impiego di mezzi meccanici per la messa in opera del materiale potrebbe comportare l'eventuale sversamento accidentale di sostanze nocive che, infiltrandosi nel terreno, potrebbero modificare la qualità delle acque sotterranee.

L'area temporanea di stoccaggio ad ogni modo sarà pavimentata e dotata di rete di raccolta e convogliamento che confluisce le acque meteoriche in un specifico impianto di trattamento prima di poterle immettere nel recapito finale.

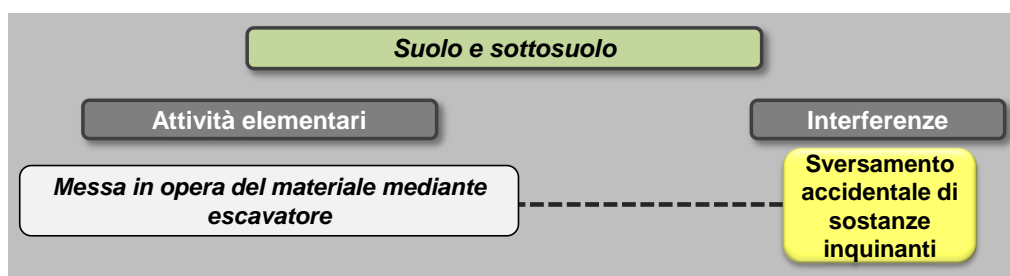

L'impiego di mezzi meccanici sia per la messa in opera del materiale potrebbe comportare l'eventuale sversamento accidentale di sostanze nocive a terra e il conseguente inquinamento degli strati del suolo sia superficiali che profondi.

L'area temporanea di stoccaggio ad ogni modo sarà pavimentata e dotata di rete di raccolta e convogliamento che confluisce le acque meteoriche in un specifico impianto di trattamento prima di poterle immettere nel recapito finale.

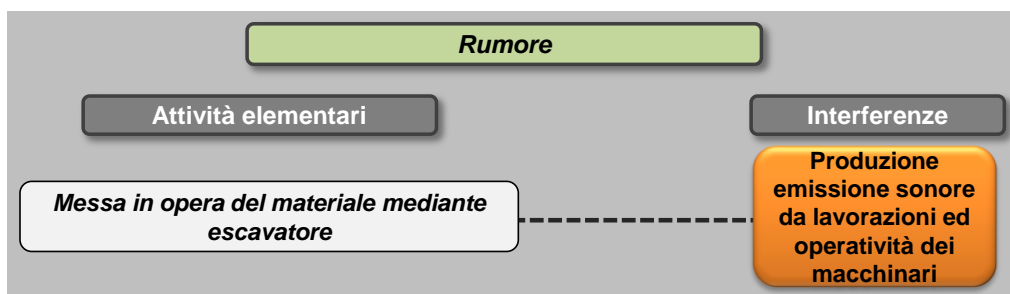

Per la movimentazione del materiale all'interno dell'area di deposito verrà utilizzato l'escavatore.

Sulla base delle specifiche della Direttiva 2000/14/EC per le principali macchine in uso durante i lavori di costruzione, i livelli di potenza sonora associati a ciascuna tipologia di macchinario risultano essere i seguenti:

<b>Tipologia di macchinario</b>	<b>Potenza Sonora <math>L_w</math> [dB(A)]</b>
<i>Escavatore</i>	103



In ognuna delle attività elementari sopra definite è previsto l'utilizzo di mezzi di cantiere. Per ciascun mezzo di cantiere si identificano i valori delle accelerazioni in funzione della frequenza.

Ai fini dello studio della componente Vibrazioni sono prese in riferimento le accelerazioni verticali associate ai singoli macchinari misurate a 5 metri dai macchinari stessi durante il loro esercizio.

	<b>Frequenza [Hz]</b>																			
	1	1,25	1,6	2	2,5	3,15	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40	50	63	80
<b>Escavatore [mm/s<sup>2</sup>]</b>	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,8	1,6	9,1	13	17	12	11	30	49	6,5




# L12 Demolizione pavimentazioni in conglomerato cementizio




## Informazioni ambientali

### SCREENING DELLE COMPONENTI

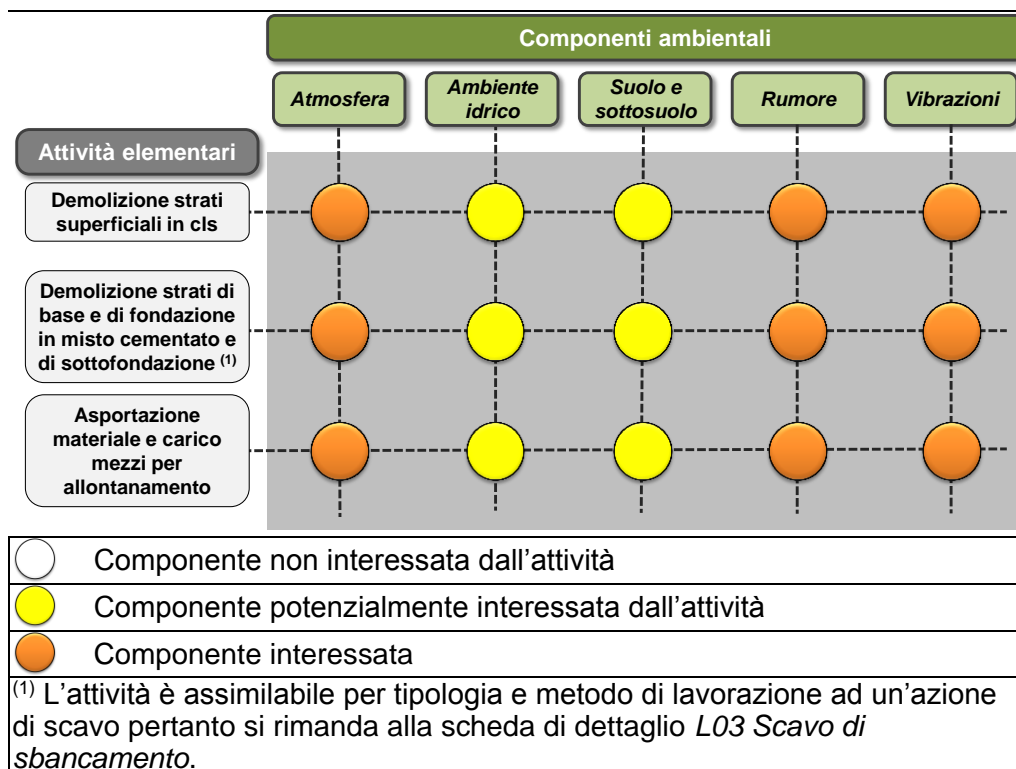

### ASPETTI SPECIFICI

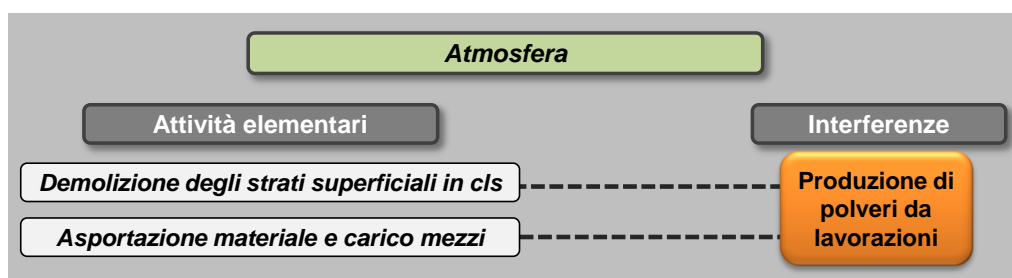


Per quanto riguarda il fenomeno delle emissioni di PM10 si fa riferimento ai dati dell'AP-42 Fifth edition Volume I è possibile attribuire un fattore di emissione all'attività specifica analizzata.

In particolare, come previsto dalla metodologia, è necessario fare riferimento ad un fattore di emissione associabile o assimilabile per analogia di produzione di polveri alle attività sopradescritte.

A tale scopo è possibile fare riferimento alla seguente formula valida per la movimentazione e lo stoccaggio di aggregati:

$$E = k(0.0016) \frac{\left(\frac{U}{2.2}\right)^{1.3}}{\left(\frac{M}{2}\right)^{1.4}} [kg/t]$$


Dall'applicazione della formula, in coerenza con i parametri utilizzati nello SIA, e conoscendo il numero di movimenti generati dall'attività, ovvero le tonnellate ora trasportate, è possibile determinare l'emissione totale oraria correlata a tale attività pari a 5,6 grammi/ora.

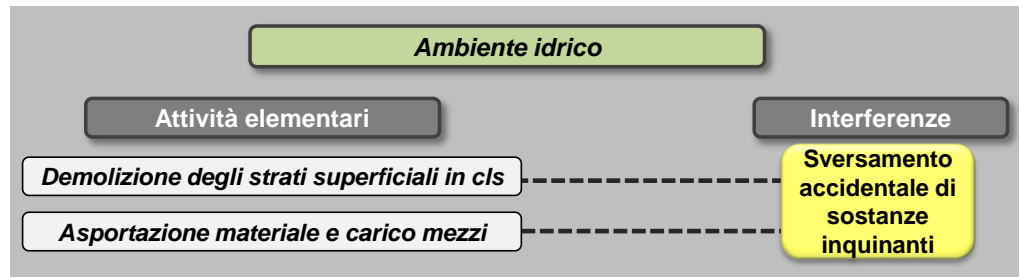

L'attività di demolizione degli strati superficiali in cls prevede una profondità tale da non interferire con l'eventuale presenza di falda acquifera nel terreno.


L'impiego di mezzi meccanici sia per l'attività di demolizione che il successivo asporto e carico potrebbe comportare l'eventuale sversamento accidentale di sostanze nocive che, infiltrandosi nel terreno, potrebbero modificare la qualità delle acque sotterranee.

Il livello della falda presente all'interno del sedime aeroportuale complessivamente risulta prossimo al piano campagna, con quote variabili tra un minimo di 0,5 m s.l.m. ed un massimo di circa - 4 m s.l.m.

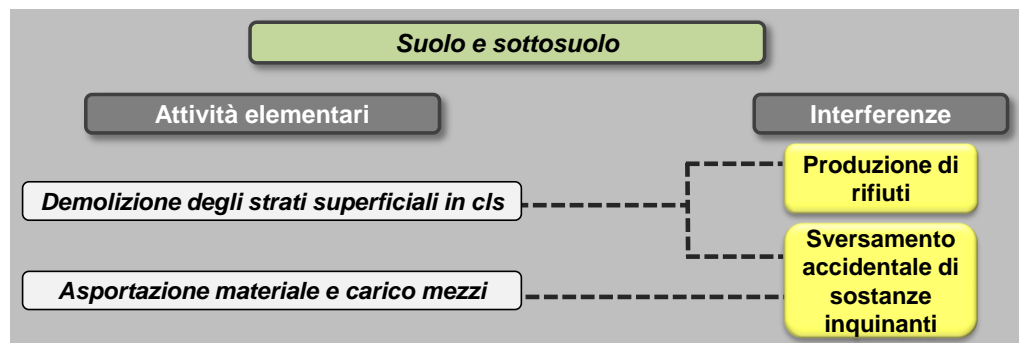

Dall'esecuzione della demolizione degli strati in cls si avrà la produzione di rifiuti che eventualmente potranno essere recuperati e riutilizzati per la realizzazione di altre attività.


L'impiego di mezzi meccanici sia per l'attività di demolizione che il successivo asporto e carico potrebbe comportare l'eventuale sversamento accidentale di sostanze nocive a terra e il conseguente inquinamento degli strati del suolo sia superficiali che profondi.

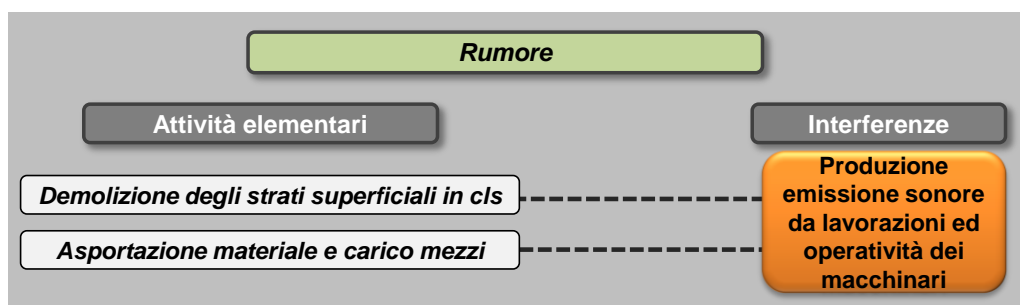

In funzione delle attività elementari individuate nella scheda progettuale relativa all'attività di demolizione delle lastre di cls, i mezzi di cantiere impiegati sono il demolitore per lo smantellamento delle lastre in cls e la terna per l'asportazione degli inerti e successivo carico su camion.

Sulla base delle specifiche della Direttiva 2000/14/EC per le principali macchine in uso durante i lavori di costruzione, i livelli di potenza sonora associati a ciascuna tipologia di macchinario risultano essere i seguenti:

Tipologia di macchinario	Potenza Sonora $L_w$ [dB(A)]
Demolitore	105
Terna	101

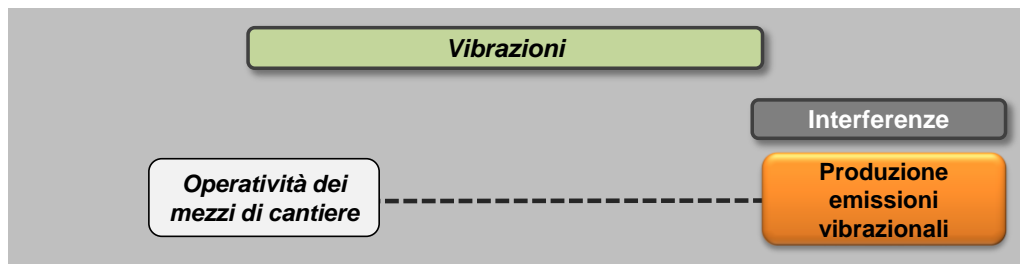

In ognuna delle attività elementari sopra definite è previsto l'utilizzo di mezzi di cantiere. Per ciascun mezzo di cantiere s'identificano i valori delle accelerazioni in funzione della frequenza.

Ai fini dello studio della componente Vibrazioni sono prese in riferimento le accelerazioni verticali associate ai singoli macchinari misurate a 5 metri dai macchinari stessi durante il loro esercizio.


	Frequenza [Hz]																			
	1	1,25	1,6	2	2,5	3,15	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40	50	63	80
Terna [mm/s <sup>2</sup> ]	0,7	0,5	0,6	0,6	0,6	0,4	0,3	1	4,9	3,9	2,4	2,7	1,6	3,1	20	27	34	35	38	39
Demolitore [mm/s <sup>2</sup> ]	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	17	17	17	16	23	13	3	3,1	3,7	3,9	22	28	111	53

## L13 Demolizione pavimentazioni in conglomerato bituminoso




### Informazioni ambientali

#### SCREENING DELLE COMPONENTI

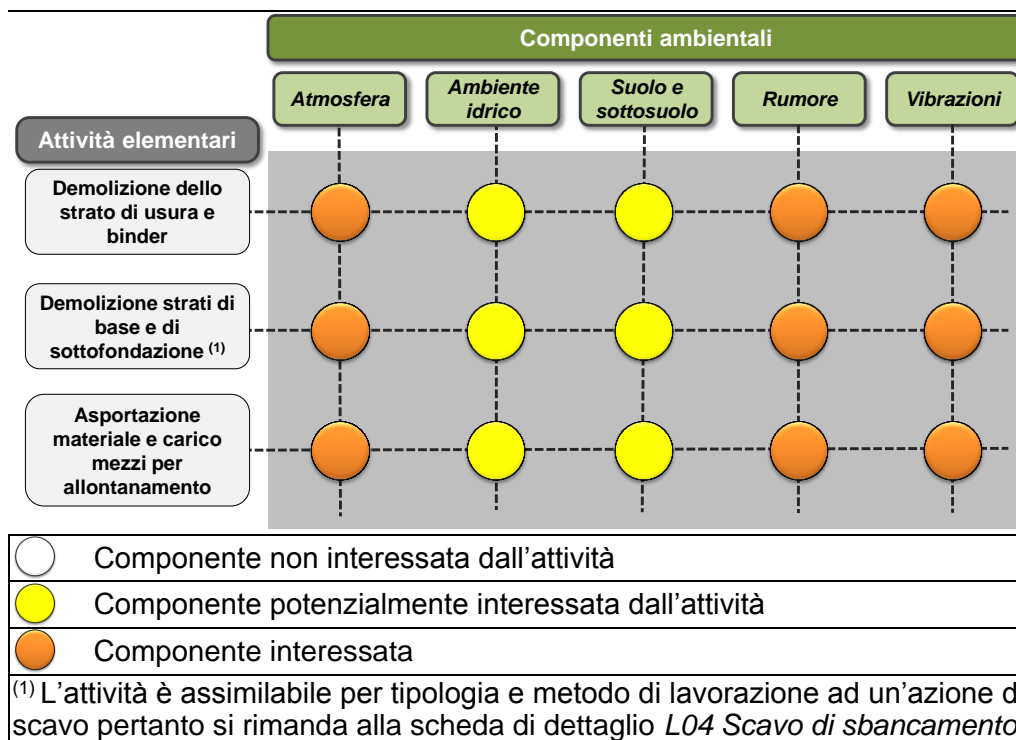

#### ASPETTI SPECIFICI

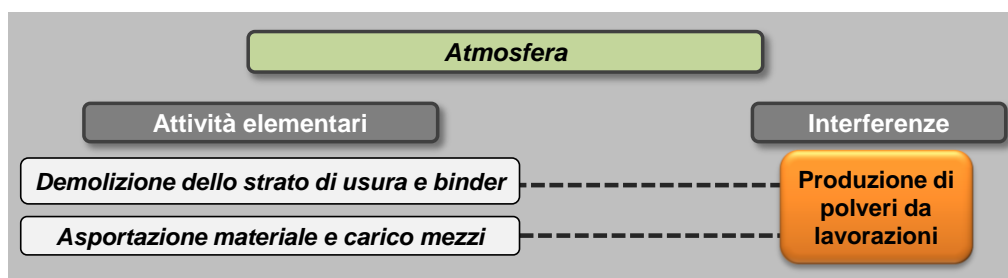


Per quanto riguarda il fenomeno delle emissioni di PM10 si fa riferimento ai dati dell'AP-42 Fifth edition Volume I è possibile attribuire un fattore di emissione all'attività specifica analizzata.

In particolare, come previsto dalla metodologia, è necessario fare riferimento ad un fattore di emissione associabile o assimilabile per analogia di produzione di polveri alle attività sopradescritte.

A tale scopo è possibile fare riferimento alla seguente formula valida per la movimentazione e lo stoccaggio di aggregati:

$$E = k(0.0016) \frac{\left(\frac{U}{2.2}\right)^{1.3}}{\left(\frac{M}{2}\right)^{1.4}} [kg/t]$$


Dall'applicazione della formula, in coerenza con i parametri utilizzati nello SIA, e conoscendo il numero di movimenti generati dall'attività, ovvero le tonnellate ora trasportate, è possibile determinare l'emissione totale oraria correlata a tale attività pari a 5,6 grammi/ora.

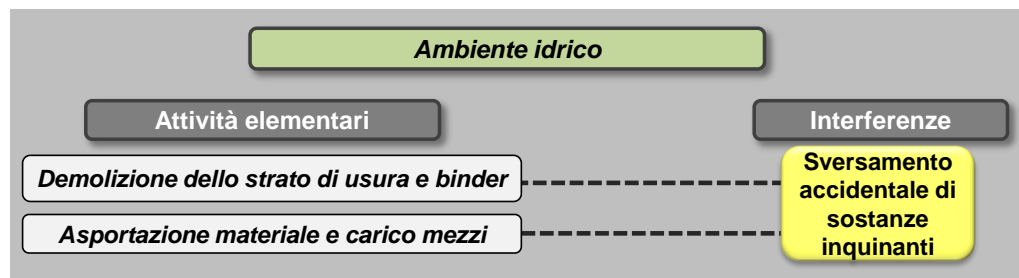

L'attività di demolizione dello strato di usura e del binder prevede una profondità tale da non interferire con l'eventuale presenza di falda acquifera nel terreno.


L'impiego di mezzi meccanici sia per l'attività di demolizione che il successivo asporto e carico potrebbe comportare l'eventuale sversamento accidentale di sostanze nocive che, infiltrandosi nel terreno, potrebbero modificare la qualità delle acque sotterranee.

Il livello della falda presente all'interno del sedime aeroportuale complessivamente risulta prossimo al piano campagna, con quote variabili tra un minimo di 0,5 m s.l.m. ed un massimo di circa - 4 m s.l.m.

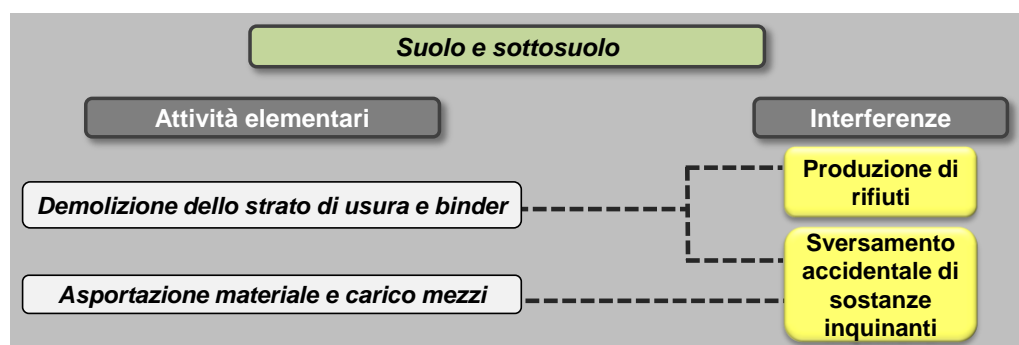

Dall'esecuzione della demolizione dello strato di usura e del binder si avrà la produzione di rifiuti che eventualmente potranno essere recuperati e riutilizzati per la realizzazione di altre attività.

L'impiego di mezzi meccanici sia per l'attività di demolizione che il successivo asporto e carico potrebbe comportare l'eventuale sversamento accidentale di sostanze nocive a terra e il conseguente inquinamento degli strati del suolo sia superficiali che profondi.

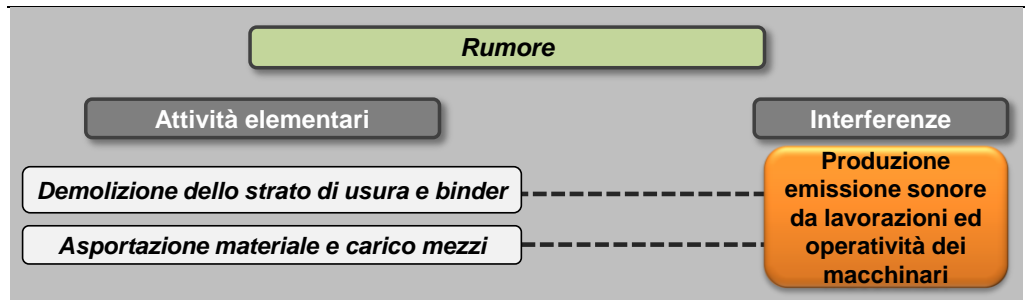

In funzione delle attività elementari individuate nella scheda progettuale relativa all'attività di demolizione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso, i mezzi di cantiere impiegati sono la fresatrice.

Sulla base delle specifiche della Direttiva 2000/14/EC per le principali macchine in uso durante i lavori di costruzione, i livelli di potenza sonora associati a ciascuna tipologia di macchinario risultano essere i seguenti:

Tipologia di macchinario	Potenza Sonora $L_w$ [dB(A)]
Fresatrice	103



In ognuna delle attività elementari sopra definite è previsto l'utilizzo di mezzi di cantiere. Per ciascun mezzo di cantiere si identificano i valori delle accelerazioni in funzione della frequenza.

Ai fini dello studio della componente Vibrazioni sono prese in riferimento le accelerazioni verticali associate ai singoli macchinari misurate a 5 metri dai macchinari stessi durante il loro esercizio.

La fresatrice può essere assimilata come macchina ad un escavatore pertanto si è fatto riferimento ai valori di accelerazione stimati per quest'ultimo.

	Frequenza [Hz]																			
	1	1,25	1,6	2	2,5	3,15	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40	50	63	80
Fresatrice [mm/s <sup>2</sup> ]	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,8	1,6	9,1	13	17	12	11	30	49	6,5

### 6.2.3 SINTESI DELLO SCREENING AMBIENTALE SPECIFICO

Volendo riassumere quanto sinora rappresentato mediante le schede, una volta individuate le componenti in generale interferibili occorre focalizzare l'attenzione sull'intervento in esame, che, per quanto concerne le attività di cantiere, è caratterizzato dalle lavorazioni elementari precedentemente identificate (cfr. capitolo 6.1).

Per quanto riguarda lo screening specifico per ogni componente è possibile fare riferimento alla seguente tabella di sintesi, estrapolata dalle schede di progetto viste nel paragrafo precedente.

<b>Attività elementare</b>		<b>Componenti</b>				
		<b>A</b>	<b>Ai</b>	<b>S</b>	<b>R</b>	<b>V</b>
L01	Scavo di sbancamento	●	●	●	●	●
L02	Scavo di sbancamento con aggotamento acque	●	●	●	●	●
L03	Palificazioni	●	●	●	●	●
L04	Realizzazione fondazioni	●	●	●	●	●
L05	Rinterri	●	●	●	●	●
L06	Realizzazione di elementi strutturali in elevazione gettati in opera	●	●	●	●	●
L07	Posa in opera di elementi prefabbricati	●	●	●	●	●
L08	Trasporto materiali	●	●	●	●	●
L09	Demolizione manufatti edilizi con tecnica tradizionale	●	●	●	●	●
L10	Demolizione manufatti edilizi con tecnica controllata	●	●	●	●	●
L11	Stoccaggio materiali provenienti dalle demolizioni	●	●	●	●	●
L12	Demolizione pavimentazione in conglomerato cementizio	●	●	●	●	●
L13	Demolizione pavimentazione in conglomerato bituminoso	●	●	●	●	●
A = Atmosfera; Ai = Ambiente Idrico; S = Suolo e sottosuolo; R = Rumore; V = Vibrazione ● Componente Interessata; ● Componente potenzialmente interessata; ● Componente non interessata						

Tabella 6-2 Screening specifico in funzione delle attività elementari

Le metodologie di analisi saranno differenti in funzione delle specificità delle singole componenti analizzate.

## 7 L'ANALISI DEGLI EFFETTI

### 7.1 ATMOSFERA

#### 7.1.1 INTRODUZIONE E METODOLOGIA

Con riferimento a quanto riportato nei capitoli precedenti nel presente paragrafo si intende valutare l'interferenza tra i cantieri, nonché le attività in essi svolte, e la componente atmosfera.

A tal fine è stata implementata una metodologia *ad hoc* basata sulle analisi previsionali delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera attraverso l'uso di modelli matematici e la realizzazione di scenari di tipo "Worst Case".

Il maggior livello di dettaglio raggiunto nella definizione dei cantieri ha permesso di definire le azioni di cantiere che possono generare interferenza con la componente in questione, nonché di dimensionare i fattori di emissione specifici, determinati nell'ambito delle Schede Ambientali esposte al paragrafo precedente per le singole attività elementari, tarandoli rispetto alla dimensione specifica del singolo cantiere.

Oltre al maggior livello di dettaglio raggiunto con la realizzazione dei progetti esecutivi si è scelto di analizzare la tematica dell'inquinamento atmosferico con un approccio cautelativo, andando a considerare comunque lo scenario peggiore, al fine di garantire i più alti livelli di sicurezza.

Da un punto di vista atmosferico il "Worst Case Scenario" si traduce nel simulare, una volta definite le variabili che determinano gli scenari, la situazione peggiore possibile tra una gamma di situazioni "pianificate". Pertanto il primo passo sta nel definire le variabili che influenzano lo scenario – che nel caso in esame sono le variabili che influenzano il modello di simulazione – e valutare una gamma di scenari di simulazione possibili. Una volta valutati gli scenari è possibile fare riferimento ad uno o più scenari, ritenuti maggiormente critici, nell'arco temporale di riferimento.

Per quanto riguarda il modello pertanto, come meglio descritto in seguito, i parametri da valutare sono quelli orografici (considerati invariati nei diversi scenari), quelli meteorologici (ciclici rispetto all'annualità) e quelli progettuali relativi alle diverse configurazioni di cantiere. Se si fissa l'arco temporale di analisi rispetto all'annualità è possibile svincolarsi dai parametri territoriali – invariati – e fare riferimento ai soli parametri progettuali.

Volendo quindi definire lo scenario più critico si può procedere con i seguenti *step* logici:

1. definizione delle attività elementari del cantiere;
2. scelta dell'attività elementare con il valore fattore di emissione più elevato;
3. estensione di tale attività a tutta la durata del cantiere;



4. valutazione delle concentrazioni con il fattore di emissione più elevato definito allo *step* precedente ed in tutte le condizioni meteorologiche.

Quanto processo può essere sintetizzato nella Figura 7-1, la quale mette a confronto la logica del Worst Case con il caso reale mostrando come nel Worst Case il valore di concentrazione stimato sia sempre superiore, o al più uguale, a quello stimato con condizioni di operatività reale.

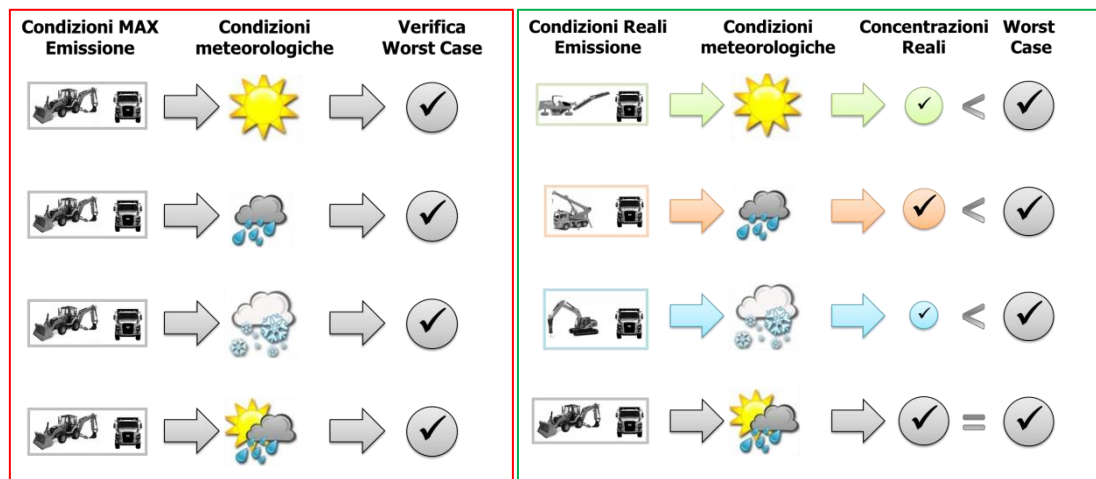


Figura 7-1 Confronto e verifica Worst Case - caso reale

Verificando il Worst Case pertanto saranno automaticamente verificate tutte le altre condizioni e, di conseguenza, si avrà la garanzia del pieno rispetto dei vincoli normativi.

### 7.1.2 IL SOFTWARE UTILIZZATO: AERMOD VIEW

Il modello di simulazione matematica relativo alla dispersione degli inquinanti in atmosfera a cui si è fatto riferimento è il software AERMOD View, distribuito dalla Lakes Environmental, il quale, partendo dalle informazioni sulle sorgenti e sulle condizioni meteorologiche, fornisce la dispersione degli inquinanti in atmosfera e i relativi livelli di concentrazione al suolo.

AERMOD View incorpora i principali modelli di calcolo utilizzati dall'U.S. EPA attraverso un'interfaccia integrata. Tali modelli sono:

- Aermoc;
- ISCST3;
- ISC-PRIME.

In particolare AERMOD è un modello di tipo Gaussiano (*Steady-state Gaussian plume air dispersion model*) basato su un modello di stabilità atmosferica di tipo "Planetary boundary layer theory"<sup>1</sup> e che consente di valutare attraverso algoritmi di calcolo i fattori di deflessione degli edifici, i parametri di deposizione al suolo degli inquinanti, l'effetto

<sup>1</sup> AERMOD Tech Guide – Gaussian Plume Air Dispersion Model. Version 7.6

locale dell'orografia del territorio ed in ultimo i calcoli relativi alle turbolenze meteorologiche.

Il codice AERMOD è stato sviluppato dall'American Meteorological Society – EPA, quale evoluzione del modello gaussiano ISC3. La dispersione in atmosfera della sostanza inquinante è funzione delle condizioni di stabilità atmosferica dell'area di riferimento stessa<sup>2</sup>:

- Strato limite dell'atmosfera stabile: la distribuzione è di tipo gaussiano sia in direzione orizzontale che in direzione verticale;
- Strato limite dell'atmosfera instabile: la distribuzione è di tipo gaussiano in direzione orizzontale e bi-gaussiano in direzione verticale.

Tale impostazione supera le tipologie di modelli precedenti (ISC3), permettendo di superare i limiti dei modelli gaussiani i quali non erano in grado di simulare, in maniera sufficientemente rappresentativa, le condizioni di turbolenza dello strato limite atmosferico.

Il codice prende in considerazione diversi tipi di sorgente:

- puntuali;
- lineari;
- areali;
- volumiche.

Per ognuna di tali sorgenti il modello fa corrispondere un diverso algoritmo di calcolo delle concentrazioni. Il modello, pertanto, calcola il contributo di ciascuna sorgente nel dominio d'indagine, in corrispondenza dei punti ricettori i quali possono essere punti singoli, o una maglia di punti con passo definito dall'utente.

Poiché il modello è di tipo stazionario, le emissioni sono assunte costanti nell'intervallo temporale di simulazione; tuttavia, è possibile fornire al modello stesso una differenziazione relativa ai fattori di emissioni calcolati nel giorno, ovvero definire per ogni ora del giorno un fattore di emissione relativo alla sorgente *i*-esima differente. Tale opzione di calcolo risulta particolarmente utile per la definizione delle concentrazioni derivanti da sorgenti che non utilizzano cicli di lavoro continui relativi alle 24h.

Infine vengono considerati anche gli effetti derivanti dalla conformazione degli edifici. Grazie al modellatore 3D è possibile avere una rappresentazione grafica dell'area d'intervento sia in termini di terreno che in termini di edifici e sorgenti.

---

<sup>2</sup> US EPA, User Guide for the AMS EPA regulatory model AERMOD – USA (2004)

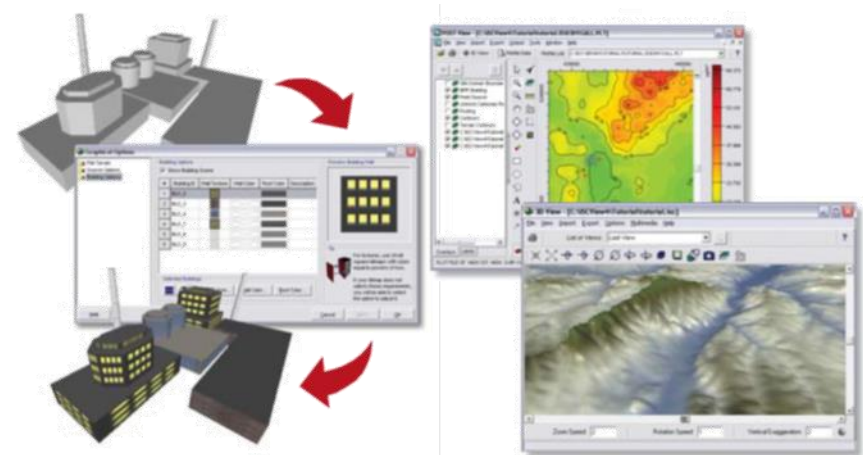


Figura 7-2 Esempio di modulo di visualizzazione 3D integrato nel modello di calcolo

In ultimo il modello si avvale di due ulteriori modelli per la valutazione degli input meteorologici e territoriali. Per quanto riguarda il primo modello, AERMET, questo consente di elaborare i dati meteorologici rappresentativi dell'area d'intervento al fine di calcolare i parametri di diffusione dello strato limite atmosferico; esso permette pertanto ad AERMOD di ricavare i profili verticali delle variabili meteorologiche più influenti. Il secondo modello, AERMAP, consente di elaborare le caratteristiche orografiche del territorio in esame.

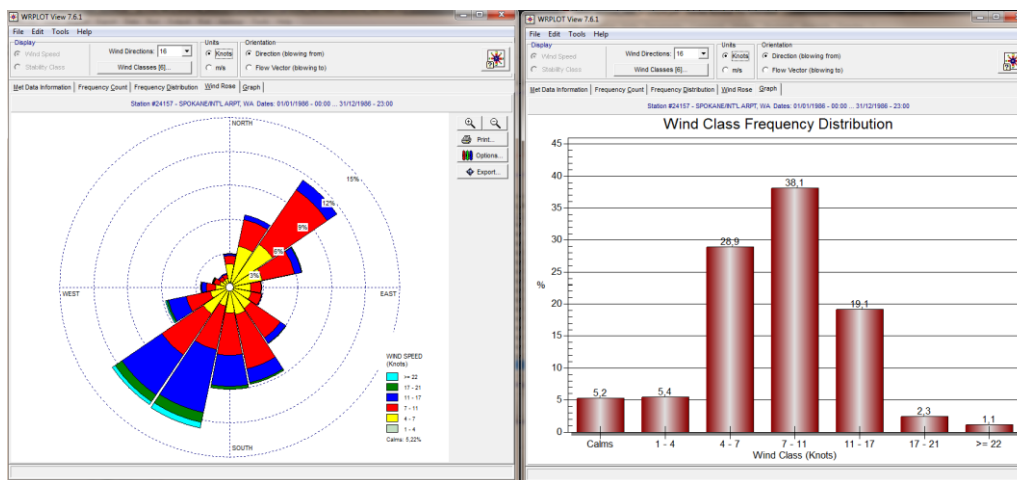


Figura 7-3 Esempio di applicazione del modulo Aermet

Come accennato l'output del modello è rappresentato dalla valutazione delle concentrazioni di inquinanti in riferimento ai ricettori scelti. Qualora si scelga di rappresentare i risultati attraverso una maglia, il software, grazie ad algoritmi di interpolazione è in grado di ricostruire le curve di isoconcentrazione, al fine di determinare una mappa di isoconcentrazione degli inquinanti. Per maggiore chiarezza si può fare riferimento ad una struttura semplificata dell'intero processo di simulazione del software che può essere rimandata a due famiglie di parametri:

- Parametri Territoriali;
- Parametri Progettuali.

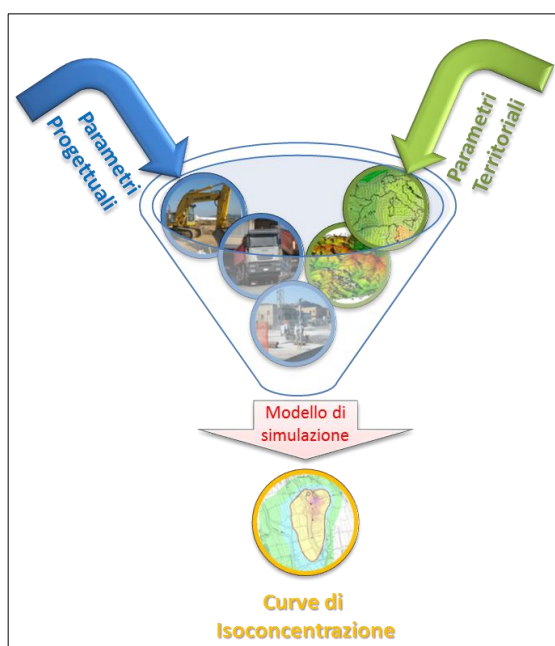


Figura 7-4 Definizione logica del modello adottato

La prima famiglia di parametri, è rappresentata da tutti i parametri propri del territorio, ed in particolare i parametri meteorologici ed i parametri orografici. E' evidente come tali parametri possano essere assunti costanti nel tempo, per quello che riguarda la parte orografica, e come invece debbano essere considerati variabili nel tempo, anche se affetti da un andamento periodico, i parametri meteorologici. Questi due parametri computati in maniera contemporanea determinano le modalità di diffusione, definendo, ad esempio, i diversi campi di vento a cui è sottoposta l'area in esame nei diversi periodi dell'anno.

La seconda famiglia di parametri, definisce il quadro "Emissivo" del progetto, ovvero definisce tutti i fattori di emissione relativi alle differenti operazioni effettuate all'interno del processo realizzativo e di esercizio. Nel caso in esame vengono definiti tutti i fattori di emissione relativi alle diverse modalità realizzative e ai diversi scenari di esercizio.

Una volta stimate le due famiglie di parametri, il modello di simulazione ne analizza le diverse correlazioni possibili, andando a valutare gli effetti relativi alla presenza della sorgente atmosferica i-esima situata in un'area territoriale e attiva in uno specifico arco temporale, considerando le condizioni meteorologiche relative alla stessa area e nello stesso arco temporale e definendo le curve di isoconcentrazione necessarie alle valutazioni degli impatti dell'opera sui ricettori sensibili.

### 7.1.3 GLI INPUT TERRITORIALI

#### 7.1.3.1 I dati orografici

Con riferimento all'area di Fiumicino si è adottata una conformazione del territorio di tipo "flat" (piatta) in quanto non presenti condizioni orografiche complesse nell'immediato intorno delle aree di lavoro e del sedime stesso.




Figura 7-5 Tipologie di configurazioni territoriali

### 7.1.3.2 I dati meteorologici

In relazione ai dati meteorologici si è fatto specifico riferimento ai dati contenuti nella documentazione redatta in fase di VIA. Per facilità di lettura si riportano in maniera integrale i dati relativi agli input meteorologici di riferimento del modello.

Si specifica che si è fatto riferimento ai dati forniti dall'aeronautica militare relativi alla stazione di Fiumicino. Tali dati sono stati poi elaborati al fine di renderli compatibili con i formati previsti dal processore meteorologico AERMET.

In particolare i dati grezzi sono stati forniti attraverso un bollettino di tipo "Metar" relativi alla stazione meteo di Fiumicino le cui coordinate sono riportate nella Figura sottostante.

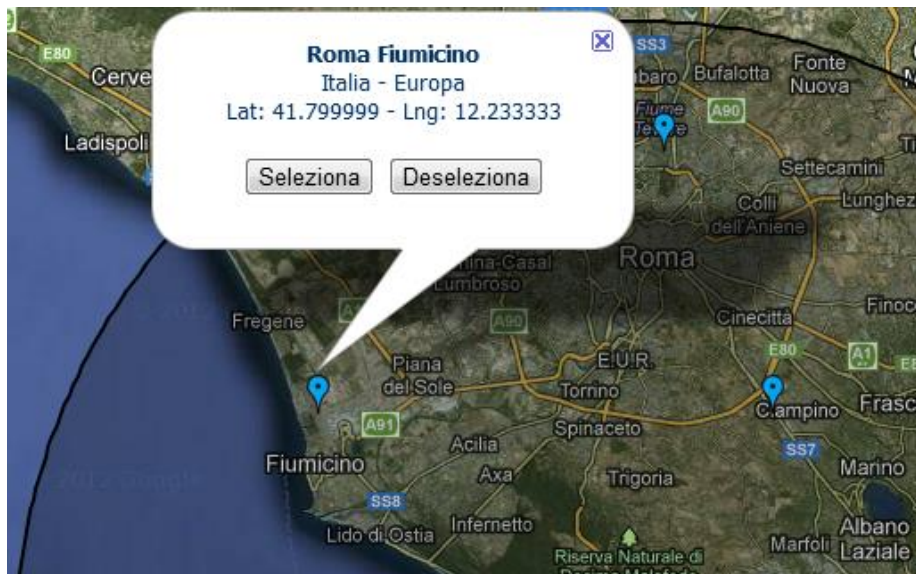


Figura 7-6 Stazione di Fiumicino fonte: <http://clima.meteoam.it>

I dati fanno riferimento all'arco temporale di un anno compreso tra il 01.01.2014 e il 31.12.2014, presentano una registrazione ogni trenta minuti e contengono i seguenti campi:

- Vento – Direzione e Velocità;
- Temperatura;
- Pressione;
- Visibilità;
- Nuvolosità;

- Stato del mare;
- Fenomeni meteorologici.

Come precedentemente accennato i dati “grezzi” sono stati rielaborati al fine di renderli compatibili con i formati previsti in AERMET. In particolare i file necessari, ovvero le tipologie di input necessari all’implementazione del modello, sono due: i dati meteorologici al suolo e i dati meteorologici in quota.

Per quanto riguarda i dati al suolo, nella rielaborazione, si è fatto riferimento al formato SCRAM che caratterizza le condizioni superficiali con intervalli di 60 minuti.

88888100104 012130080520504
88888100104 010120070500302
888881001041001513008050050
8888810010411015170110520504

Tabella 7-1 Esempio di alcune righe di un file scritto in formato “SCRAM”

Per leggere il file il software associa ad ogni posizione di un carattere all’interno della stringa di testo un preciso significato; di seguito viene indicato il significato di ogni cifra a secondo della casella che occupa:

- 1-5: indicano il codice della postazione meteorologica che ha registrato i dati; nell’esempio mostrato è stata denominata “88888”;
- 6-7: indicano l’anno che si sta considerando; questo studio riguarda l’anno 2010 che viene indicato con le ultime due cifre “10”;
- 8-9: viene specificato il mese, nell’esempio siamo a Gennaio: “01”;
- 10-11: anche il giorno viene indicato con due cifre, nell’esempio siamo al quarto giorno di Gennaio: “04”;
- 12-13: si specifica l’ora, lasciando vuota la prima casella nel caso di numeri ad una sola cifra;
- 14-16: viene indicata l’altezza a cui si trovano le nuvole, espressa in centinaia di piedi;
- 17-18: indicano la direzione del vento, espressa come decine di gradi (esempio  $130^\circ=13$ );
- 19-21: si indica la velocità del vento, espressa in nodi (001 Knot= 1853 m/h);
- 22-24: la temperatura espressa in questa tre casella è indicata in gradi Fahrenheit (si ricorda la relazione:  $T^{\circ}f = 9/5 (T^{\circ}c + 32)$ );
- 25-28: si indica la quantità di nuvole: le prime due cifre, in una scala che va da zero a dieci, indicano la percentuale di nuvole presenti su tutta la zona, mentre le seconde due cifre, con la medesima scala, indicano la foschia presente sopra il sedime.

Per i dati meteorologici in quota, si è fatto riferimento al modulo di calcolo automatico presente in AERMET, il quale fornisce in maniera automatica, attraverso algoritmi di correlazione con i dati al suolo, il profilo di stabilità atmosferica in quota.

I dati meteo principali, così processati, sono sinteticamente riportati nei grafici sottostanti:

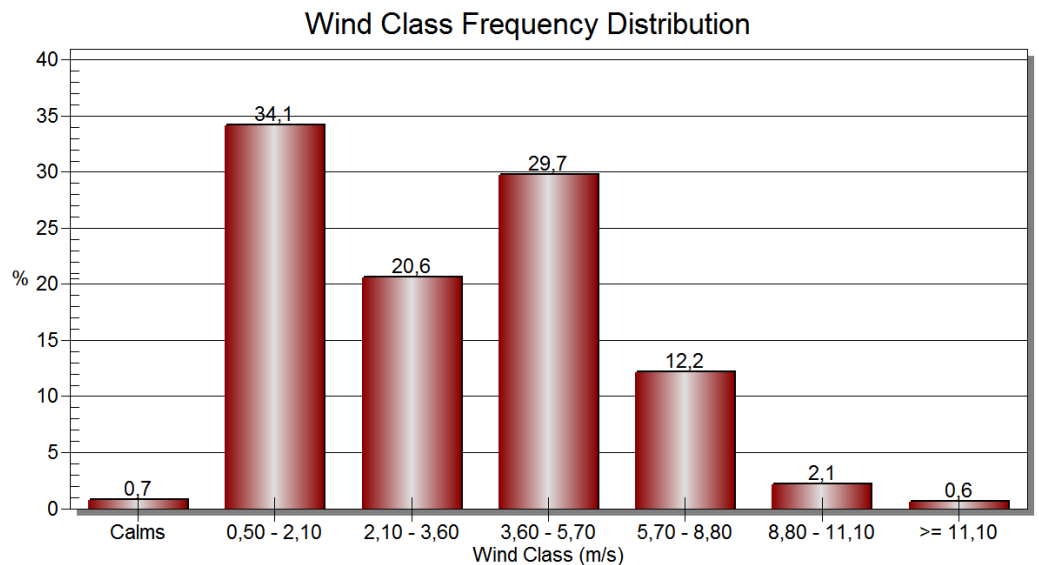


Figura 7-7 Vento - distribuzione in frequenza

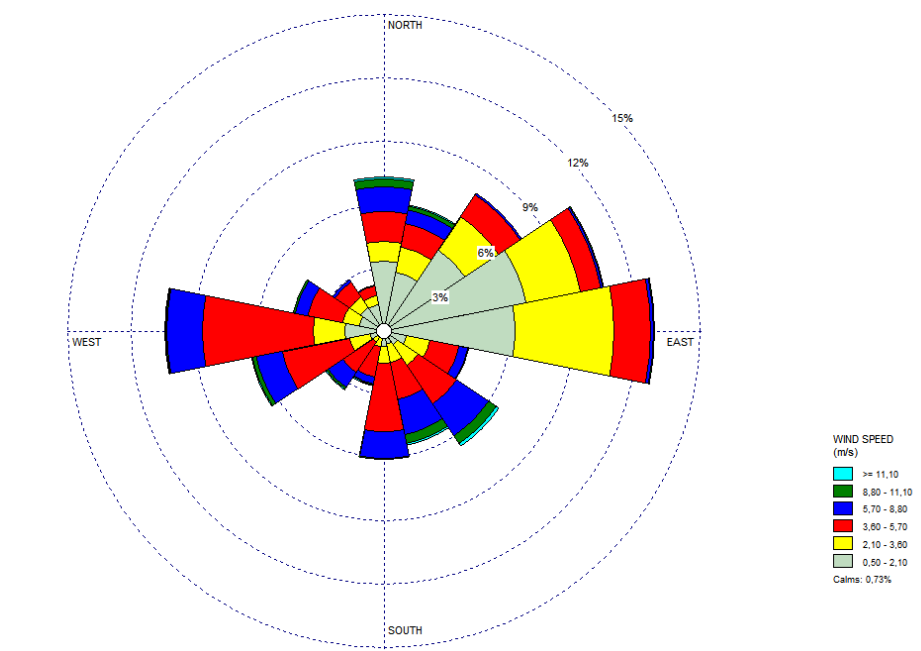


Figura 7-8 Rosa dei venti relativa all'anno 2014

## 7.1.4 GLI INPUT PROGETTUALI

### 7.1.4.1 Inquinanti analizzati e limiti normativi

Con specifico riferimento alla componente atmosfera sono stati analizzati nella fase di Screening Ambientale (Cfr. Par.4.3.3 e 6.2.3) gli inquinanti che si intendono analizzare, funzione delle diverse attività elementari. Nel presente paragrafo si richiamano in via sintetica i limiti così come definiti dal D.Lgs. 155/10 Allegato XI.

<i>Azione Elementare</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Periodo di mediazione</i>	<i>Valore limite</i>
Tutte	PM <sub>10</sub>	1 Giorno	50 µg/m <sup>3</sup> da non superare più di 35 volte per anno civile
		Anno civile	40 µg/m <sup>3</sup>
Trasporto Materiali	NO <sub>2</sub>	1 ora	200 µg/m <sup>3</sup> da non superare più di 18 volte per anno civile
		Anno Civile	40 µg/m <sup>3</sup>
	CO	Massimo su 24ore della media mobile 8h	10 µg/m <sup>3</sup>

Tabella 7-2 Limiti normativi fonte: *D.lgs. 155/10 Allegato XI*

### 7.1.4.2 Le fasi realizzative e la contemporaneità degli interventi

Le simulazioni effettuate attraverso il software AERMOD saranno realizzate attraverso l'implementazione di diversi scenari di lavorazione, volti, come già detto, alla definizione del *Worst-Case scenario*.

In particolare per quanto concerne la realizzazione dell'intervento, sono state individuate cinque fasi lavorative temporalmente successive; di seguito è riportata la descrizione delle fasi con le attività e la loro durata previste.

Dall'analisi del cronoprogramma, contenuto all'interno del documento "Estratto dei documenti significativi del progetto" (A783T8DGGEDGEN714) è stato possibile individuare le attività che sono maggiormente significative dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico, nonché in massima sovrapposizione – principio di sovrapposizione degli effetti – tra le sorgenti stesse.

La Figura 7-15 mostra lo scenario più significativo preso a riferimento. Tale scenario prende in considerazione la contemporanea esecuzione dell'attività di scavo con aggettamento delle acque sia per il corpo di collegamento CDC sia per l'area di imbarco A (AIA).

Le lavorazioni saranno effettuate prevedendo 3 turni di lavoro, suddivisi in due turni nel periodo diurno ed un turno nel periodo notturno, e ciascuno di 7 ore.



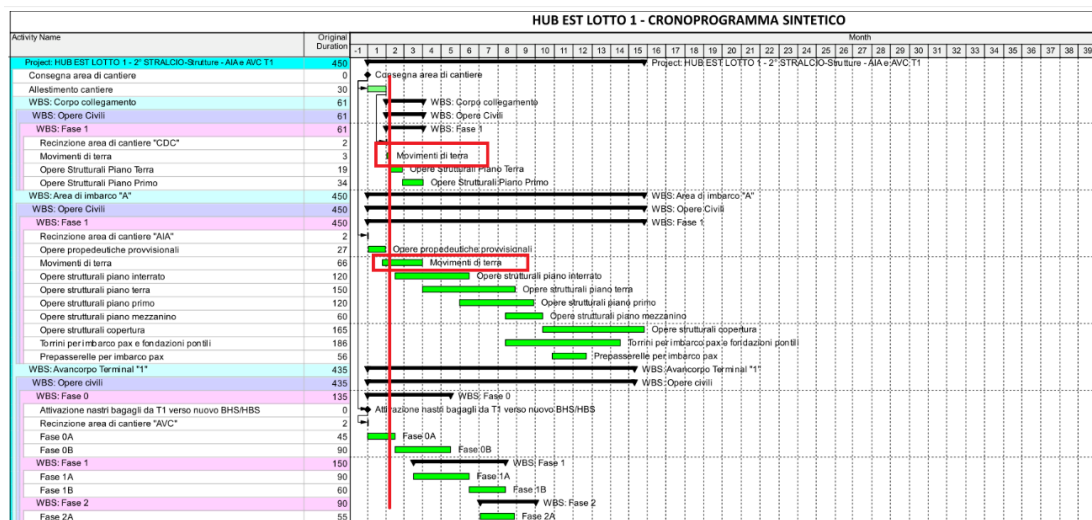


Figura 7-9 Individuazione dello scenario più significativo

Occorre infine valutare la possibile sovrapposizione degli effetti in relazione a quanto effettuato per le attività di cantiere relative al Lotto 1 – Primo stralcio e connesse alla realizzazione dei piazzali antistanti l'area di imbarco A.

Nella definizione dello scenario di più significativo alla base per l'individuazione dei potenziali impatti di cantiere risulta infatti necessario considerare anche le lavorazioni connesse con i piazzali secondo l'articolazione delle attività riportata negli specifici cronoprogrammi.

Lo scenario considerato più significativo per la valutazione dei potenziali impatti acustici indotti dalle attività di cantiere risulta articolato secondo quanto riportato in Tabella 7-3.

Area di cantiere	Lavorazioni
Corpo di collegamento (CDC)	Scavo di sbancamento con aggotamento acque
	Trasporto dei materiali di scavo
Area di imbarco A (AIA)	Scavo di sbancamento con aggotamento acque
	Trasporto dei materiali di scavo
Piazzali pertinenza area imbarco A (PPA)	Demolizione lastre cls

Tabella 7-3 Attività di cantiere caratterizzanti lo scenario più significativo

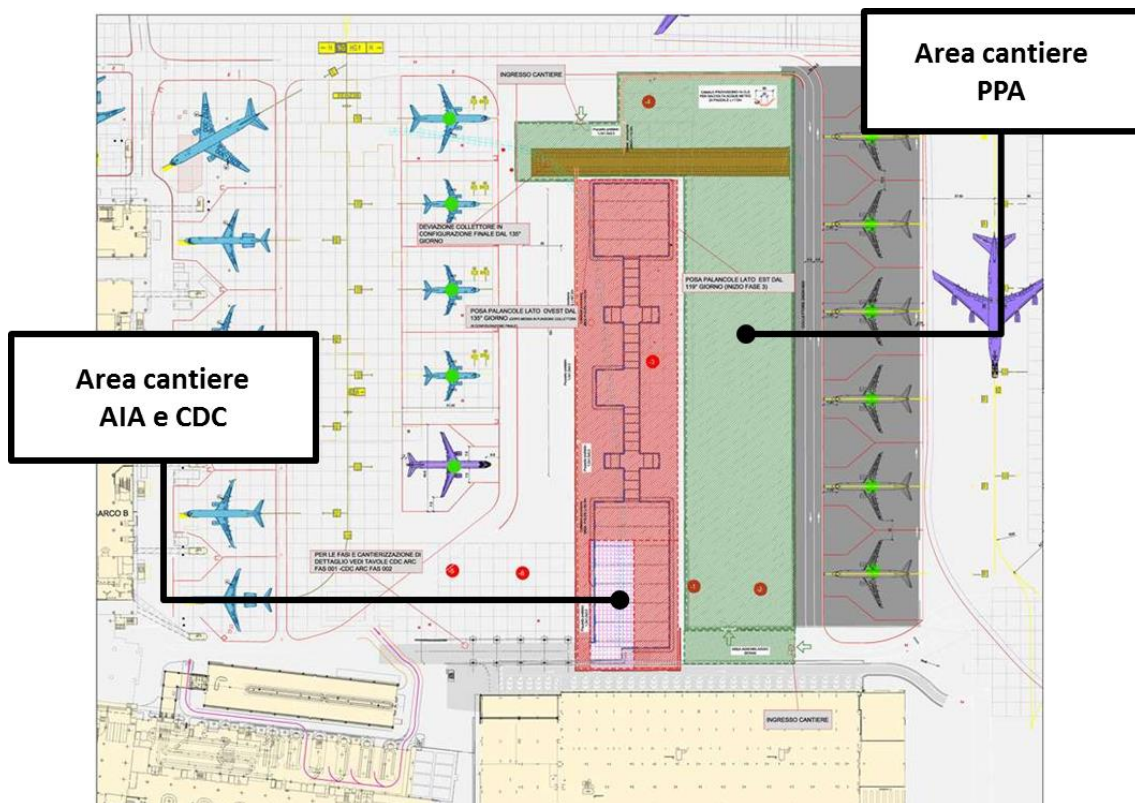


Figura 7-10 Sovrapposizione dei cantieri relativi alla realizzazione dell'Area di imbarco A (AIA), del Corpo di collegamento (CDC) e dei piazzali aeromobili di pertinenza Area di imbarco A (PPA).

#### 7.1.4.3 Caratterizzazione della sorgente emissiva: i fattori di emissione

Come espresso nella parte metodologica, punto chiave, per la corretta stima delle emissioni con i modelli matematici è la definizione dei fattori di emissione. In particolare, ad ogni attività elementare può essere associato un determinato fattore di emissione funzione della specificità dell'azione che si va ad eseguire.

Si è fatto quindi riferimento ai fattori di emissione definiti nel documento Emission Factors & AP42 "Compilation of Air Pollutant Emission Factor"<sup>3</sup> redatto dalla U.S. E.P.A. (United States Environmental Protection Agency).

Tali fattori sono stati declinati ed associati ad ogni attività nelle "Schede Ambientali" del Par. 6.2.2.

In coerenza con la metodologia di analisi occorre definire il fattore di emissione che fornisce il maggior contributo emissivo e che pertanto deve essere assunto come fattore di emissione da utilizzare per la definizione del Worst Case Scenario.

<sup>3</sup> Compilation of Air Pollutant Emission Factors – Volume I: Stationary Point and Area Sources AP – 42 Fifth Edition January 1995 Office Of Air Quality Planning And Standards – Office Of Air And Radiation – Research Triangle Park, NC 27711.

Tra le cinque fasi in cui sono organizzate le diverse lavorazioni si è scelto di simulare, in via cautelativa, la Fase 1; essa infatti è stata ritenuta la peggiore in quanto vi sono previste sia le attività più critiche in termini di lavorazione che in termini di movimentazione di materiale nonché la fase è quella che movimentata il maggior quantitativo di materiale pulverulento (con particolare riferimento allo scavo) nel minor tempo, determinando quindi un rateo emissivo maggiore.

Il fattore di emissione definito in termini generali nelle sopracitate schede ambientali sarà ricalcolato in funzione della specificità dei singoli cantieri.

$$E = k(0.0016) \frac{\left(\frac{U}{2.2}\right)^{1.3}}{\left(\frac{M}{2}\right)^{1.4}} [kg/t]$$

Dove

- M = contenuto di umidità del materiale [%]
- U = velocità del vento [m/s]
- k = fattore relativo alla granulometria (adimensionale)

Per la definizione delle emissioni prodotte dal singolo cantiere quindi occorre definire i parametri di velocità media del vento e di % di umidità nel terreno (assunti pari a quelli dello SIA), nonché i parametri quantitativi di materiale scavato.

Le attività svolte in contemporanea relative alla realizzazione dei piazzali, prevedono la demolizione della pavimentazione esistente in cls. Con riferimento ai fattori di emissione, in relazione a quanto definito nelle schede ambientali, è possibile considerare analogo fattore di emissione a quello visto per la Fase 1.

#### 7.1.4.4 I traffici di cantiere

Per quanto riguarda i traffici di cantieri, in coerenza alla metodologia del Worst Case Scenario, si deve fare riferimento alla lavorazione maggiormente impattante, definita nel paragrafo precedente.

Con riferimento al calcolo dei mezzi di cantiere si è fatto riferimento a quanto riportato nel documento “Estratto dei documenti significativi del progetto” (A783T8DGGEDGEN714).

In particolare il traffico di cantiere all'interno del sedime aeroportuale indotto dalla movimentazione delle terre da scavo dall'area di lavoro al sito destinato al rimodellamento morfologico T01 risulta pari a 9 mezzi/ora circa nelle 14 ore lavorative nel periodo diurno e 6 mezzi/ora circa nelle 7 ore di lavoro nel periodo notturno.

Tale calcolo deriva dall'aver considerato come volume medio di un autocarro 16m<sup>3</sup>.

In coerenza a quanto già valutato per altre lavorazioni, eseguite in fasi temporalmente differenti, tale contributo può essere considerato trascurabile.

#### 7.1.4.5 La maglia dei ricettori

Al fine di determinare le curve di isoconcentrazione di inquinanti, si è reso necessario realizzare una maglia di punti di calcolo. Ogni punto della maglia rappresenta un ricettore virtuale sul quale il software effettua l'analisi delle concentrazioni.

Attraverso dei modelli di interpolazione il software è in grado di determinare delle curve di isoconcentrazione, fornendo così un andamento continuo delle concentrazioni nello spazio.

Le caratteristiche della maglia di calcolo sono quelle riportate in Tabella 7-4.

AERMOD	
<i>Maglia generale</i>	
Passo lungo l'asse X	200
Passo lungo l'asse Y	200
N° di punti di calcolo totali	400 (20x20)
Altezza relativa dal suolo [m]	1.8

Tabella 7-4 Maglia di calcolo

### 7.1.5 RISULTATI DELLE SIMULAZIONI

A valle delle analisi condotte sui volumi di materiale e le tempistiche, ovvero sulle diverse produttività delle diverse fasi, si è scelto di simulare l'intera area di Fase1 come superficie emittente nel quale è stato inserito il rateo orario relativi agli scavi così come visto nel paragrafo precedente (cfr. Figura 7-11) e alla fase di demolizione relativa alle lavorazioni sui piazzali.

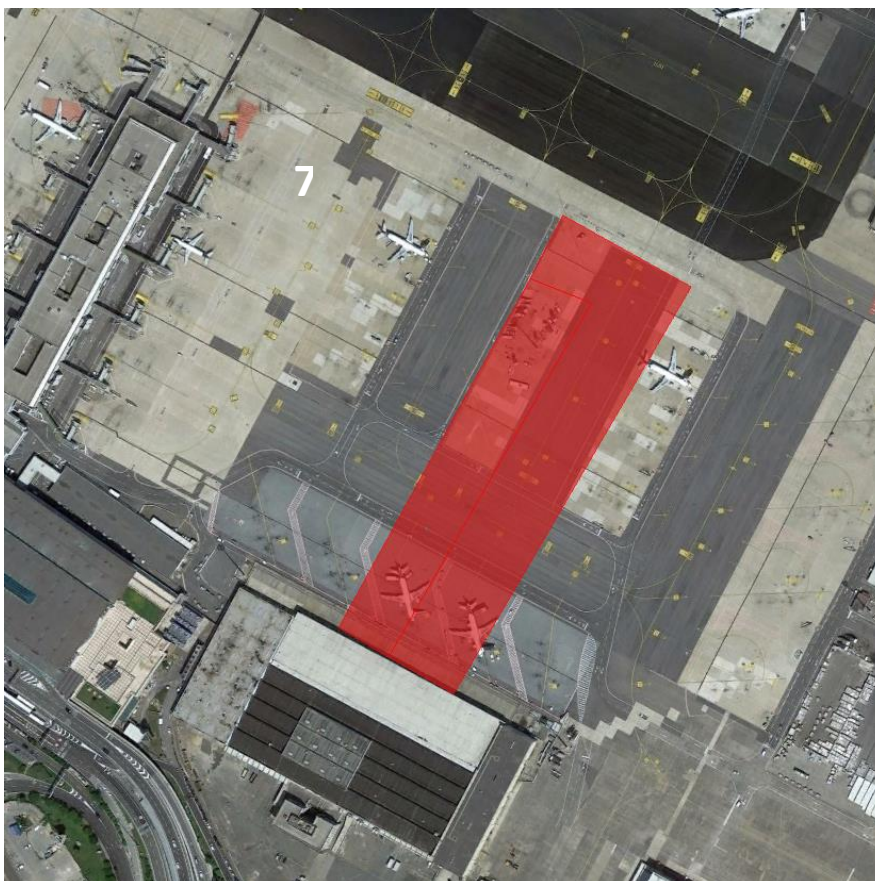


Figura 7-11 Suddivisione dell'area di cantiere in sottoaree lavorative

Analizzando le curve di isoconcentrazione dei valori più elevati – media 24h – calcolati sull'intera maglia<sup>4</sup> per la fase simulata, sono stati ottenuti valori massimi non superiori ai  $2.00 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Il massimo assoluto sulla maglia è infatti pari a  $1,20 \mu\text{g}/\text{m}^3$  ed è calcolato in prossimità dell'area di cantiere stessa.

---

<sup>4</sup> La maglia dei 1° valori rappresenta il valore più alto di media giornaliera, calcolato in ogni punto della maglia, rispetto a tutto l'anno simulato. In questo modo ogni punto della maglia rappresenterà il massimo valore assumibile in quel punto nello scenario di simulazione. E' opportuno però sottolineare come tale scenario possa non rappresentare un giorno reale bensì uno scenario cautelativo. A titolo di esempio due punti della maglia possono avere lo stesso valore in termini di concentrazione ma fare riferimento a giorni differenti.



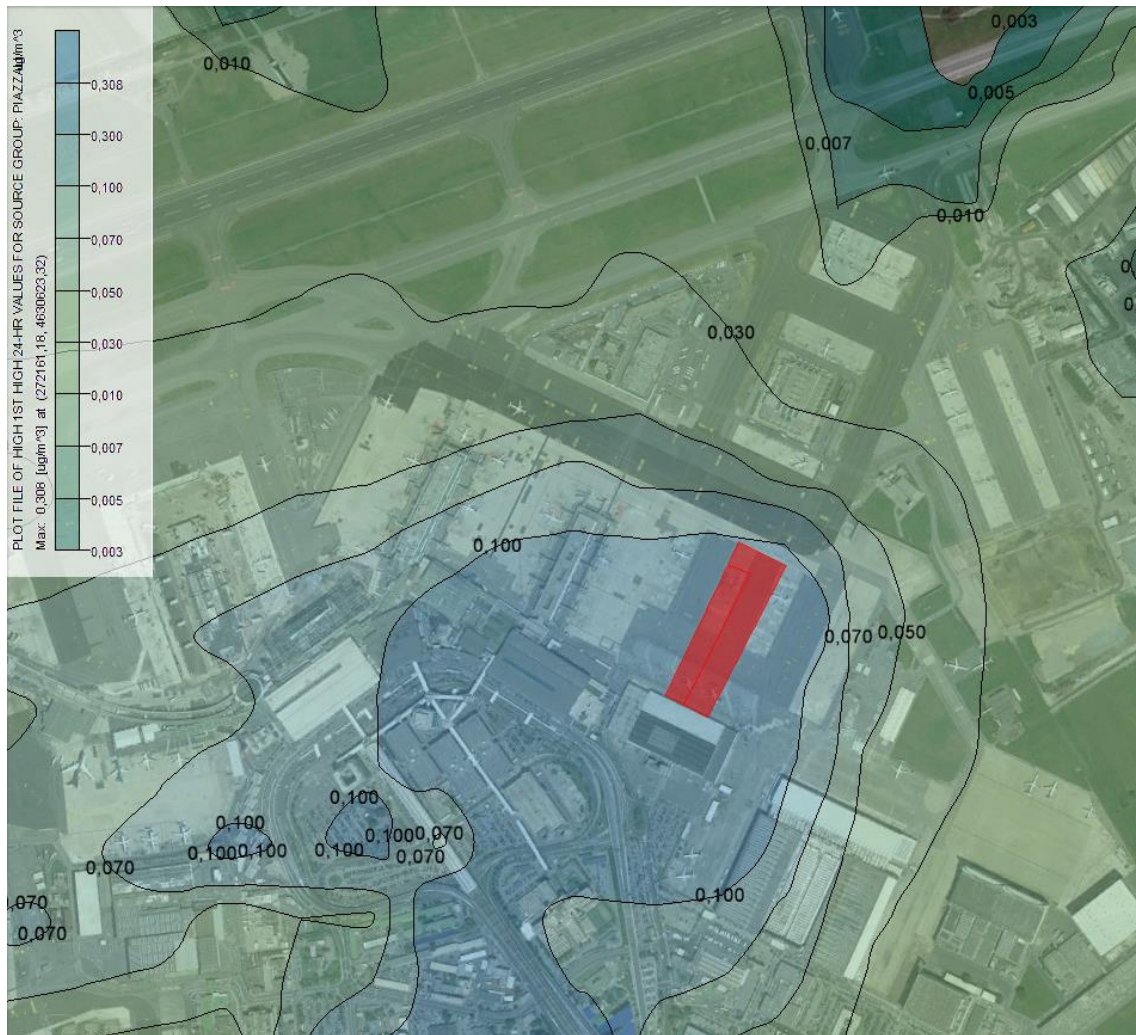


Figura 7-12 Massimi sulla maglia di calcolo media 24h PM<sub>10</sub> Fase 1

Come si evince dalla simulazione le curve di isoconcentrazione diminuiscono rapidamente con l'allontanamento dall'area di lavorazione.

## 7.1.6 CONCLUSIONI

Nel paragrafo precedente si è fatto riferimento ai risultati delle simulazioni dei modelli matematici, al fine di poter stimare il contributo all'inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al PM<sub>10</sub> all'attuale livello di qualità dell'aria.

Al fine di verificare il rispetto dei limiti normativi cogenti, occorre tuttavia sommare il contributo dei cantieri al fondo atmosferico attualmente presente nell'area di Fiumicino. In particolare facendo riferimento agli studi dello SIA si individuavano tre diversi livelli di fondo atmosferico (cfr. Tabella 7-5).

<i>Ambito Omogeneo</i>	<i>Valore di fondo PM<sub>10</sub></i>
Ambito omogeneo A	26,00 µg/m <sup>3</sup>
Ambito omogeneo B	23,00 µg/m <sup>3</sup>
Ambito omogeneo C	24,00 µg/m <sup>3</sup>

Tabella 7-5 Valori di fondo area di Fiumicino

Gli ambiti omogenei individuati nello SIA erano funzione delle diverse aree di pertinenza:

- Ambito omogeneo A: Tessuti urbani compatti, rete viaria primaria e viabilità soggetta ad intensi flussi di traffico;
- Ambito omogeneo B: Infrastrutture aeroportuali ed aree perimetrali;
- Ambito omogeneo C: Aree prevalentemente agricole.

In questa sede, anche facendo riferimento all'ambito omogeneo maggiormente critico, quello dei tessuti urbani compatti, rete viaria primaria e viabilità soggetta ad intensi flussi di traffico, si registra il pieno rispetto dei limiti normativi (cfr. Tabella 7-6).

<i>Fondo [µg/m<sup>3</sup>]</i>	<i>Max simulazione [µg/m<sup>3</sup>]</i>	<i>Totale [µg/m<sup>3</sup>]</i>	<i>Limite Normativo [µg/m<sup>3</sup>]</i>
26,0	1,20	27,20	50

Tabella 7-6 Somma valori massimi simulazioni e fondo

Coerentemente con quanto sin qui esposto, ed in considerazione del pieno rispetto del limite massimo normativo, pari a 50 µg/m<sup>3</sup>, non si prevede l'uso di opere mitigative per la componente atmosfera in relazione alle diverse attività svolte nei cantieri.

## 7.2 RUMORE

### 7.2.1 INTRODUZIONE E METODOLOGIA

Lo studio acustico si pone come obiettivo quello di analizzare le potenziali interferenze ambientali delle attività di cantiere relative alle opere di progetto oggetto di studio in questa fase.

In analogia a quanto fatto per la componente Atmosfera, anche in questo caso si fa riferimento a modelli previsionali di calcolo in ambiente esterno al fine di valutare sia le emissioni prodotte dalle diverse azioni di cantiere sia la propagazione del rumore da esse generata in prossimità delle aree di lavorazione e dei ricettori presenti nell'intorno aeroportuale.

I principali effetti relativi alla componente rumore, che generalmente si trasferiscono all'ambiente circostante a seguito delle lavorazioni eseguite all'interno di cantieri tipologicamente congruenti con quelli messi in opera nel progetto in esame, e che pertanto sono stati considerati in questa fase, sono di due tipologie:

- incremento delle emissioni acustiche derivanti da traffico veicolare indotto dal cantiere;
- incremento delle emissioni acustiche dovute all'operatività dei mezzi di cantiere.

Attraverso il software di simulazione e, in generale, attraverso una corretta modellazione acustica degli scenari di cantiere, è possibile stimare quindi i livelli previsionali di inquinamento acustico indotti dalle suddette azioni e confrontare i valori delle immissioni calcolate al suolo con i limiti normativi al fine di verificare il rispetto dei valori di soglia e di individuare le eventuali misure mitigative necessarie alla riduzione del rumore sia in prossimità della sorgente che dei ricettori stessi.

L'analisi è stata effettuata al variare delle diverse azioni di cantiere per poi verificare le eventuali interferenze con l'ambiente circostante. Così facendo è stato possibile individuare le condizioni operative rappresentative degli scenari peggiori in termini di emissioni acustiche e di contemporaneità delle azioni.

L'iter logico prevede come primo passo la caratterizzazione dell'ambito di studio attraverso la definizione dei parametri orografici ed antropici caratterizzanti il territorio in cui le azioni di cantiere si collocano.

La seconda fase altresì consiste nella caratterizzazione delle sorgenti acustiche connesse alle azioni di cantiere, precedentemente individuate nello screening delle lavorazioni, sulla base di quanto individuato nell'ambito delle "Schede Ambientali" per le singole attività elementari. Nello specifico in tale fase si definiscono i parametri progettuali legati sia alle aree di cantiere sia alle sorgenti opportunamente tarate in funzione della dimensione specifica del singolo cantiere.

Una volta definite le variabili che determinano i diversi scenari operativi di cantiere, si definiscono gli scenari di riferimento sulla base delle situazioni pianificate dal cronoprogramma e ritenuti maggiormente critici in funzione dei macchinari, delle aree di lavoro e della contemporaneità delle azioni. Attraverso poi il modello di calcolo si valutano quindi i possibili effetti acustici indotti dalle diverse sorgenti in funzione dello spazio (ubicazione nell'area territoriale di studio) e del tempo (arco temporale di attività).



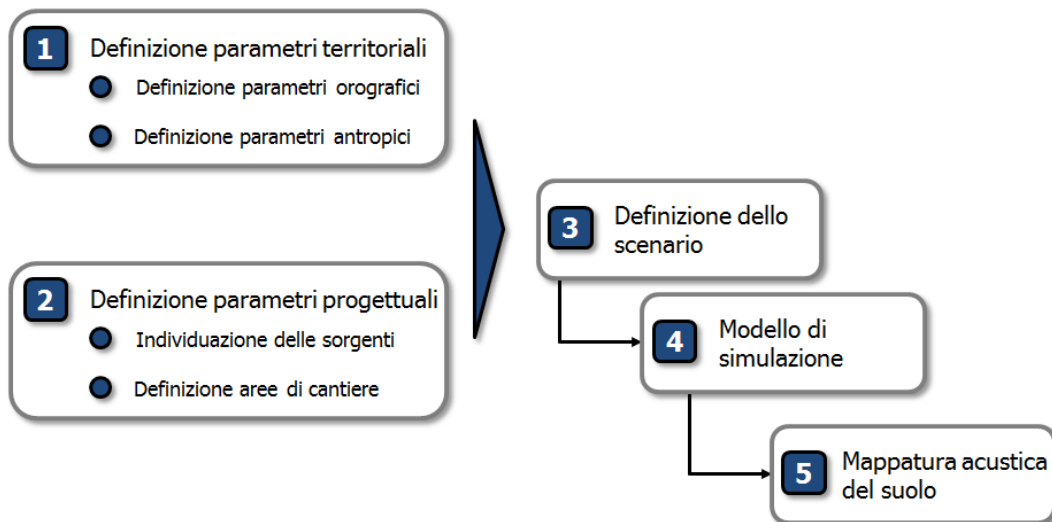


Figura 7-13 Iter logico utilizzato per lo studio acustico

## 7.2.2 IL SOFTWARE DI SIMULAZIONE SOUNDPLAN

Il modello di calcolo utilizzato è SoundPlan: un software all'avanguardia per effettuare simulazioni acustiche in grado di rappresentare al meglio le reali condizioni ambientali che caratterizzano il territorio studiato. Questo modello di simulazione è uno tra strumenti più completi oggi presenti sul mercato per la valutazione della propagazione del rumore prodotto da sorgenti di ogni tipo: da quelle infrastrutturali, quali ad esempio strade, ferrovie o aeroporti, a quelle fisse, quali ad esempio strutture industriali, impianti energetici, etc.

SoundPlan è uno strumento previsionale ad "ampio spettro", progettato per modellizzare la propagazione acustica in ambiente esterno prendendo in considerazione tutti i fattori interessati al fenomeno, come la disposizione e forma degli edifici, la topografia del sito, le barriere antirumore, il tipo di terreno e gli effetti meteorologici.

Tra i diversi standard di propagazione acustica per le strade e ferrovie, disponibili all'interno del software, è presente inoltre l'ISO 9613-2, riconosciuto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.194 «Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale» per il calcolo del livello acustico limitatamente alle infrastrutture industriali.

Una delle principali innovazioni di questo software si riscontra proprio nella precisione di dettaglio con cui viene rappresentata la reale orografia del territorio; per fare un esempio si può citare la schematizzazione di ponti e viadotti, i quali possono essere modellati come sorgenti sonore posizionate alla quota voluta, mantenendo però libera la via di propagazione del rumore al di sotto del viadotto stesso.

L'area di studio viene caratterizzata orograficamente mediante l'utilizzo di file georeferenziati con la creazione di un DGM (Digital Ground Model) ottenuto attraverso algoritmo TIN (Triangular Irregular Network), che è ritenuto il più attendibile per la realizzazioni di modelli digitali del terreno partendo da mappe vector. Questo sistema

sfrutta alcune potenzialità del DEM (Digital Elevation Model) come la possibilità di mediare le distanze tra le isoipse, ma introduce, in caso di soli punti quotati noti, la tecnica di triangolazione ad area minima, crea cioè una serie di “triangoli” che hanno come vertici i punti quotati noti e con la minor area possibile e attribuisce a queste aree triangolari valori di quota calcolati sulla differenza dX, dY e dZ, ovvero le pendenze dei versanti.

La realizzazione di un file di input può essere coadiuvata dall’innovativa capacità del software di generare delle visualizzazioni tridimensionali del sito, mediante un vero e proprio simulatore di volo in cui è possibile impostare il percorso e la quota del volo, variabili anche in itinere del sorvolo secondo necessità; tale strumento permette di osservare graficamente la totalità dei dati di input immessi, verificandone la correttezza direttamente muovendosi all’interno di scenari virtuali tridimensionali.

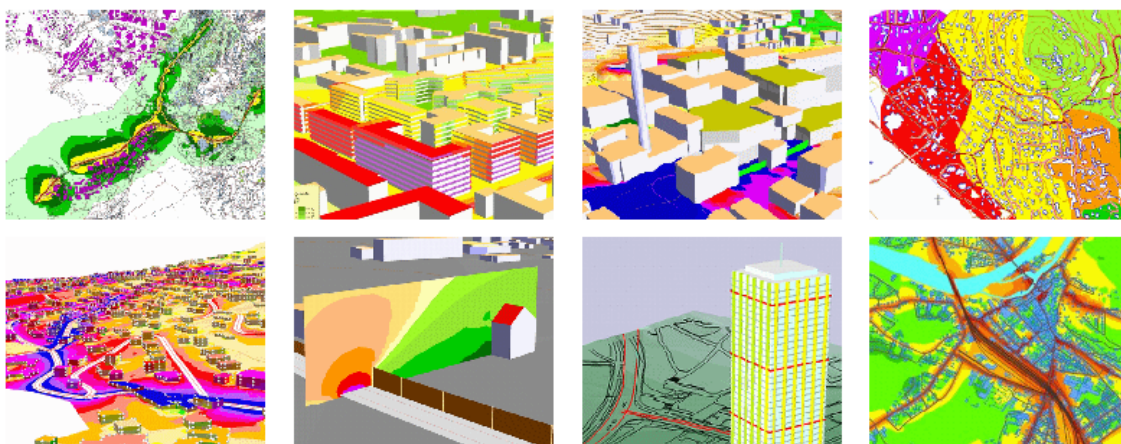


Figura 7-14 SoundPlan – esempio di output del modello in 2D e 3D della mappatura acustica

Durante lo svolgimento delle operazioni matematiche, questo software permette di effettuare calcoli complessi e di archiviare tutti i livelli parziali collegati con le diverse sorgenti, per qualsiasi numero di punti di ricezione al fine di individuare i singoli contributi acustici. Inoltre i livelli acustici stimati sui punti della griglia (mappe acustiche) possono essere sommati, sottratti ed elaborati, con qualsiasi funzione definita dall’utente.

Il software permette, infine, di ottenere in formato tabellare qualunque valore acustico si voglia conoscere di un ricettore, per ognuna delle sue facciate, per ogni piano, restituendo anche l’orientamento delle facciate rispetto alla sorgente sonora, la differenza di quota sorgente-ricettore ed altre informazioni presenti nel modello: è, ad esempio, in grado di effettuare calcoli statistici relativi all’impatto sonoro a cui è soggetta la popolazione presente nell’area di studio, seguendo i dettati delle ultime normative europee.

Per la modellazione delle sorgenti industriali, il codice prende in considerazione quattro diversi tipi:

- Puntuali,
- Lineari,
- Areali,
- Volumiche.

Per ciascuna sorgente è possibile definire il livello di potenza sonora emesso e l'intervallo temporale di funzionamento nell'arco delle 24 ore.

### 7.2.3 I LIMITI NORMATIVI

Per quanto riguarda i limiti normativi il Comune di Fiumicino è dotato di Piano di classificazione acustica ai sensi dell'art.6 della L.447/95 e s.m.i. e della normativa regionale vigente.

Nello specifico le aree esterne al sedime aeroportuale ricadono prevalentemente nella classe III e IV. I relativi limiti acustici sono riportati in tabella seguente.

	Classe III		Classe IV	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Valori limiti di emissione	55	45	60	50
Valori limite assoluti di immissione	60	50	65	55

Tabella 7-7 Limiti acustici normativi definiti dalla zonizzazione acustica comunale

Ad ogni modo il Comune di Fiumicino prevede la possibilità per i cantieri edili temporanei di operare in deroga ai valori di cui all'articolo 2, comma 3 della L.447/95 previa preventiva autorizzazione.

### 7.2.4 I PARAMETRI TERRITORIALI

Un fattore di fondamentale importanza per poter sviluppare una corretta modellizzazione acustica, è la realizzazione di una cartografia tridimensionale compatibile con le esigenze "acustiche" del modello previsionale adottato.

Per una precisa descrizione del terreno da inserire all'interno del modello è necessario definire all'interno del software i parametri orografici (curve di livello) e quelli antropici (edifici, infrastrutture, etc.), specificando per quest'ultimi forma, posizione ed altezza.

All'interno del modello di simulazione sono stati inseriti tali parametri relativi all'area aeroportuale oggetto di analisi.

## 7.2.5 I PARAMETRI PROGETTUALI

### 7.2.5.1 Caratterizzazione della sorgente emissiva

Per la componente Rumore i fattori di emissione associati ai mezzi di cantiere si esprimono in termini di livelli di potenza sonora. I valori sono stati declinati ed associati ad ogni attività elementare all'interno delle "Schede Ambientali", previa taratura in funzione del cantiere elementare.

Cod.	Attività elementare	Macchinari	Num.	%	Contemp.	Potenza acustica [dBA]
L01	Scavo di sbancamento	Escavatore	1	90	SI	103
		Pala gommata	1	90		101
L02	Scavo di sbancamento con aggotamento acque	Escavatore	1	90	SI	103
		Pala gommata	1	90		101
		Pompa	1	50		100
L03	Palificazioni	Trivellatrice	1	90	NO	105
		Pompa CLS	1	85		100
		Gru a torre	1	60		105
L04	Realizzazione di fondazioni	Gru a torre	1	70	NO	105
		Pompa CLS	1	80		100
L05	Rinterri	Escavatore	1	90	-	103
L06	Realizzazione di elementi strutturali in elevazione gettati in opera	Gru a torre	1	70	NO	105
		Pompa CLS	1	80		100
L07	Posa in opera elementi prefabbricati	Gru a torre	1	40	-	105
L08	Trasporto materiali	Camion	1	-	-	50,76
L09	Demolizione manufatti edilizi con tecnica tradizionale	Demolitore	1	90	NO	105
		Escavatore	1	36		103
		Autobotte	1	40		95
L10	Demolizione manufatti edilizi con tecnica controllata	Escavatore con pinza	1	40	NO	103
		Autobotte	1	40		95
		Autogru	1	40		100
L11	Stoccaggio materiali proveniente dalle demolizioni	Escavatore	1	90	-	103
L12	Demolizione pavimentazioni in conglomerato cementizio	Demolitore	1	90	NO	105
		Terna	1	20		101
L13	Demolizione pavimentazioni in conglomerato bituminoso	Fresatrice	1	90	-	103

Tabella 7-8 Caratterizzazione delle sorgenti acustiche associate alle attività elementari

### 7.2.5.2 I traffici di cantiere

Per quanto riguarda i traffici di cantieri, si è fatto riferimento al bilancio dei materiali riportato nell'elaborato "Estratto dei documenti significativi del progetto" (A783T8DGGEDGEN714).

### 7.2.6 DEFINIZIONE DEGLI SCENARI PIÙ SIGNIFICATIVI

Una volta definiti tutti i parametri progettuali e territoriali connessi alle lavorazioni elementari e, più in generale, alle attività di cantierizzazione, si procede all'individuazione degli scenari più significativi per la valutazione delle potenziali interferenze ambientali in campo acustico.

A tale scopo si procede dapprima ad individuare le attività di cantiere potenzialmente più impattanti sulla base della caratterizzazione acustica delle sorgenti e successivamente a definire i possibili scenari sulla base delle indicazioni fornite da cronoprogramma.

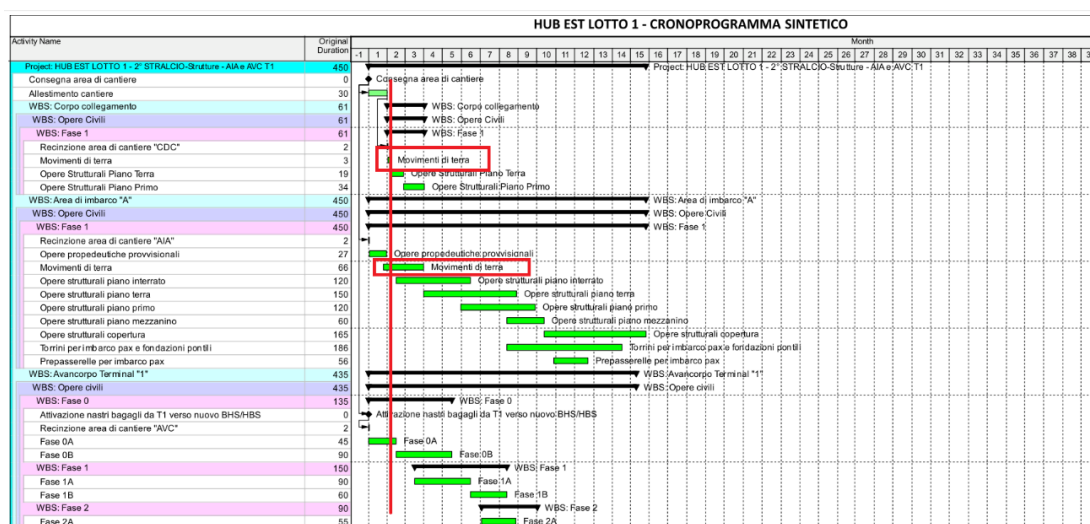


Figura 7-15 Individuazione dello scenario più significativo

Lo scenario di riferimento prevede la contemporanea esecuzione dell'attività di scavo con aggotamento delle acque sia per il corpo di collegamento (CDC) sia per l'area di imbarco A (AIA) su 3 turni di lavoro da 7 ore ciascuno (2 nel periodo diurno e 1 in quello notturno).

Per il calcolo dei mezzi di cantiere si è fatto riferimento al bilancio materiali riportato nell'elaborato "Estratto dei documenti significativi del progetto" (A783T8DGGEDGEN714). In particolare il traffico di cantiere all'interno del sedime aeroportuale indotto dalla movimentazione delle terre da scavo dall'area di lavoro al sito destinato al rimodellamento morfologico T01 risulta pari a 9 mezzi/ora circa nelle 14 ore lavorative nel periodo diurno e 6 mezzi/ora circa nelle 7 ore di lavoro nel periodo notturno.

Stante la sovrapposizione temporale con le attività di cantiere relative al Lotto 1 – Primo stralcio e connesse alla realizzazione dei piazzali antistanti l'area di imbarco A, nella definizione dello scenario di più significativo alla base per l'individuazione dei potenziali impatti di cantiere risulta necessario considerare anche le lavorazioni connesse con i piazzali secondo l'articolazione delle attività riportata negli specifici cronoprogrammi. Lo scenario considerato più significativo per la valutazione dei potenziali impatti acustici indotti dalle attività di cantiere risulta articolato secondo quanto riportato in Tabella 7-9.

Area di cantiere	Lavorazioni
Corpo di collegamento (CDC)	Scavo di sbancamento con aggotamento acque
	Trasporto dei materiali di scavo
Area di imbarco A (AIA)	Scavo di sbancamento con aggotamento acque
	Trasporto dei materiali di scavo
Piazzali pertinenza ara imbarco A (PPA)	Demolizione lastre cls

Tabella 7-9 Attività di cantiere caratterizzanti lo scenario più significativo

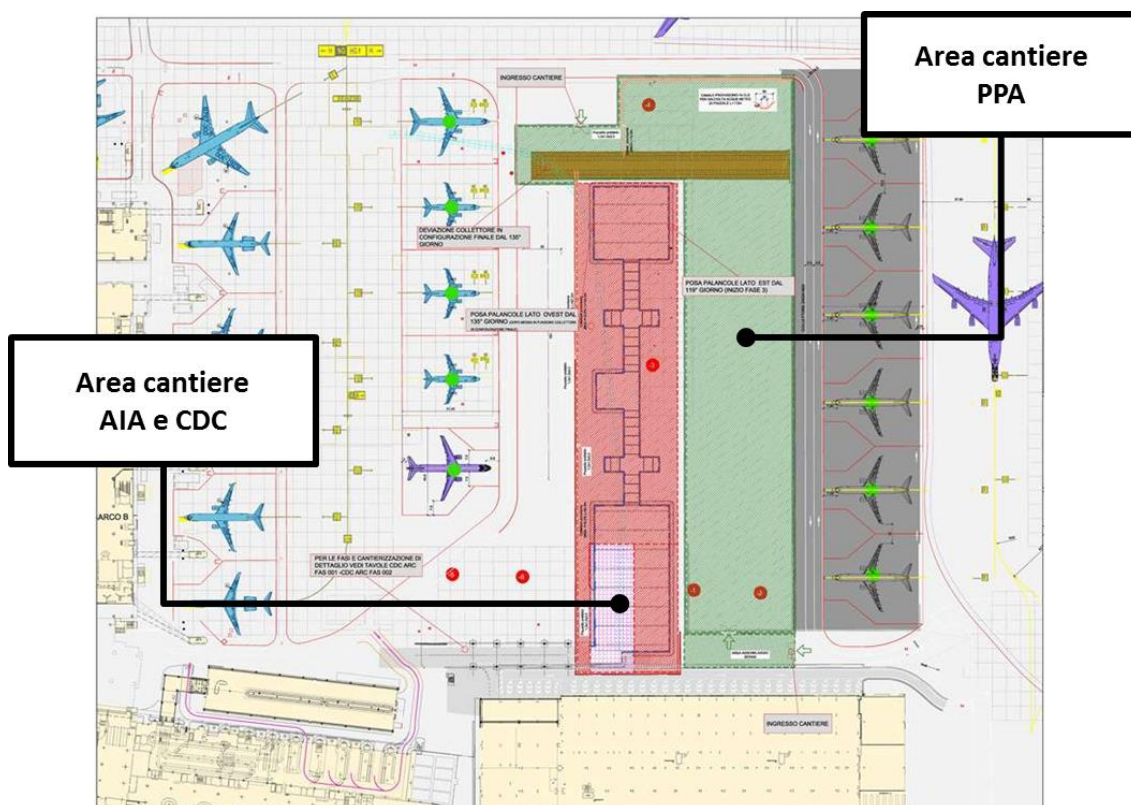


Figura 7-16 Sovrapposizione dei cantieri relativi alla realizzazione dell'Area di imbarco A (AIA), del Corpo di collegamento (CDC) e dei piazzali aeromobili di pertinenza Area di imbarco A (PPA).



## 7.2.7 RISULTATI DELLE SIMULAZIONI

Per l'analisi della propagazione acustica indotta dalle attività di cantiere si è utilizzato il metodo ISO 9613-2 per i mezzi di cantiere e il NMPB Routes 96 per il traffico veicolare così come raccomandato dalla direttiva europea 2003/613/CE del 06/08/2003.

In riferimento alla fase più critica (Fase 1), il rumore indotto dalle attività di cantiere e di trasporto materiali rimane circoscritto alle aree aeroportuali. Per quanto riguarda il trasporto dei materiali, l'analisi è stata limitata ai soli percorsi lungo la perimetrale al sedime aeroportuale in quanto più rilevante in riferimento ai potenziali ricettori esterni.

I risultati delle simulazioni relative sia al periodo diurno che notturno sono riportate nelle figure seguenti.



Figura 7-17 Curve di isolivello acustico cantiere nel periodo diurno



Figura 7-18 Curve di isolivello acustico indotte dal trasporto dei materiali nel periodo diurno



Figura 7-19 Curve di isolivello acustico cantiere nel periodo notturno





Figura 7-20 Curve di isolivello acustico indotte dal trasporto dei materiali nel periodo notturno

## 7.2.8 CONCLUSIONI

Al fine di poter stimare la rumorosità indotta dalla attività di cantiere si è fatto riferimento al modello di calcolo SoundPlan. I risultati delle simulazioni effettuate evidenziano come il clima acustico indotto dalle lavorazioni e dal trasporto dei materiali nelle condizioni maggiormente critiche siano tali da indurre livelli acustici contenuti al di fuori del sedime aeroportuale e al di sotto dei limiti normativi senza interessare alcun ricettore sensibile ubicato nell'intorno del sedime aeroportuale.

Coerentemente con quanto sin qui esposto, ed in considerazione del pieno rispetto dei limiti normativi, non si prevede pertanto l'uso di opere mitigative per la componente rumore in relazione alle diverse attività svolte nei cantieri.

## 7.3 VIBRAZIONI

Secondo quanto definito dalle Schede Ambientali e secondo quanto riportato nel Par. 6.2.3 la componente Vibrazioni, in termini generale, è interessata dalle tipologie di lavorazioni in esame.

Riferendosi al caso specifico tuttavia, data la tipologia di scavo effettuata con mezzi tradizionali, nonché l'assenza di ricettori sensibili nelle immediate prossimità dell'area d'intervento, non si prevedono interferenze ambientali rispetto alla componente in analisi.

#### **7.4 AMBIENTE IDRICO**

Considerato quanto rappresentato nelle “Schede Ambientali” in riferimento all’ambiente idrico si segnala che per tutte la lavorazioni da effettuarsi nell’ambito della realizzazione dell’intervento in esame l’unico potenziale impatto è indotto dal rischio di sversamenti accidentali.

Date le caratteristiche di tali lavorazioni non si ritiene dunque necessario provvedere alla messa in opera di particolari mitigazioni, ritenendo le previste misure gestionali del cantiere sufficienti ad annullare il rischio di contaminazione dell’ambiente idrico.

Inoltre, per quanto riguarda le aree occupate dai cantieri logistici, si evidenzia che le superfici sono pavimentate e le acque trattate e smaltite, come specificatamente dettagliato nella “Relazione tecnica della cantierizzazione” (A783T8DGGGERGEN702).

Unica eccezione è fatta per la lavorazione “Scavo di sbancamento con necessità di aggotamento acque” per la cui analisi dei potenziali impatti sull’ambiente idrico si rimanda allo specifico elaborato dal titolo “Analisi degli effetti sulla falda nella fase di cantiere e di progetto” A783T8DGGGERGEN712).

#### **7.5 SUOLO**

Considerato quanto rappresentato nelle “Schede Ambientali” in riferimento al suolo si segnala che per tutte la lavorazioni da effettuarsi nell’ambito della realizzazione dell’intervento in esame l’unico potenziale impatto è indotto dal rischio di sversamenti accidentali.

Date le caratteristiche di tali lavorazioni non si ritiene dunque necessario provvedere alla messa in opera di particolari mitigazioni, ritenendo le previste misure gestionali del cantiere sufficienti ad annullare il rischio di contaminazione del suolo.
