


- FASE 1 - TRAFFICO SU CARREGGIATA ESISTENTE (ASSE 2):**
- Realizzazione viadotto Calcinai asse 1;
 - Realizzazione viadotto San Lorenzo asse 1;
 - Inizio realizzazione viadotto Lanzo asse 1;
 - Inizio realizzazione galleria Poggio Tondo asse 1.
 - Durata lavori : 430 giorni.
- FASE 2 - ATTIVAZIONE NUOVA CARREGGIATA FINO ALLA PROGR.0+820:**
- Prima deviazione della viabilità;
 - Termine realizzazione viadotto Lanzo e galleria Poggio Tondo asse 1;
 - Realizzazione viadotto Calcinai e San Lorenzo asse 2;
 - Durata lavori : 600 giorni.
- FASE 3 ATTIVAZIONE NUOVA CARREGGIATA DA PROGR. 1+500 A FINE PROGETTO:**
- Seconda deviazione della viabilità;
 - Realizzazione viadotto Lanzo e galleria Poggio Tondo asse 2;
 - Realizzazione viadotto La coscia asse 1;
 - Durata lavori : 350 giorni.
- FASE 4 ATTIVAZIONE COMPLETA DELLA NUOVA CARREGGIATA (ASSE 1):**
- Deviazione traffico sul solo asse 1;
 - Realizzazione viadotto La Coscia asse 2;
 - Durata lavori : 391 giorni.



LEGENDA

- AREE DI INTERVENTO
- LAVORAZIONI ESEGUITE
- VIABILITA' PROVVISORIA

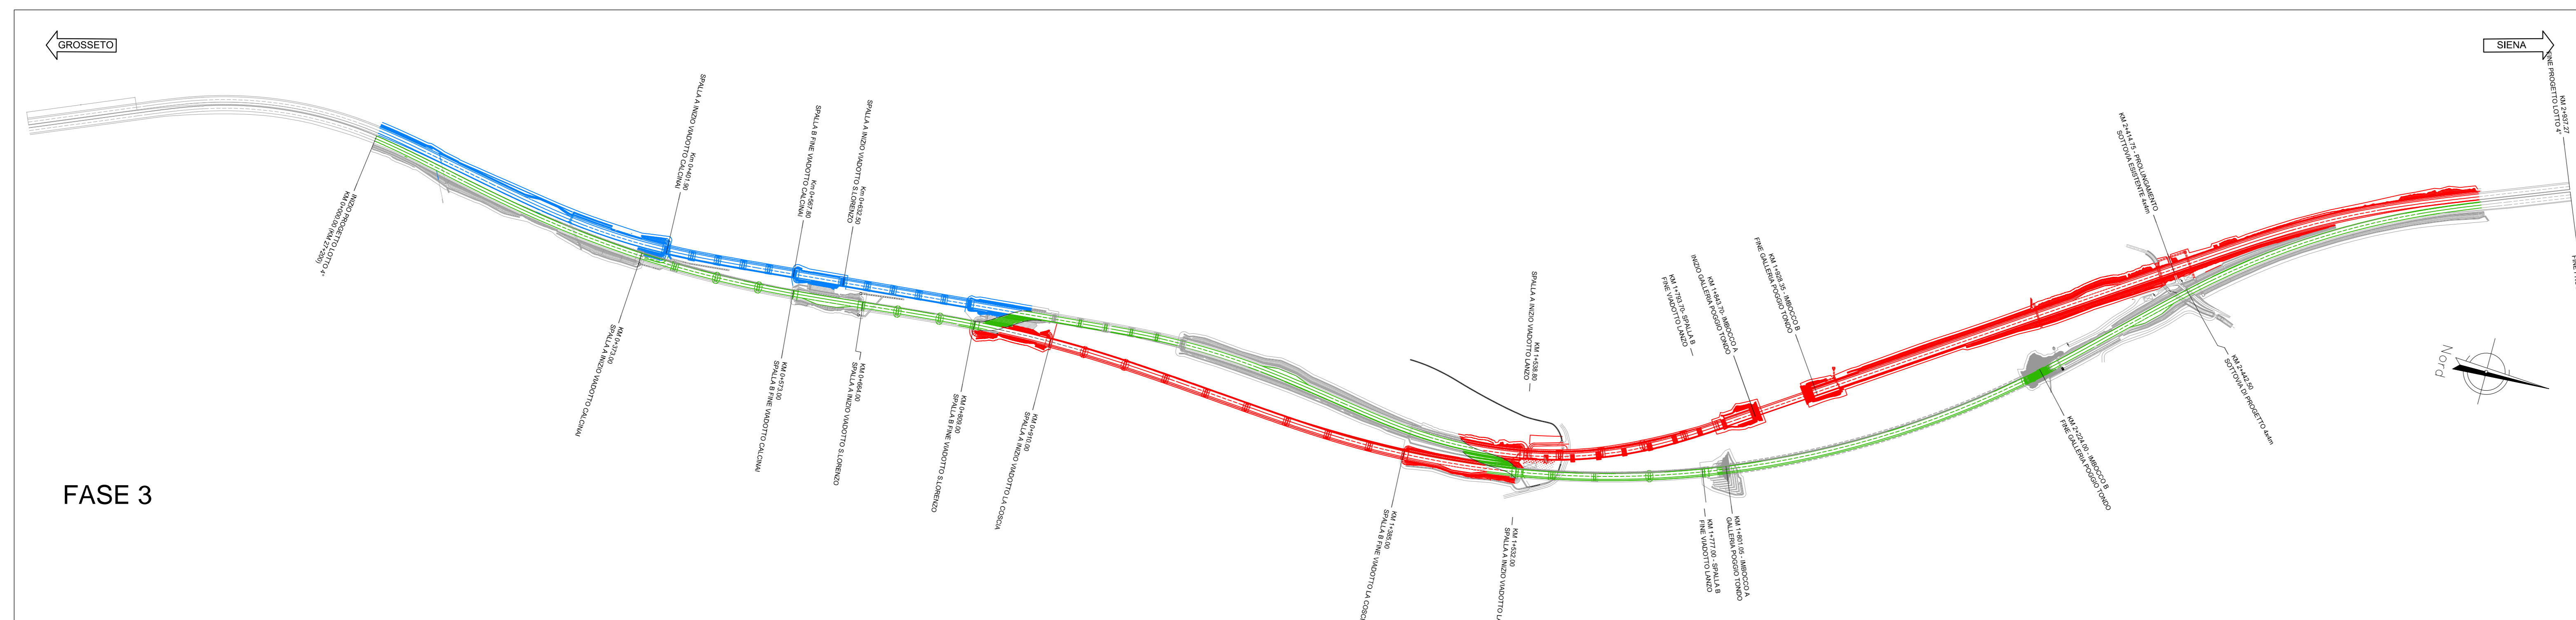

anas Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78
S.G.C. GROSSETO - FANO
 Adegumento a 4 Corsie nel Tratto Grosseto - Siena
 (S.S. 223 "DI PAGANICO") dal Km 27+200 al Km 30+038 - Lotto 4

PROGETTO ESECUTIVO COD. F113

PROGETTAZIONE: ANI SINTAGMA - GEOG - IERINA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
 Dott. Ing. Nando Graneri
 Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
 MANDANTIS: MANDANTI:
Sintagma **GEOTECNICA** **ICARIA**
Processi di ingegneria

IL PROGETTISTA:
 Dott. Ing. Valterio Buticchi
 Ordine degli Ingegneri della Prov. di Terni n° A378

IL GEODIAGNOSTA:
 Dott. Ing. C. Scarpini
 Dott. Geol. Giorgio Carquigliesi
 Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°108

IL R.L.P.:
 Dott. Ing. Antonio Scalzandri

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
 Dott. Ing. Filippo Panserino
 Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1373

PROTOCOLLO DATA

CANTIERIZZAZIONE
 Planimetria delle fasi esecutive dell'opera

CODICE PROGETTO	NO. FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO LQ702BE	700-CASO-CAN-PP02-4	A	1:4000
UV. PROJ. N. PROJ. 1701	CODICE ELAB. T00CA00CANP02		

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	Emissione	16/10/2017	F. Macchioni	V. Belloni	N. Graneri
